



平成 13 年度 再評価対象事業一覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年を経過した後も未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業
- ③ 事業の進捗状況や社会経済情勢の急激な変化による事業

種 別	番号	補単	事 業 名	該当条件	対応方針
河川事業	1	補	七瀬川	②	「事業継続」
街路事業	2	単	西小路通	②	「事業継続」

* 補は国庫補助事業，単は京都市単独事業を示す。


[illegible]

平成13年度再評価事業フォローアップ調書


(平成16年3月末)

事業名	河川事業 七瀬川		事業所管課	京都市建設局 水と緑環境部河川課	
事業区間	自：伏見区竹田狩賀町（東高瀬川合流部） 至：伏見区深草大亀谷東久宝寺町（遊水池）		延長及び幅員	延長L＝1,095m(950+145) 幅員W＝10.80～15.70m	
事業採択年度	平成4年度	完成予定年度	当初：平成13年度 変更：平成19年度		
事業進捗					
年度	全体事業	平成14年度以前	平成15年度	平成16年度	平成17年度以降
工事	L=1,095m C=5,220 百万円	上部河川 L=390m 下部河川 L=740m C=3,637 百万円	下部河川 L=100m 下部河川（流入工） L=110m C=343百万円	上部河川 L=270m 下部河川（流入工） L=110m C=471 百万円	上部河川 L=180m 下部河川（流入工） L=110m C=769 百万円
用地	A=5,694 m ² C= 2,170 百万円	A=3,602 m ² C=1,387 百万円	A=0 m ² C=0 百万円	A=0 m ² C=0 百万円	A=2,076 m ² C=783 百万円
その他	測量委託 C=2,272百万円	C=2,072百万円	C=52 百万円	C=127 百万円	C=21 百万円
計	C=9,662 百万円	C=7,096 百万円	C=395 百万円	C=598 百万円	C=1,573 百万円
進捗率		73.4%	77.5%	83.7%	100%
平成 13 年度再評価時点での課題，問題点					
① 流入工部での上水道・下水道本管等の移設補償工事の協議					
② 浸水被害の早期軽減の観点から，遊水池整備について早期に着手することを検討する。					
③ 上部河川計画において住民の意見を反映し，整備後の河川の維持管理にも住民が積極的にかかわれる協力体制をつくるなど，住民に親しまれる川づくりを目指していく。					
平成15年度の実組					
・ 二層式河川下部右岸 L=100m					
・ 流入工部工事着手					
・ 流入工部移設補償工事 一式					
平成16年度以降の実組					
当面の目標					
国道24号線から上流側の二層式河川区間（新門丈橋まで）上部河川 L=450m 及び下部河川（流入工）[4年工事国債] L=110m の完成					
事業効果					
都市河川としての治水安全度の向上（下部河川）及び水辺空間の環境整備（上部河川）					
発現年度					
平成19年度					


[箇所図]

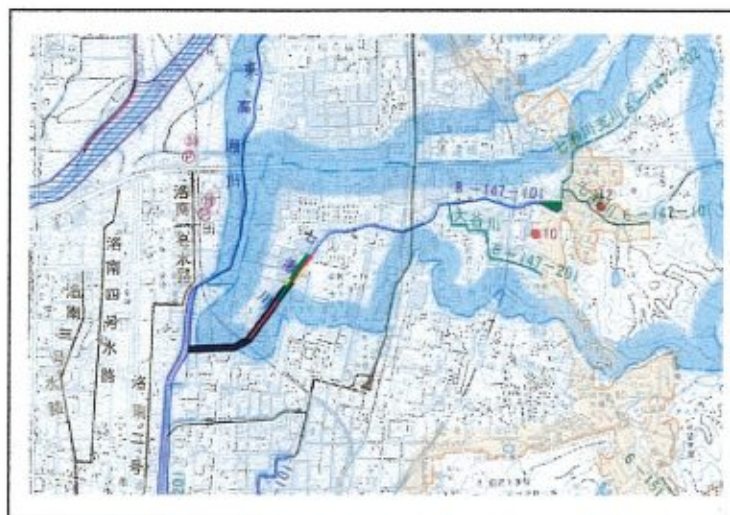

[模式図]

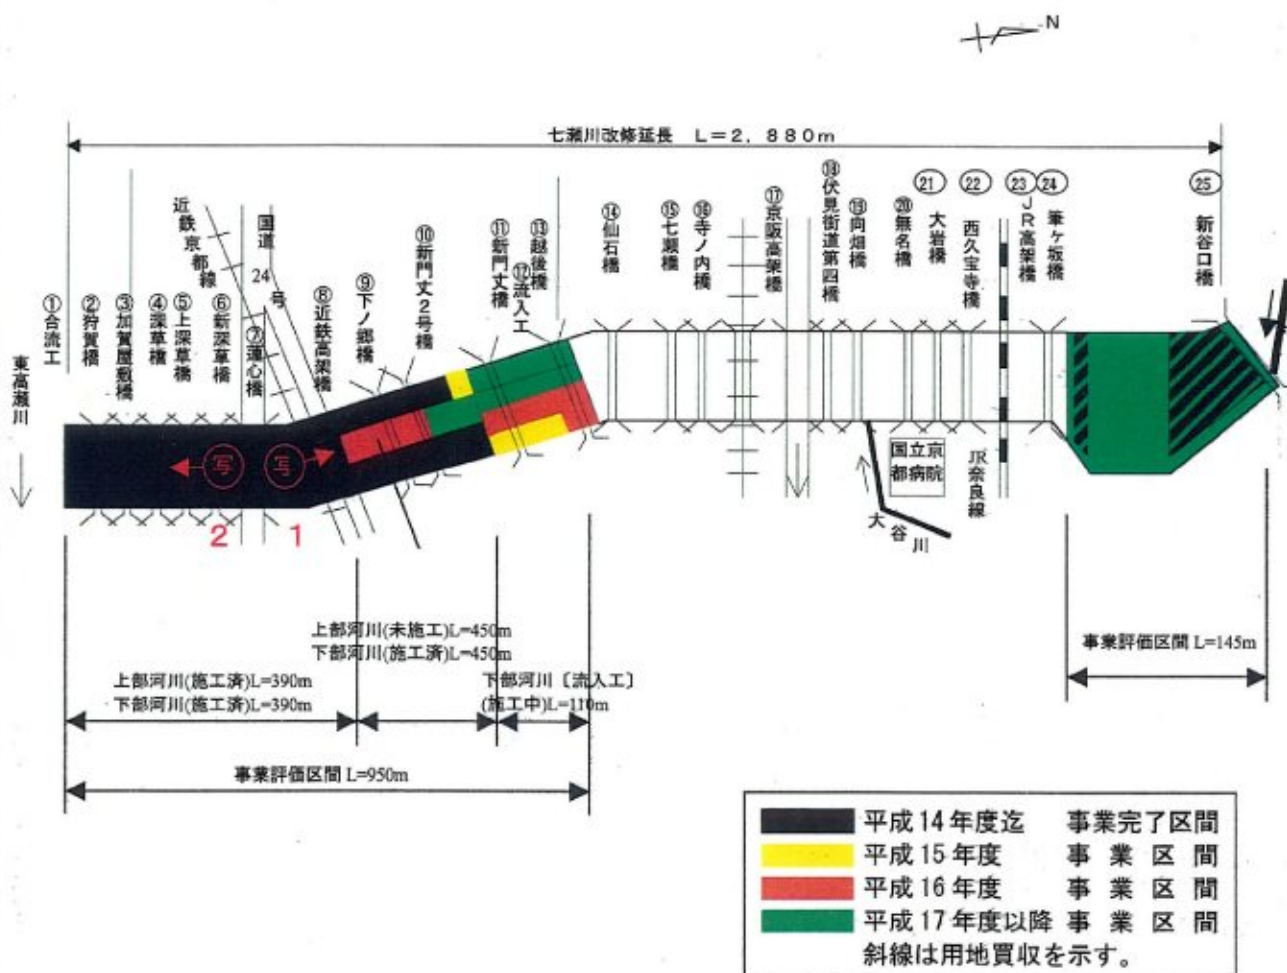

[断面図]

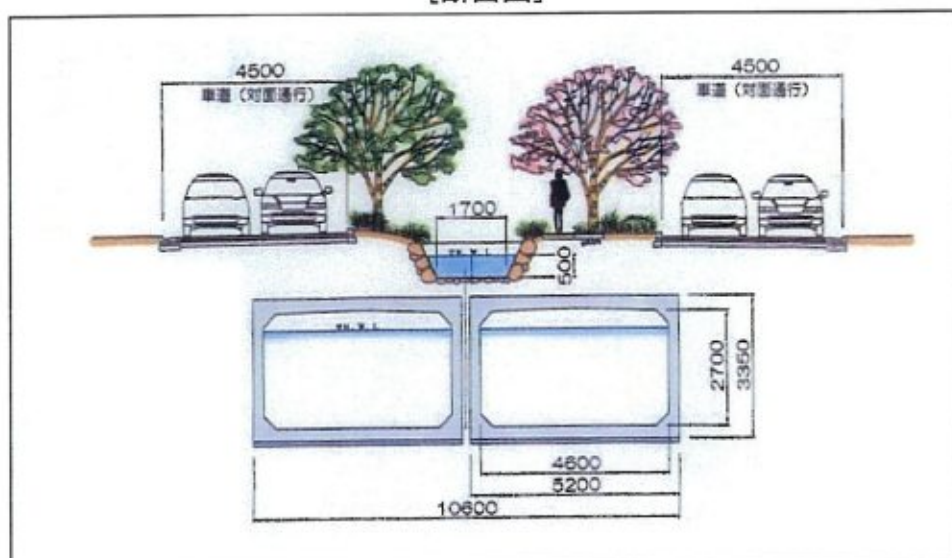

[現況写真]


1



2



流入工部イメージ図

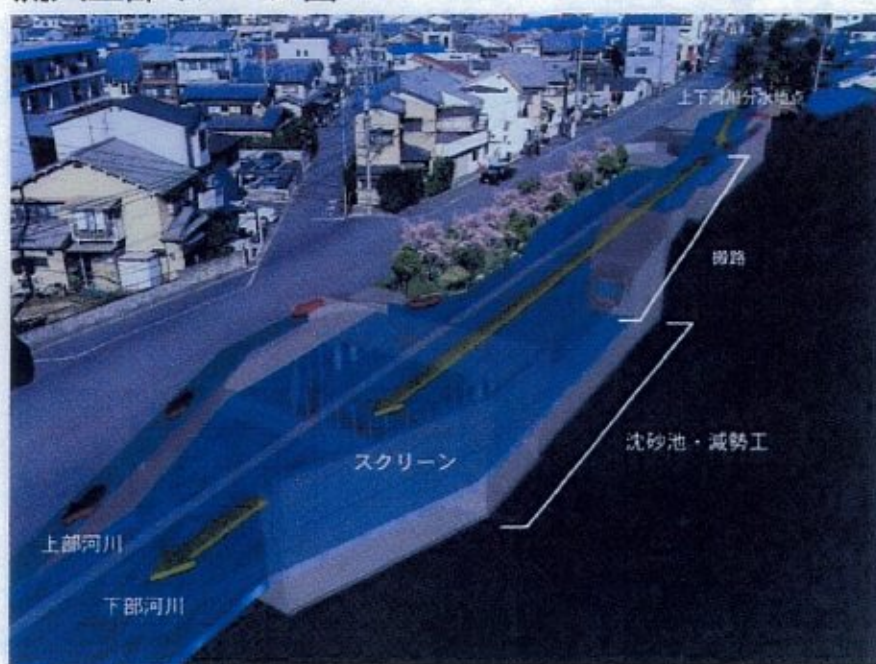

平成13年度再評価事業フォローアップ調書


(平成16年3月末)

事業名	街路事業 西小路通		事業所管課	京都市建設局 街路部街路建設課	
事業区間	自：京都市右京区花園春日町（旧二条通） 至：京都市右京区花園藪ノ下町（丸太町通）		延長及び幅員	延長L＝360m 幅員W＝11m	
事業採択年度	平成4年度		完成予定年度	当初：平成7年度 変更：平成18年度	
事業進捗 ※（ ）内は、公社先行取得分					
年度	全体事業	平成14年度以前	平成15年度	平成16年度	平成17年度以降
工事	L＝360m C＝70百万円	L＝0m C＝0百万円	L＝0m C＝0百万円	L＝0m C＝0百万円	L＝360m C＝70百万円
用地	A＝2,492㎡ C＝1,317百万円	(68㎡) A＝1,402㎡ (78百万円) C＝708百万円	(268㎡) A＝0㎡ (132百万円) C＝0百万円	(168㎡) A＝0㎡ (123百万円) C＝0百万円	A＝1,090㎡ C＝609百万円
その他	測量、設計委託 C＝35百万円	測量、設計委託等 C＝28百万円	測量委託等 C＝5百万円	C＝0百万円	C＝2百万円
計	C＝1,422百万円	C＝736百万円	C＝5百万円	C＝0百万円	C＝681百万円
進捗率		52%(57%)	52%(67%)	52%(76%)	100%
平成13年度再評価時点での課題、問題点					
・平成8年度からの国の補助重点化方針の影響により、予算確保が出来なくなった。					
・境界確定作業の難航					
・地元住民による事業推進要望、一部地権者からの用地買取請求に応えられるよう、今後、予算確保に努める。					
・地域の生活環境への配慮や安全性の確保及びバリアフリー化を図るなど、良好な地域環境となるよう努める。					
平成15年度を取組					
・未確定用地境界の確定作業					
・用地買収					
平成16年度以降を取組					
当面の目標					
・用地買収					
事業効果					
・京都市西部地域の道路ネットワークが形成され、円滑な通行の確保が図れるほか、歩道整備により歩行者の安全確保の向上に寄与する。					
発現年度					
・平成18年度					


[箇所図]



[模式図]

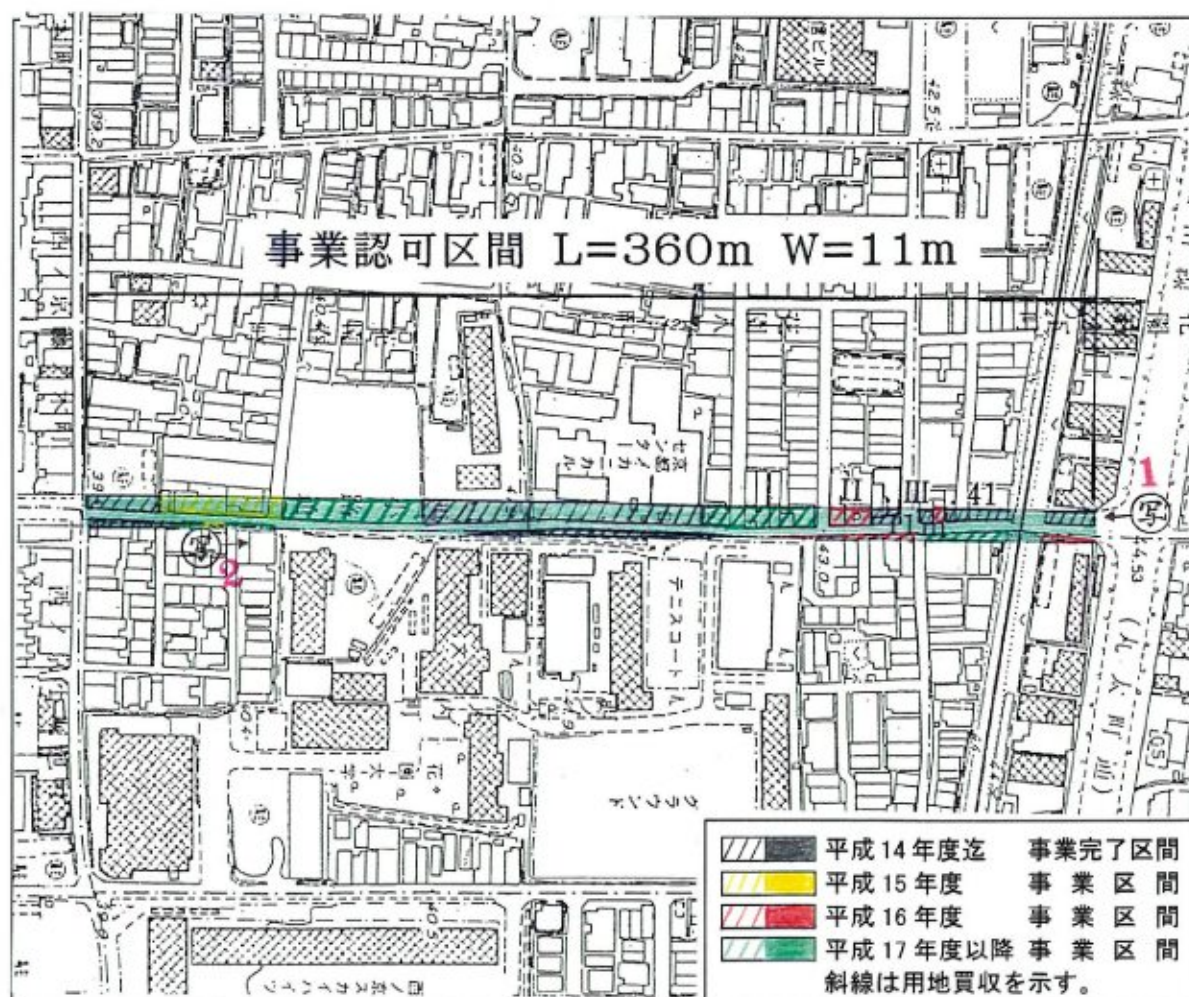

[断面図]

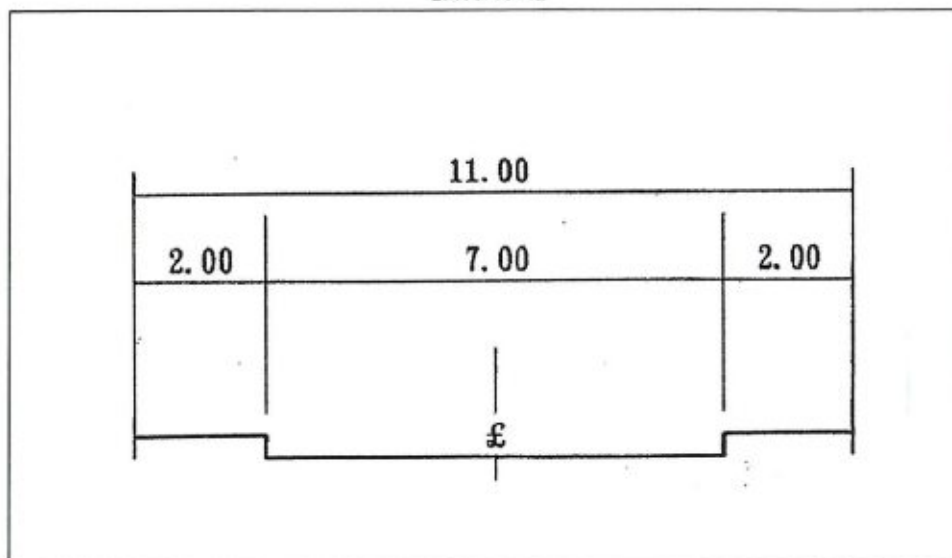

[現況写真]

1



2

