



平成 13 年度 再評価対象事業一覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年を経過した後も未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業
- ③ 事業の進捗状況や社会経済情勢の急激な変化による事業

種 別	番号	補単	事 業 名	該当条件	対応方針
河川事業	1	補	七瀬川	②	「事業継続」
街路事業	2	単	西小路通	②	「事業継続」

＊補は国庫補助事業，単は京都市単独事業を示す。

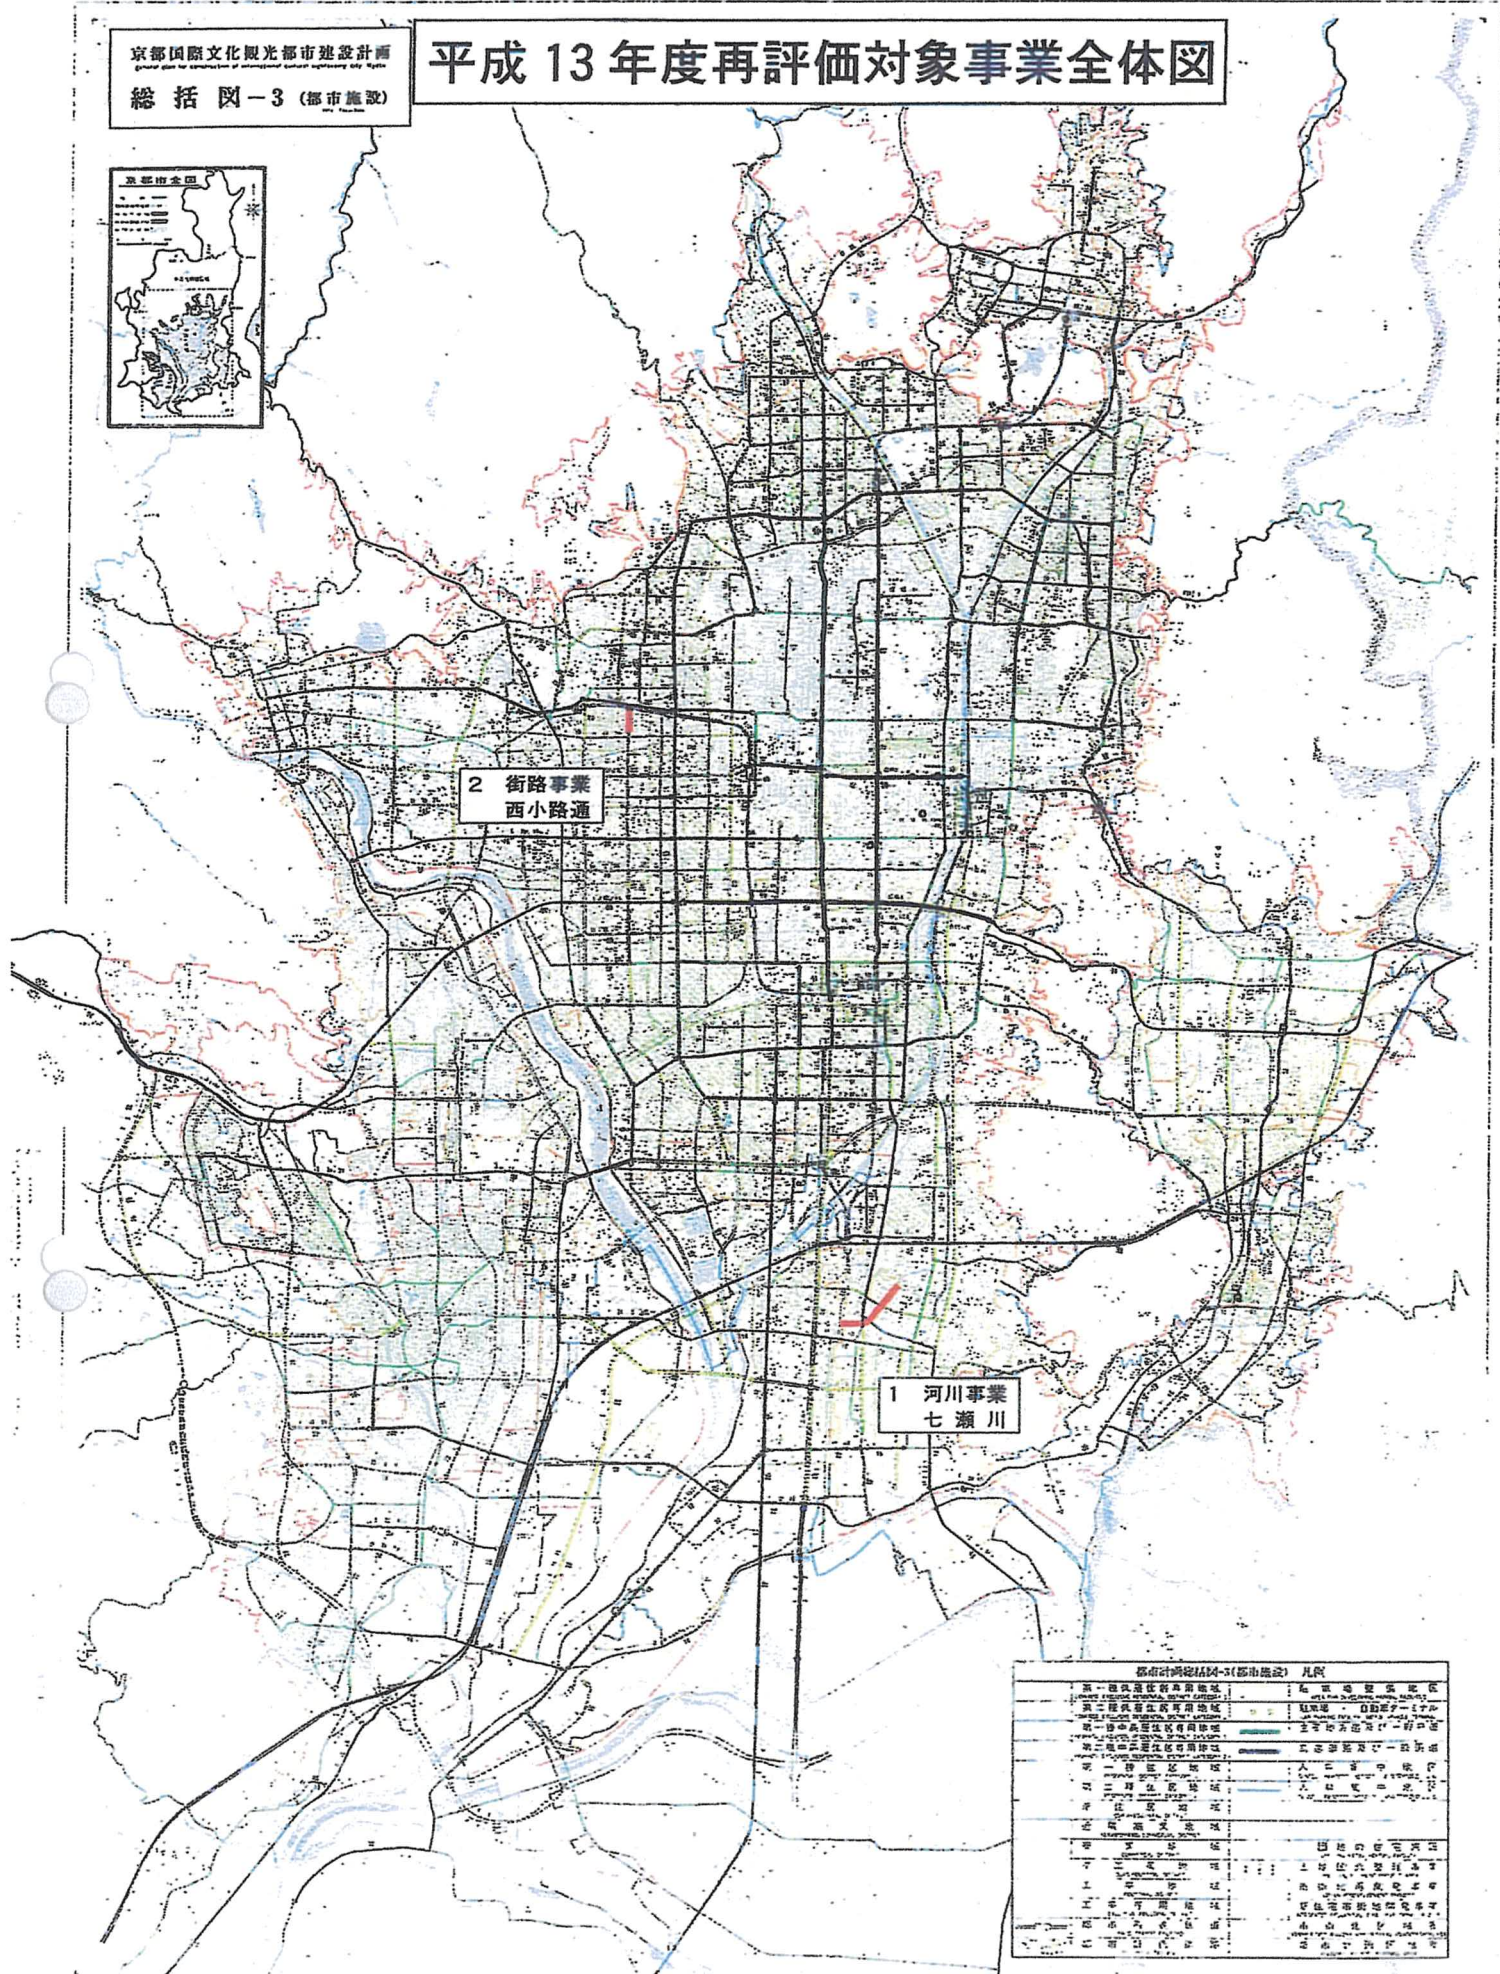


平成13年度再評価事業フォローアップ調書


(平成17年3月末)

事業名	河川事業 七瀬川		事業所管課	京都市建設局 水と緑環境部河川課	
事業区間	自：伏見区竹田狩賀町（東高瀬川合流部） 至：伏見区深草大亀谷東久宝寺町（遊水池）		延長及び幅員	延長L＝1,095m（950+145） 幅員W＝10.80～15.70m	
事業採択年度	平成4年度	完成予定年度	当初：平成13年度 変更：平成19年度		
事業進捗					
年度	全体事業	平成15年度以前	平成16年度	平成17年度	平成18年度以降
工事	L＝ 1,095m C＝ 5,220百万円	上部河川 L＝390m 下部河川 L＝840m 下部河川(流入工) L＝110m C＝ 3,980百万円	上部河川 L＝80m 下部河川(流入工) L＝110m C＝ 234百万円	上部河川 L＝270m 下部河川(流入工) L＝110m C＝ 651百万円	上部河川 L＝100m 下部河川(流入工) 上部河川(流入工) 浄化施設(流入工) L＝110m C＝ 355百万円
用地	A＝ 5,694 m ² C＝ 2,170百万円	A＝ 3,602 m ² C＝ 1,387百万円	A＝ 0 m ² C＝ 0百万円	A＝ 0 m ² C＝ 0百万円	A＝ 2,076 m ² C＝ 783百万円
その他	測量委託 C＝ 2,272百万円	C＝ 2,124百万円	C＝ 129百万円	C＝ 5百万円	C＝ 14百万円
計	C＝ 9,662百万円	C＝ 7,491百万円	C＝ 363百万円	C＝ 656百万円	C＝ 1,152百万円
進捗率		77.5%	81.3%	88.1%	100%
平成13年度再評価時点での課題，問題点					
① 流入工部での上水道・下水道本管等の移設補償工事の協議					
② 浸水被害の早期軽減の観点から，遊水池整備について早期に着手することを検討する。					
③ 上部河川計画において住民の意見を反映し，整備後の河川の維持管理にも住民が積極的にかかわれる協力体制をつくるなど，住民に親しまれる川づくりを目指していく。					
平成16年度取組					
・二層式河川上部 L＝80m ・流入工部 L＝110m ・流入工部移設補償工事 一式					
平成17年度以降取組					
当面の目標					
国道24号線から上流側の二層式河川区間（新門丈橋まで）上部河川 L＝450m 及び 下部河川(流入工)[4年工事国債] L＝110m の完成					
事業効果					
都市河川としての治水安全度の向上（下部河川）及び水辺空間の環境整備（上部河川）					
発現年度					
平成19年度					


[箇所図]

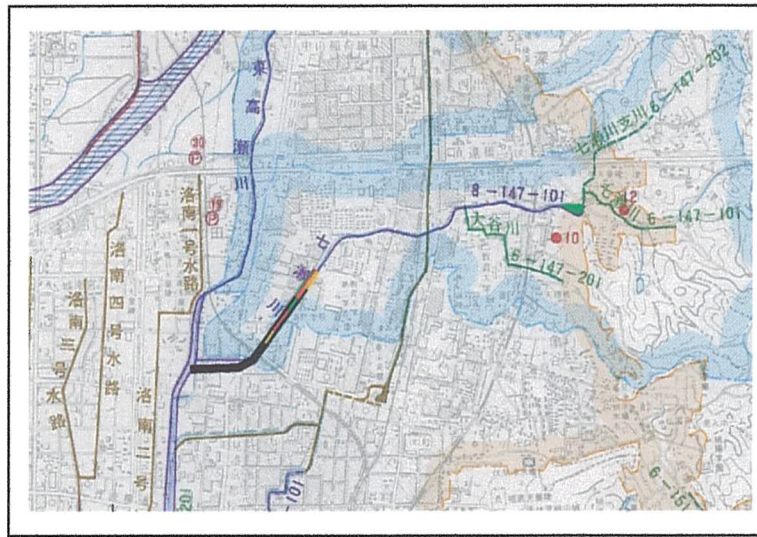

[模式図]

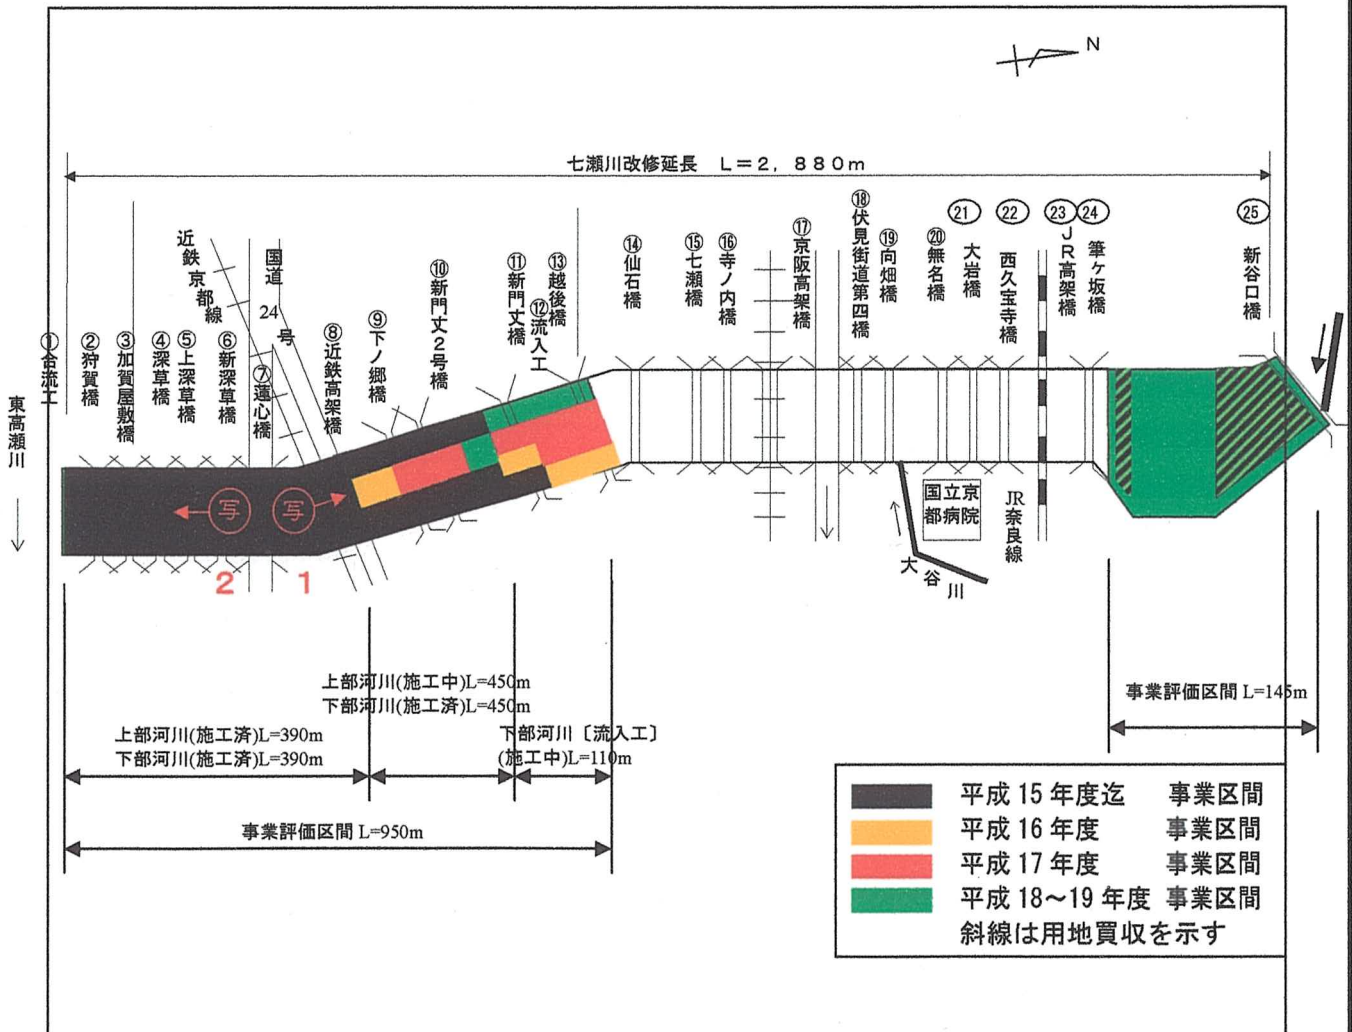

[断面図]

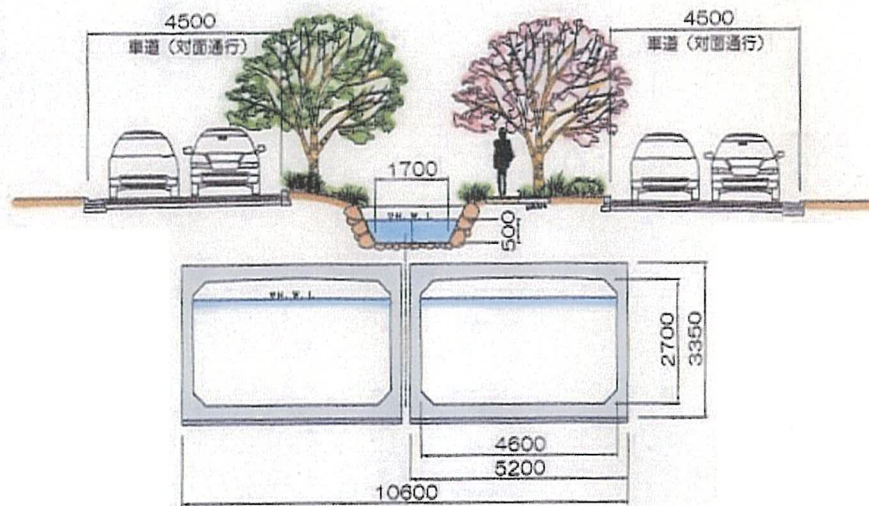

[現況写真]


1



2



流入工部イメージ図

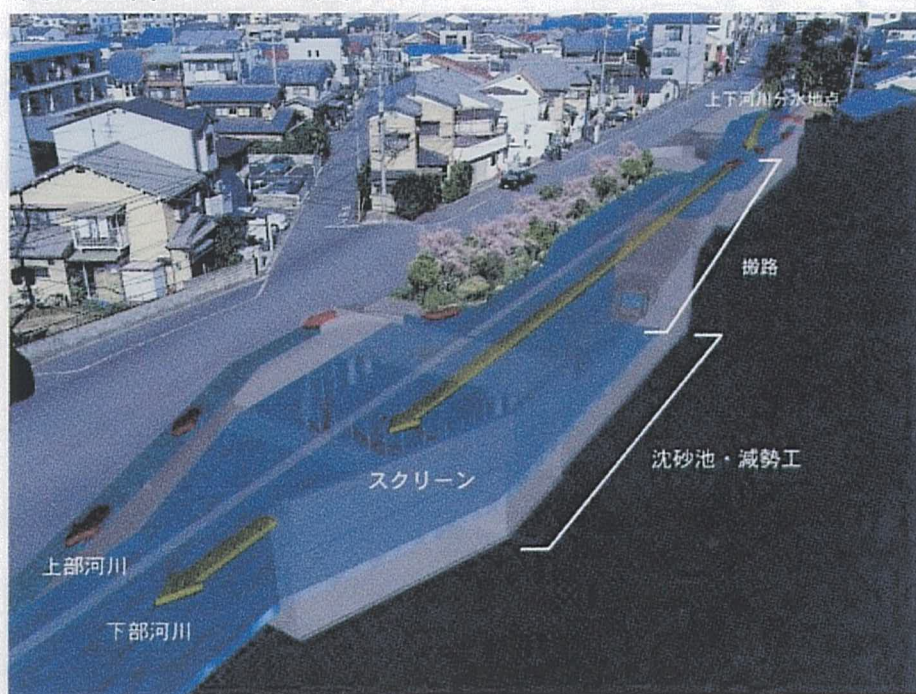


平成13年度再評価事業フォローアップ調書


(平成17年3月末)

事業名	街路事業 西小路通		事業所管課	建設局街路部街路建設課	
事業区間	自：右京区花園春日町（旧二条通） 至：右京区花園藪ノ下町（丸太町通）		延長及び幅員	延長：360m 幅員：11m	
事業採択年度	平成4年度	完成予定年度	当初：平成7年度 変更：平成20年度（事業認可最終施行年度）		
事業進捗 ※（ ）内は、公社先行取得分					
年度	全体事業	平成15年度以前	平成16年度	平成17年度	平成18年度以降
工事	L= 360 m C= 80 百万円	L= 0 m C= 0 百万円	L= 0 m C= 0 百万円	L= 0 m C= 0 百万円	L= 360 m C= 80 百万円
用地	A= 2,531 m ² C= 1,288 百万円	A= 1,335 m ² (336 m ²) C= 708 百万円 (210 百万円)	A= 0 m ² C= 0 百万円	A= 0 m ² (249 m ²) C= 0 百万円 (98 百万円)	A= 1,196 m ² C= 580 百万円
その他	C= 54 百万円	C= 33 百万円	C= 0 百万円	C= 0 百万円	C= 21 百万円
計	C= 1,422 百万円	C= 741 百万円	C= 0 百万円	C= 0 百万円	C= 681 百万円
進捗率		52.1%(66.9%)	52.1%(66.9%)	52.1% (73.8%)	100%
平成13年度再評価時点での課題、問題点 - 平成8年度の国の補助重点化方針の影響により、予算の確保ができなくなったが、地元住民による事業の推進の要望及び一部地権者からの用地買収の請求に応えられるよう、予算の確保に努める。 - 境界確定作業が難航している。 - 地域の生活環境への配慮や安全性の確保及びバリアフリー化を図るなど、良好な地域環境の形成に努める。					
平成16年度 of 取組 用地境界の確定作業を行った。					
平成17年度以降 of 取組 当面の目標 用地境界の確定作業及び用地買収を進める。 事業効果 本市西部地域の道路ネットワークの形成を図ることにより、安全で円滑な道路交通を確保するとともに、歩道の整備により、歩行者等の安全確保を図る。					


[箇所図]

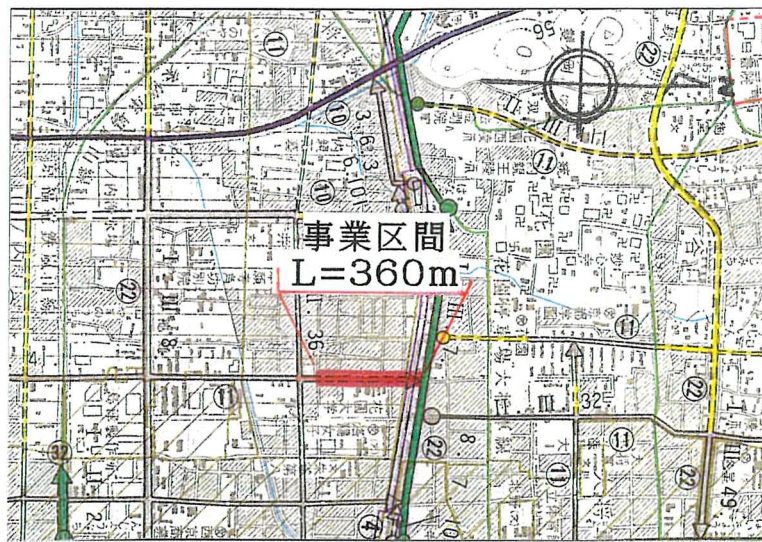

[模式図]

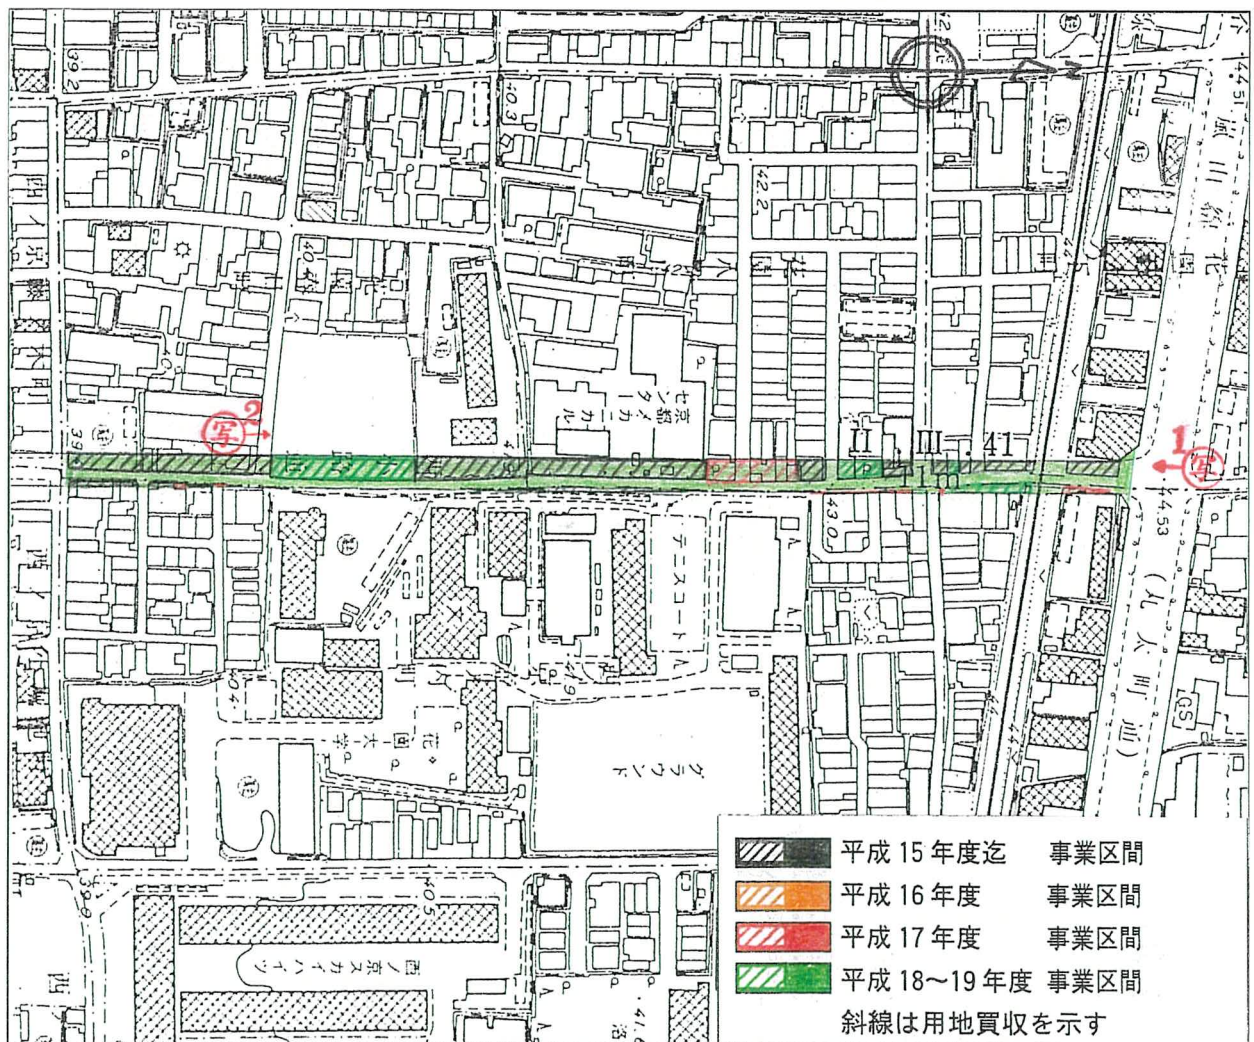

[事業概要]

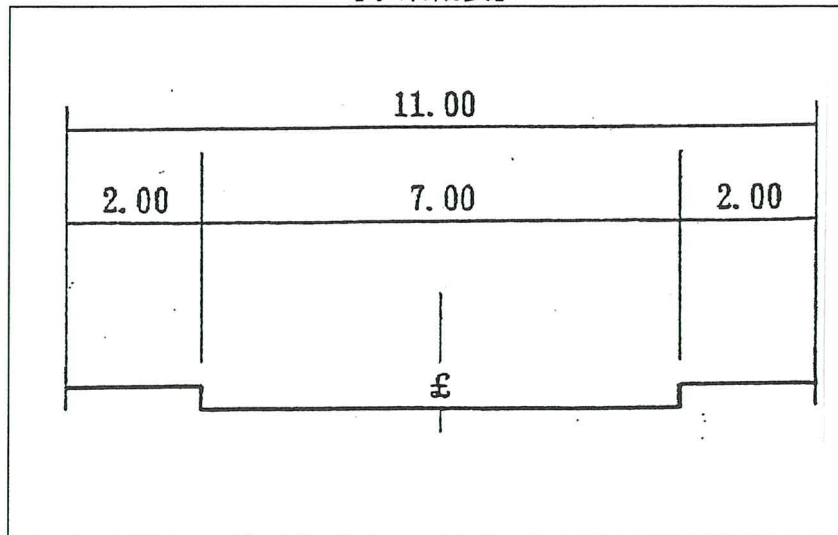

[写 真]

1



2

