

今熊野橋ニュース

～ 今熊野橋架け替え工事 着手のお知らせ ～

11月 1日から東大路通の交通規制（終日片側 1 車線規制）を開始します。


10月25日から今熊野バス停を南側（約120m）に移設します。

※上記に先立ち、10月上旬から準備工事（ヤード整備やバス停移設整備等）を実施します。

日ごろは、本市建設行政に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。

今年度から今熊野橋で着手する架け替え工事の内容についてお知らせします。工事期間中は東大路通の通行規制を切替ながら進めさせていただきます。

地域住民の皆様には、通行規制や騒音等で、御迷惑をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

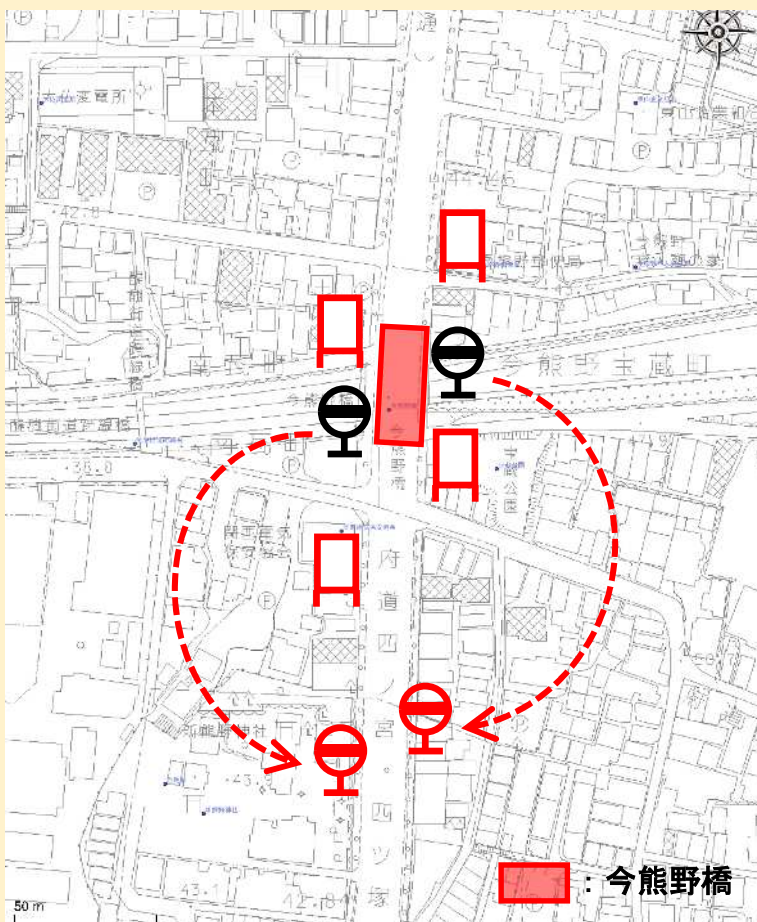

北行きバス停
(新熊野神社前)



南行きバス停
(今熊野商店街コミュニティホール前)


※ 工事や規制内容の詳細は次ページ以降をご覧ください

※ 規制切替，通行止めの時期は，現場周辺に設置する予告看板  等でお知らせします

1

回覽

裏面もご覧ください




これまでのニュースはこちら！

● 工事内容

- 1 工事名 今熊野橋補修（その1）工事
- 2 工事場所 今熊野橋（一般府道四ノ宮四ツ塚線（東大路通））
- 3 工事期間 令和3年10月1日 ～ 令和5年3月15日（予定）
 ※通行規制期間は令和3年11月～令和4年12月（予定）
 ※土曜日・日曜日は原則として工事は実施しません。
- 4 工事時間（昼間）午前8時～午後6時（夜間）午後9時～午前6時
 ※作業の都合により、時間が前後する場合があります。
- 5 工事内容 今熊野橋を架け替えるために必要な橋台（土台）をつくります。
- 6 請負業者 大鉄工業株式会社 今熊野作業所 TEL 075-708-5061
 現場責任者 井上 携帯 080-2950-9612
 監理技術者 岡本
- 7 交通規制 東大路通は終日、片側1車線規制となり、工事範囲を3ステップに分けて、通行規制を切替ながら工事を行います。
 通学時の安全を確保するため、誘導員は午前7時から配置します。
 工事車両の通行は東大路通とし、周辺の生活道路は通行しません。

8 工事スケジュール


工事スケジュールとステップ図の色を合わせていますので、ご確認ください。

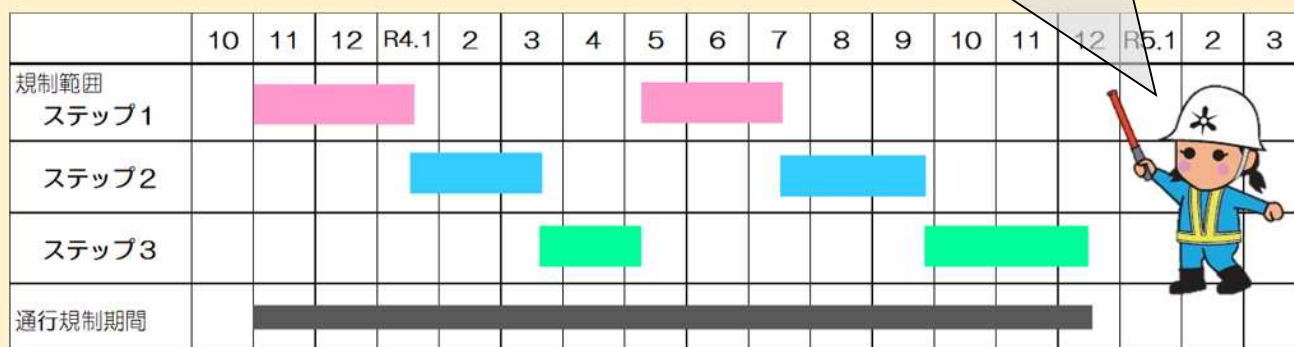

※ 各ステップの規制内容は、3～5ページをご覧ください ➡

● 架替事業全体スケジュール

今回の工事は、赤丸部分の工事になります。事業は長期間となりますが、安全第一で進めます。

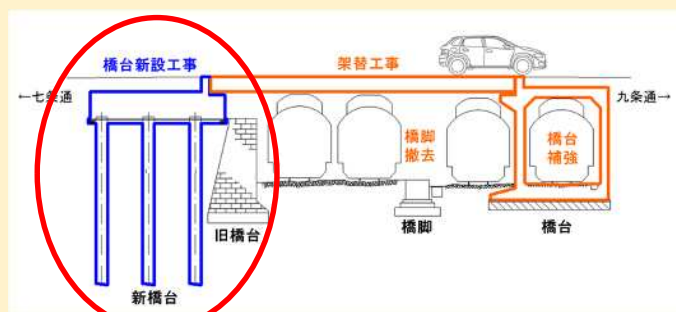

● ステップ1 (R3.11月～R4.1月頃, R4.5月～7月頃)

- ・東大路通の東側を規制します。
- ・大型機械使用時は、東側の郵便局前枝道が**車両通行止 (5日程度)**になるため、迂回をお願いします。(昼間のみ。歩行者は通行可)
- ・東側歩道の一部が通行不可になるため、仮歩道の通行をお願いします。また、作業状況により歩道の迂回をお願いする場合があります。

通常規制

(期間)

- ・合計 4.5カ月間程度

(誘導員)

- ・歩道部× 5名
- ・工事車両出入× 1名

(歩道)

- ・仮歩道の通行をお願いします
- ・**迂回をお願いする場合があります**
- ※上記の内、40日程度



車両通行止時

- ・東側の郵便局前枝道が**車両通行止**【歩行者通行可】

(期間)

- ・合計 5日程度
- 【昼間のみ】

(誘導員)

- ・歩道部× 2名
- ・工事車両出入× 1名
- ・通行止部× 1名

(歩道)

- ・仮歩道の通行をお願いします



※ 通行止めの時期は、現場周辺に設置する予告看板等でお知らせします

● ステップ2 (R4.1月～3月頃, R4.7月～9月頃)

- ・ 東大路通の中央を規制します。西側のJR沿い枝道への**車両の右折が終日不可**になります。
- ・ 大型機械使用時は、各道路からの**車両の右折が不可(30日程度)**になるため、迂回をお願いします。(昼間のみ)
- ・ 東大路通の東西の**歩道は終日通行できます**。

通常規制

- ・ 西側のJR沿い枝道への**車両の右折は終日不可**

(期間)


- ・ 合計 4.5カ月間程度

(誘導員)

- ・ 工事車両出入×2名

(歩道)

- ・ **終日通行可**

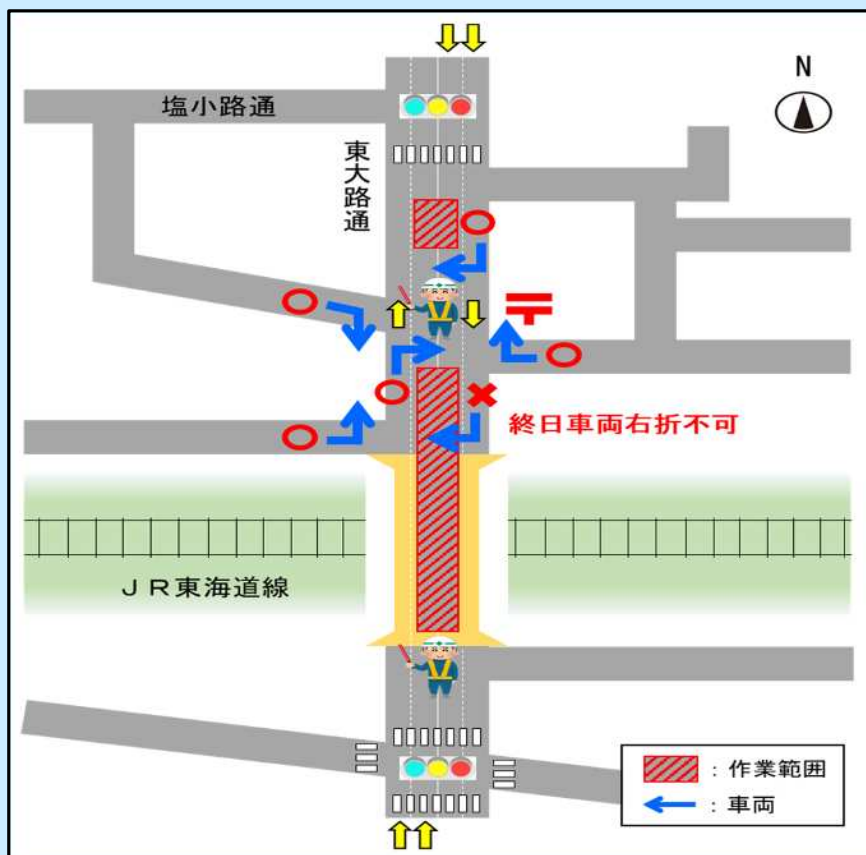

車両右折不可時

- ・ 各道路からの**車両の右折が不可【昼間のみ】**
- ・ 西側のJR沿い枝道への**車両の右折は終日不可**

(期間)

- ・ **合計 30日程度【昼間のみ】**

(誘導員)

- ・ 工事車両出入×2名

(歩道)

- ・ **終日通行可**



※ 右折不可の時期は、現場周辺に設置する予告看板等でお知らせします

● ステップ3 (R4.3月～R4.5月頃, R4.9月～12月頃)

- ・東大路通の西側を規制します。
- ・西側のJR沿い枝道が**終日車両通行止**になるため、迂回をお願いします。(歩行者は通行可)
- ・西側歩道の一部が通行不可になるため、仮歩道の通行をお願いします。また、作業状況により歩道の迂回をお願いする場合があります。

通常規制

- ・西側のJR沿い枝道が**終日車両通行止**
【歩行者通行可】

(期間)

- ・合計 4.5カ月間程度

(誘導員)

- ・歩道部×2名
- ・工事車両出入×1名
- ・通行止部×2名

(歩道)

- ・仮歩道の通行をお願いします



歩道迂回時

- ・西側のJR沿い枝道が**終日車両通行止**
【歩行者通行可】

(期間)

- ・合計 2週間程度
【昼間のみ】

(誘導員)

- ・歩道部×5名
- ・工事車両出入×1名
- ・通行止部×2名

(歩道)

- ・迂回をお願いします



※ 通行止めの時期は、現場周辺に設置する予告看板等でお知らせします

● 請負業者のあいさつ

この度、本工事を請け負わせて頂くこととなりました、大鉄工業株式会社でございます。
今まで100年以上にわたり東大路通という京都の大動脈を支えてきた今熊野橋を架け替えるプロジェクトが無事に完了するよう精励する所存でございます。

今回の工事では、通行規制の範囲を最小限にするため、公園や高架下のヤードも活用しながら進めさせていただきます。

工事に際し、道路の通行規制や騒音・振動など近隣住民の皆様大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

大鉄工業(株)今熊野作業所 職員一同



公園ヤード
(宝蔵公園プール部分)



高架下ヤード
(鴨川東岸線高架下)

● 今後の予定

- 東大路通の沿道、通行止等の影響がでる地域、小中学校等については、別途、通行規制に係るチラシを配布し周知するほか、工事場所に設置している予告看板（1ページ目の箇所図参照）で規制切替のタイミング等について事前にお知らせします。
- 工事の内容や進捗につきましては、今後も『今熊野橋ニュース』でお知らせします。

6

京都市 建設局 土木管理部 橋りょう健全推進課 担当：大塚，大村

TEL：075-222-3561

FAX：075-213-5181

e-mail：kyoryo@city.kyoto.lg.jp



京都市
CITY OF KYOTO

京都市では、橋の歴史や補修取組、有名な橋を紹介した冊子「^{みやこ}京の橋しるべ」と、道路や公園などの損傷箇所を投稿するアプリ「^{みやこ}みつけ隊」を配信しています。

詳しくは Web で！

京の橋しるべ

検索



&

みつけ隊 募集中

検索

