




■ 既存棟工事工程表案①

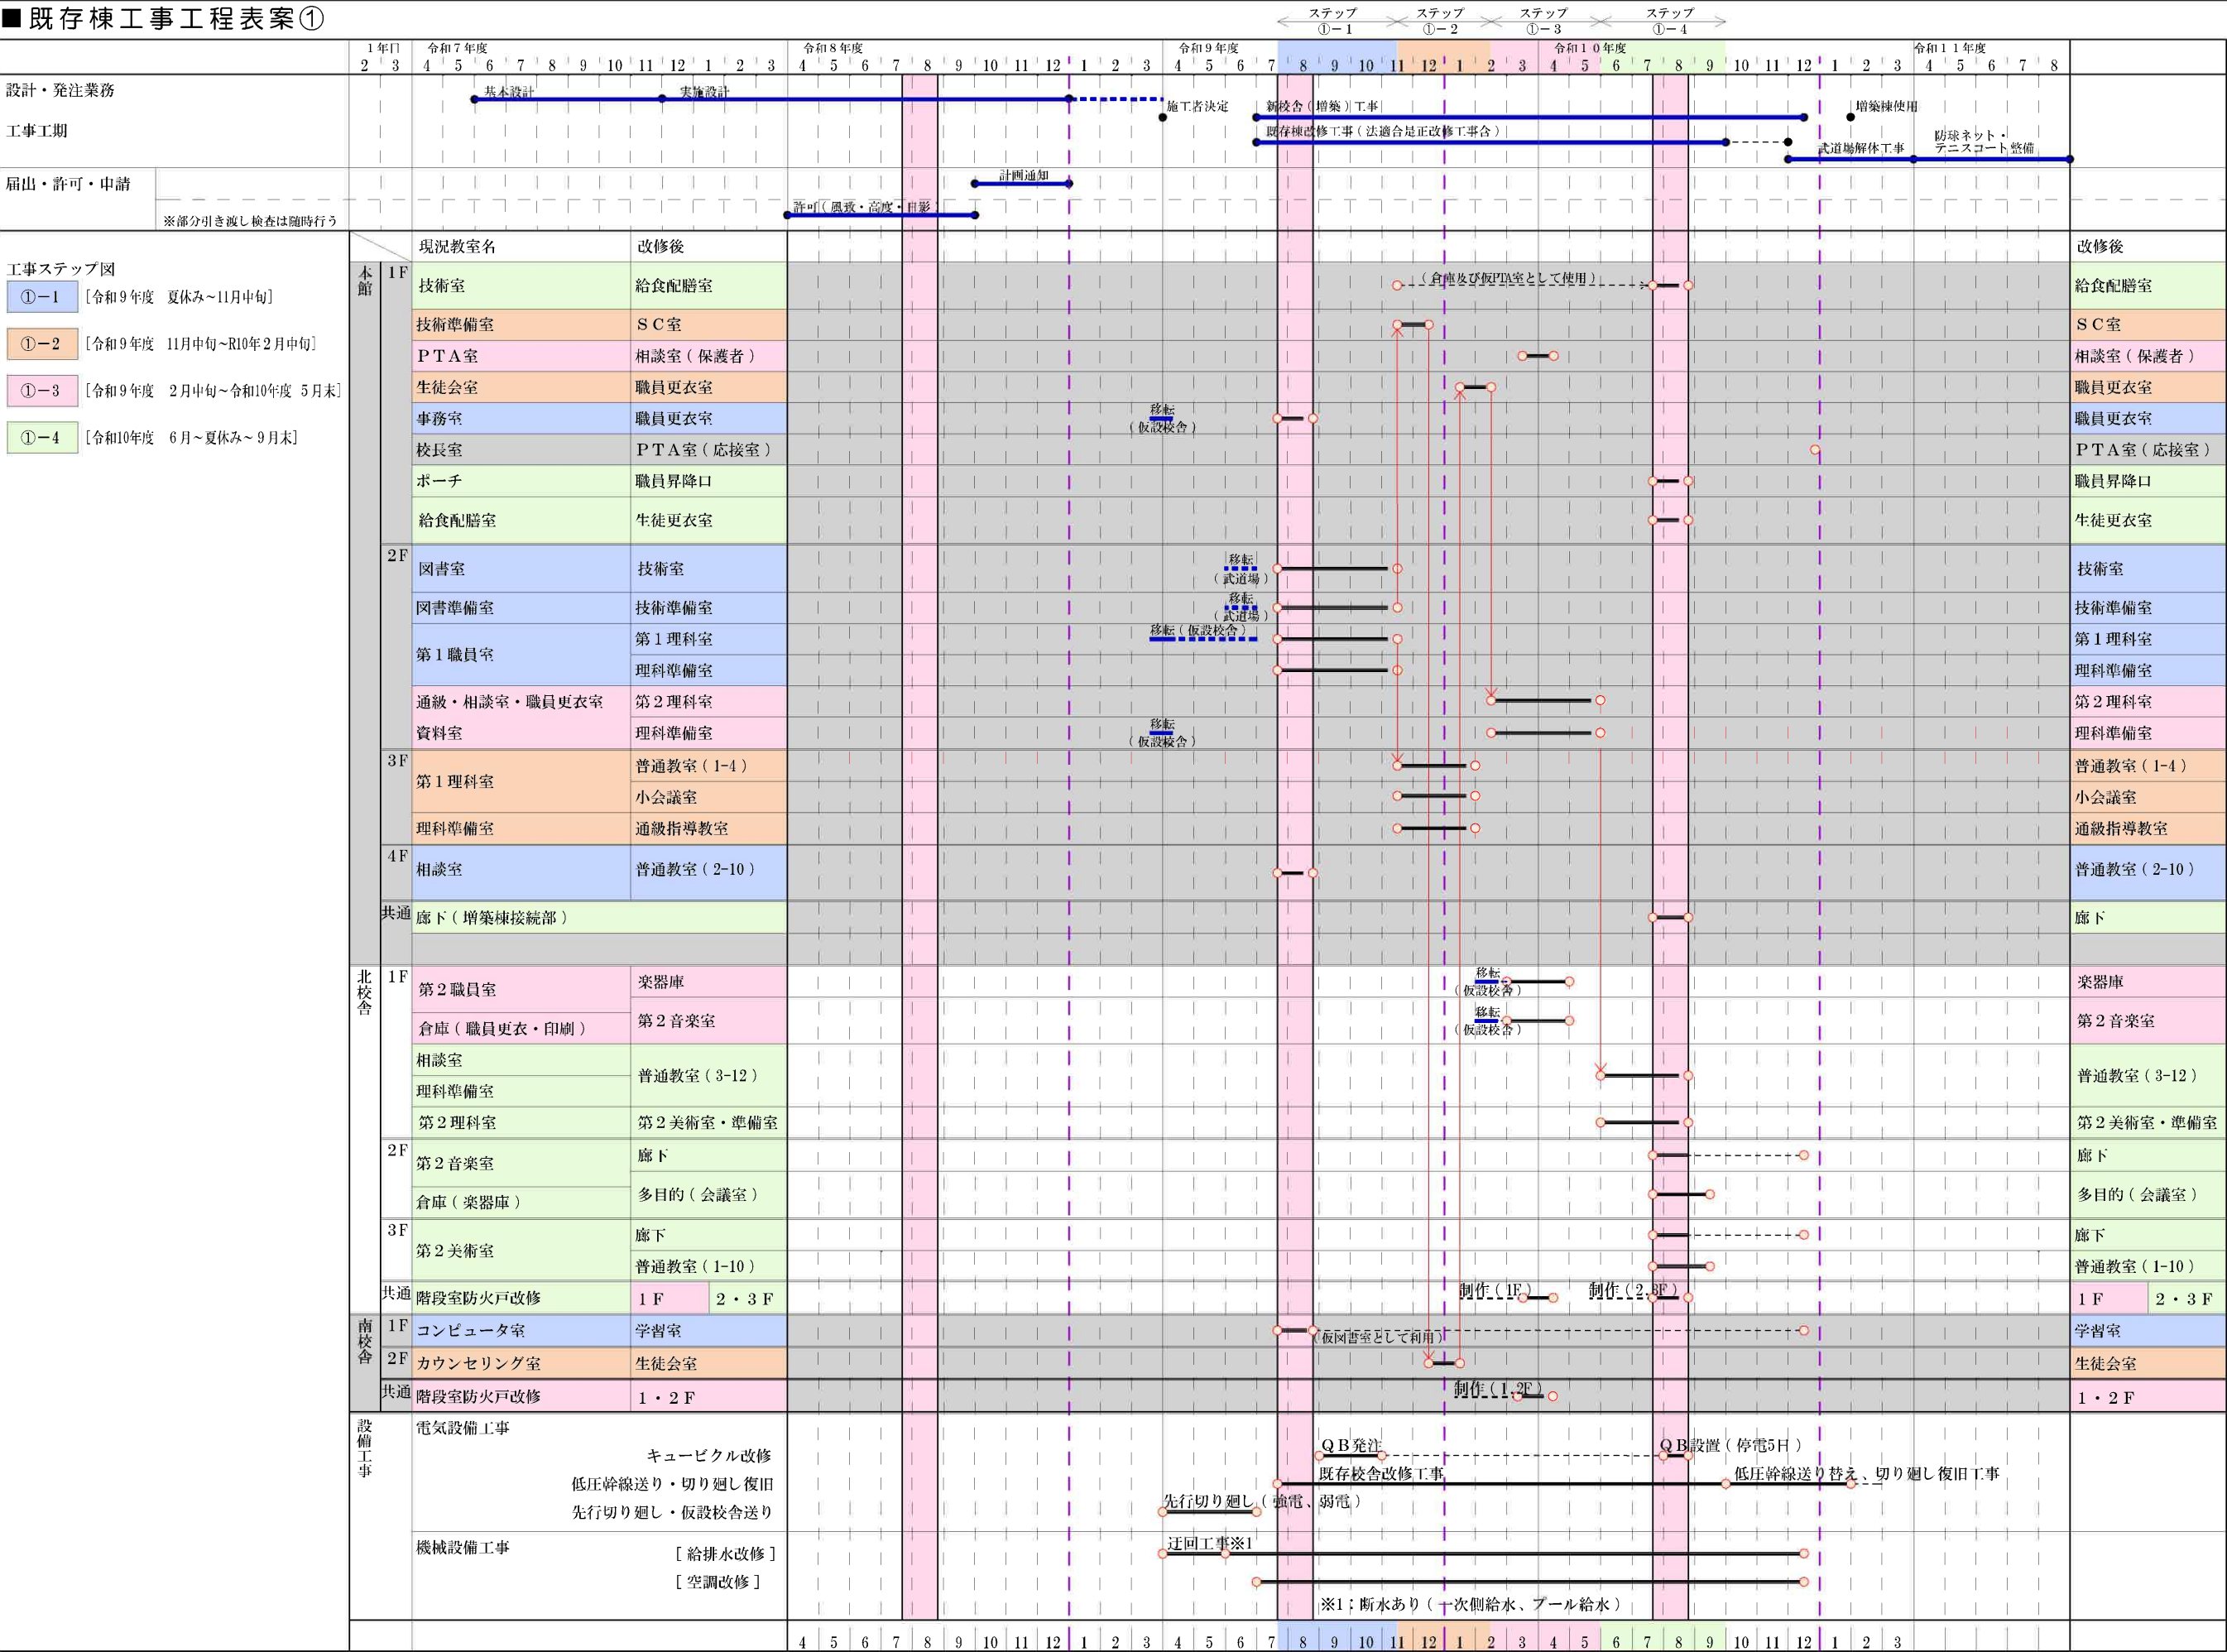


既存棟現況平面図

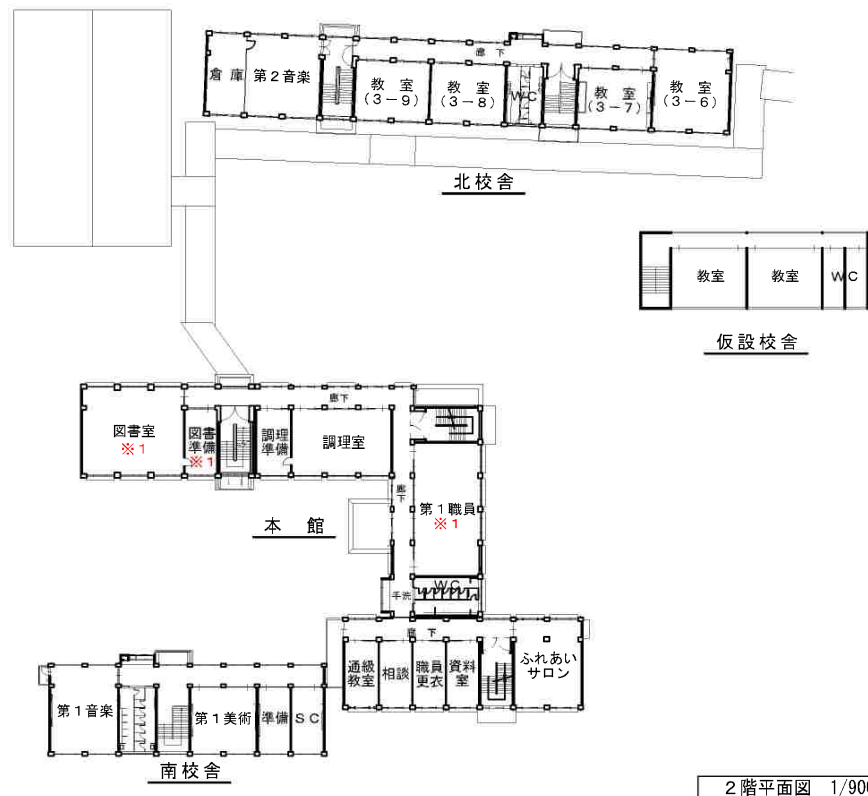


2階平面図 1/900

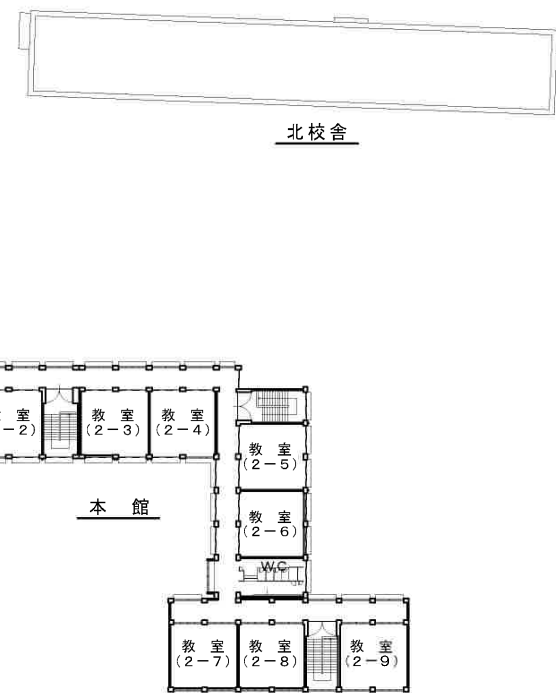

4階平面図 1/900

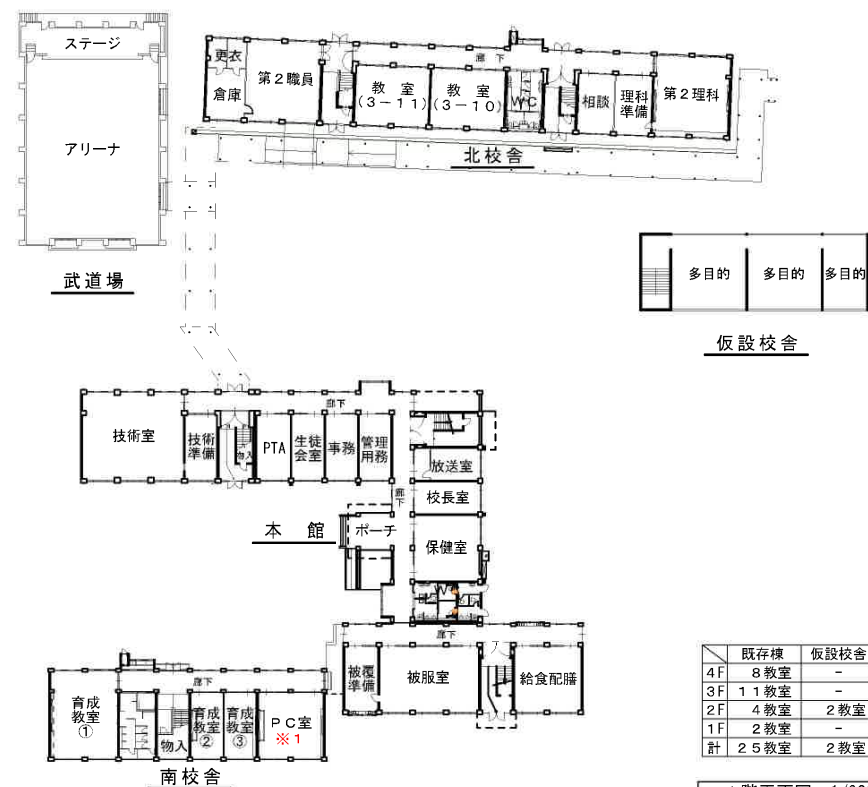


1階平面図 1/900

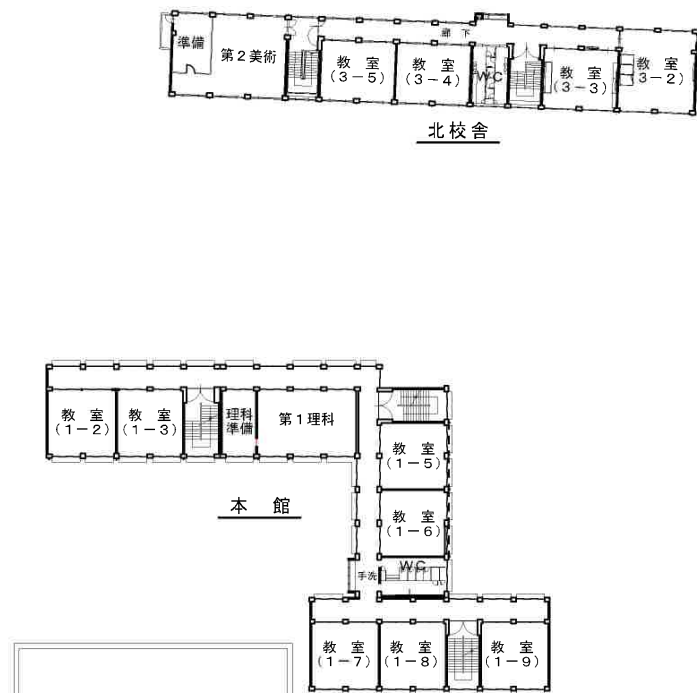


3階平面図 1/900


①-1 [令和9年度 夏休み～11月中旬]

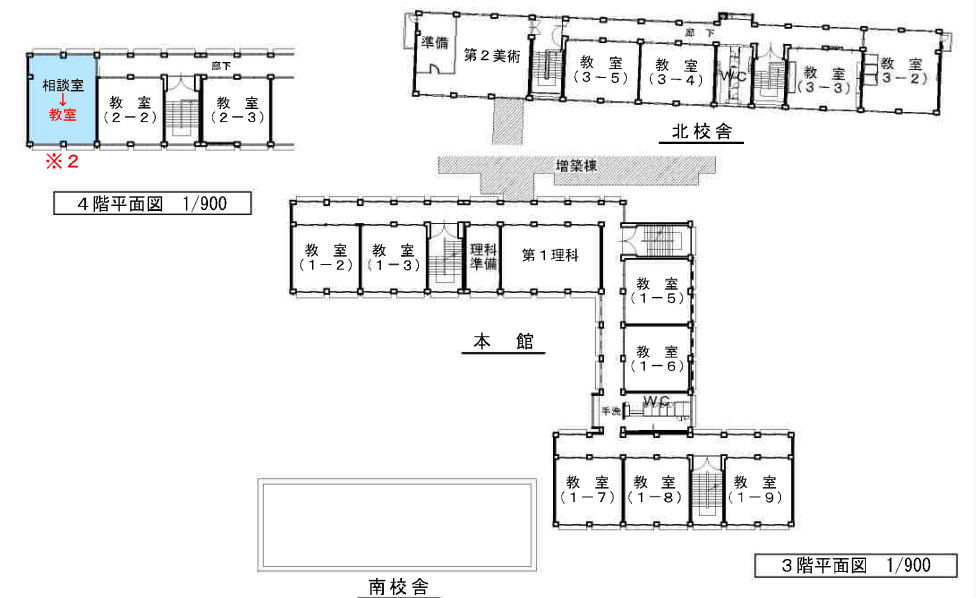

3階平面図 1/900

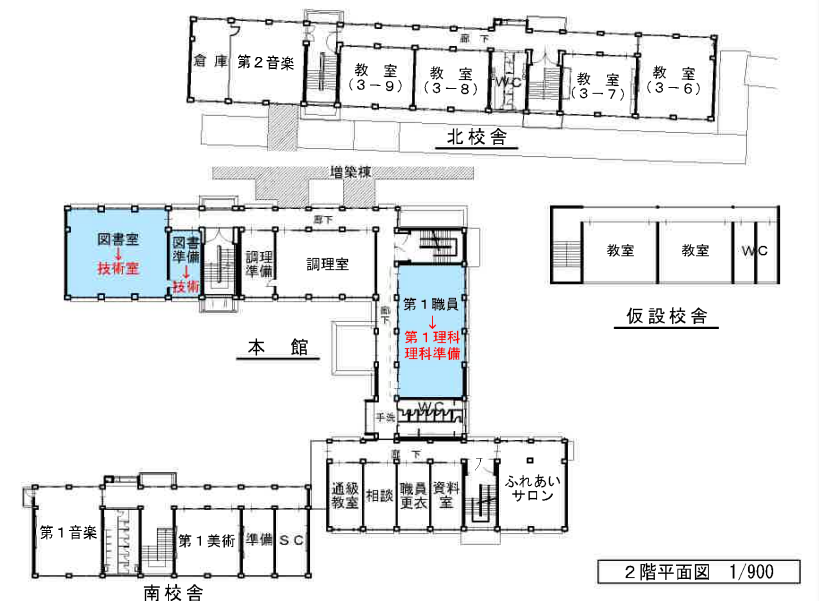

2階平面図 1/900

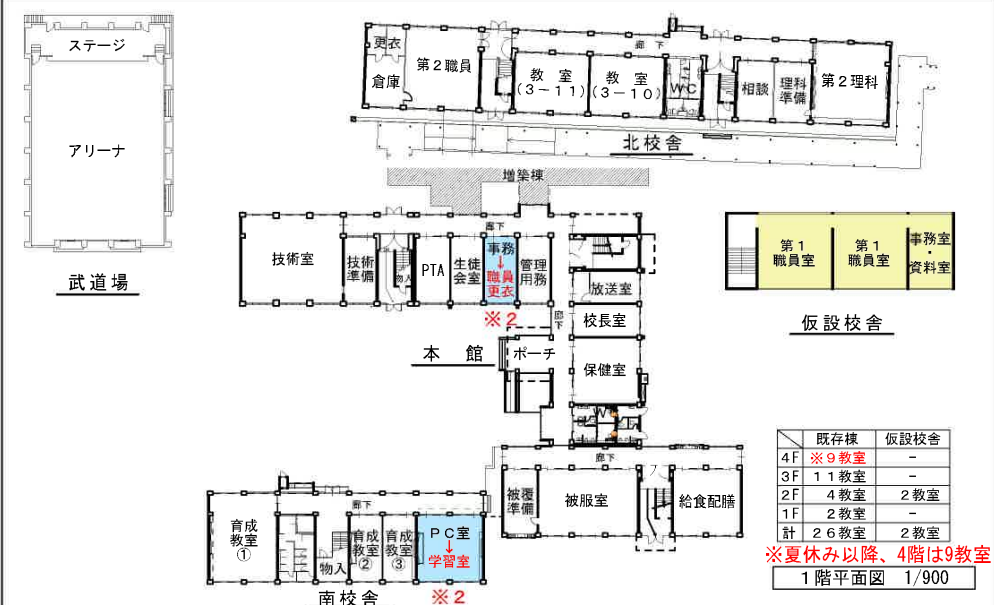




1階平面図 1/900

工事完了部分
 廊下・階段防火戸改修工事
 [室名]-移転先教室・改修後教室等
----- 仮設間仕切壁

内装工事

- ※1：工事着手までに移設が必要
- ※2：夏休み工事
- ※3：増築棟完成まで使用不可

①-2 [令和9年度 11月中旬～R10年2月中旬]

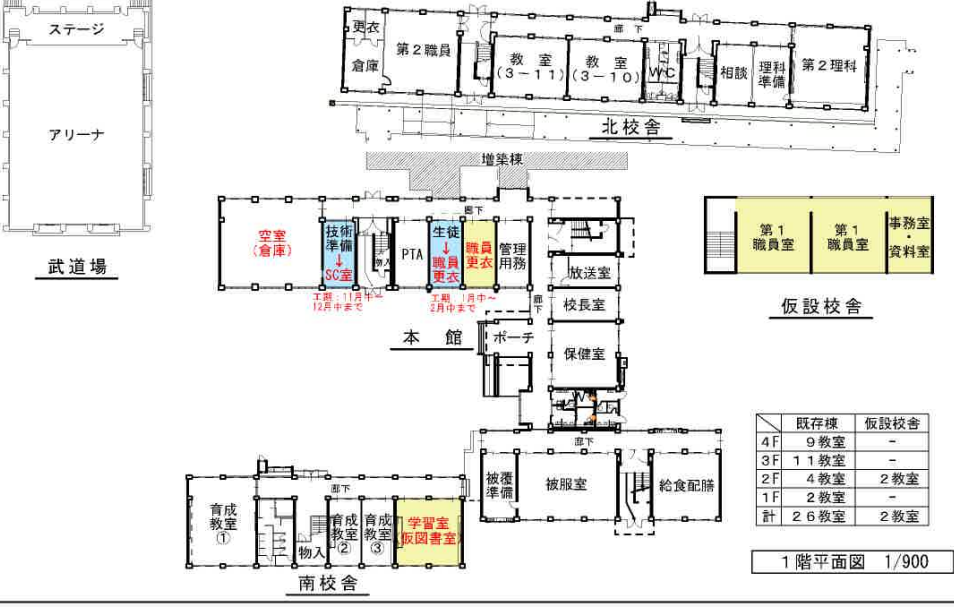
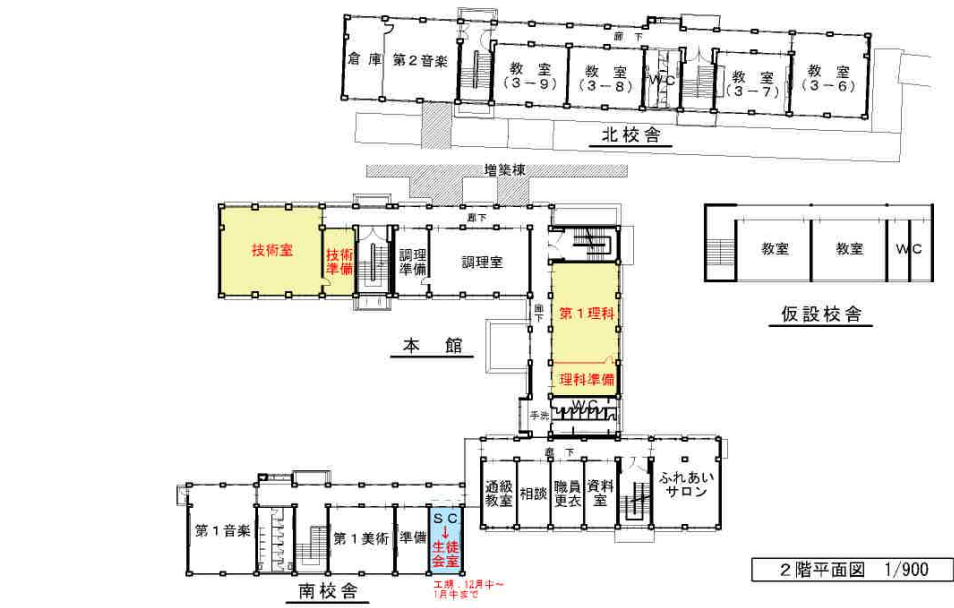
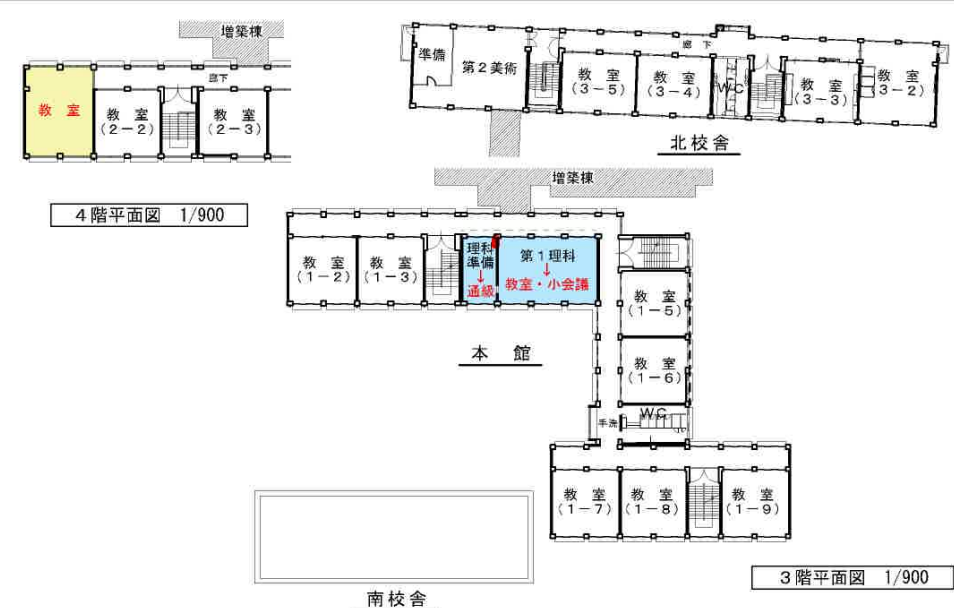


■ 工事完了部分 ■ 廊下・階段防火戸改修工事 ■ 仮設間仕切壁

■ 内装工事 ■ 増築棟を示す




※1: 工事着手までに移設が必要
※2: 夏休み工事
※3: 増築棟完成まで使用不可
※4: 春休み工事

①-3 [令和9年度 2月中旬～令和10年度 5月末]

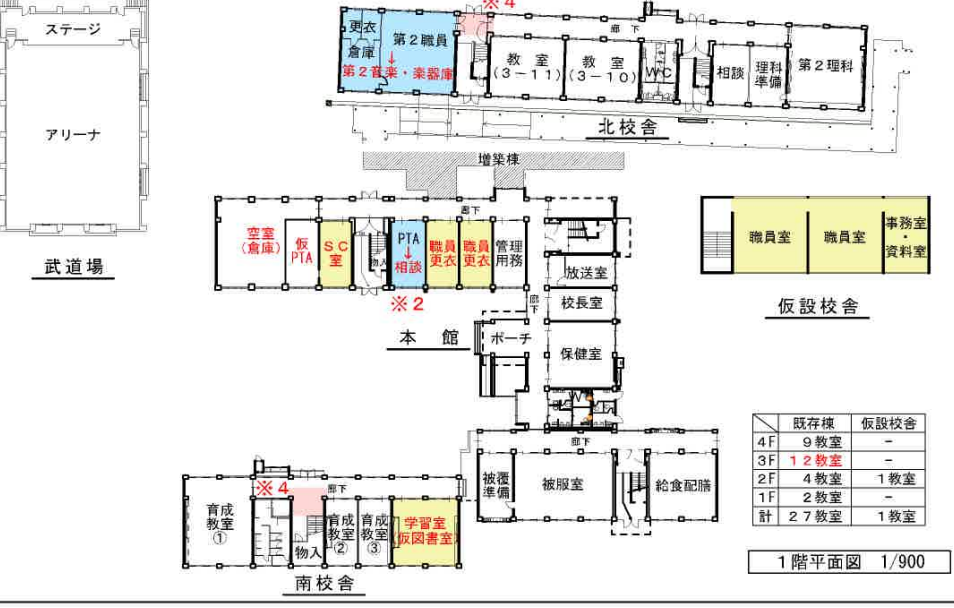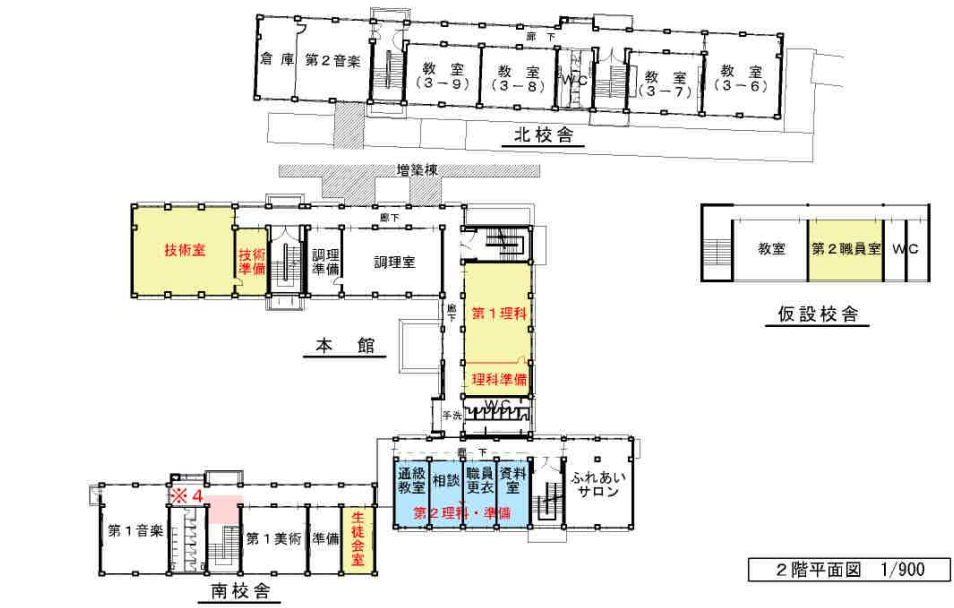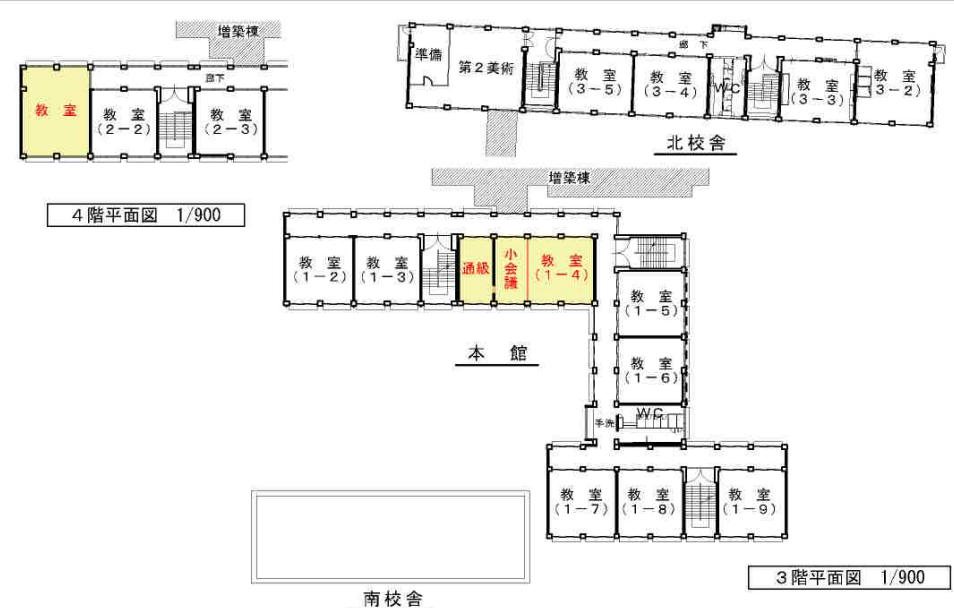


※1: 工事着手までに移設が必要
※2: 夏休み工事
※3: 増築棟完成まで使用不可
※4: 春休み工事

①-4 [令和10年度 6月～夏休み～9月末]

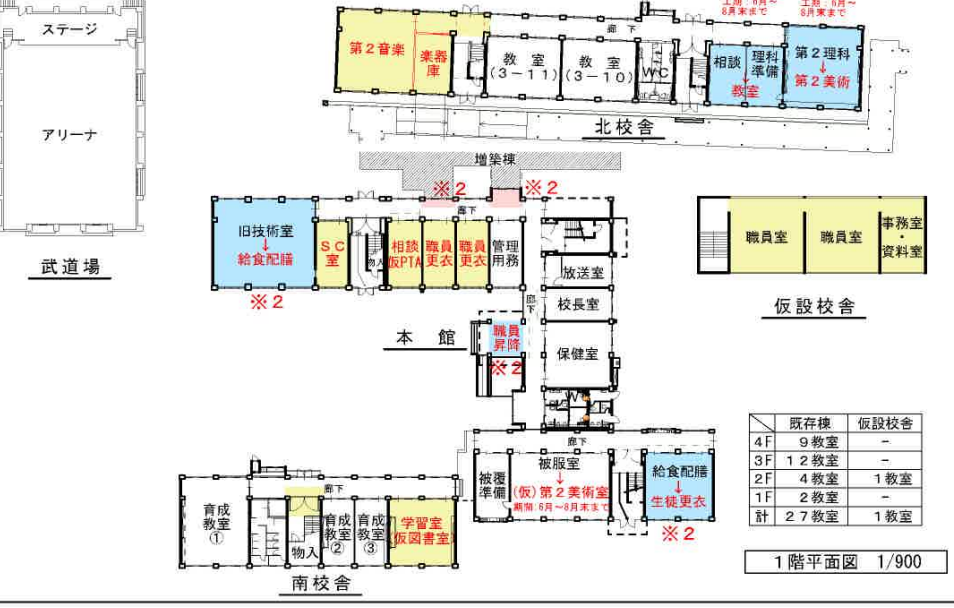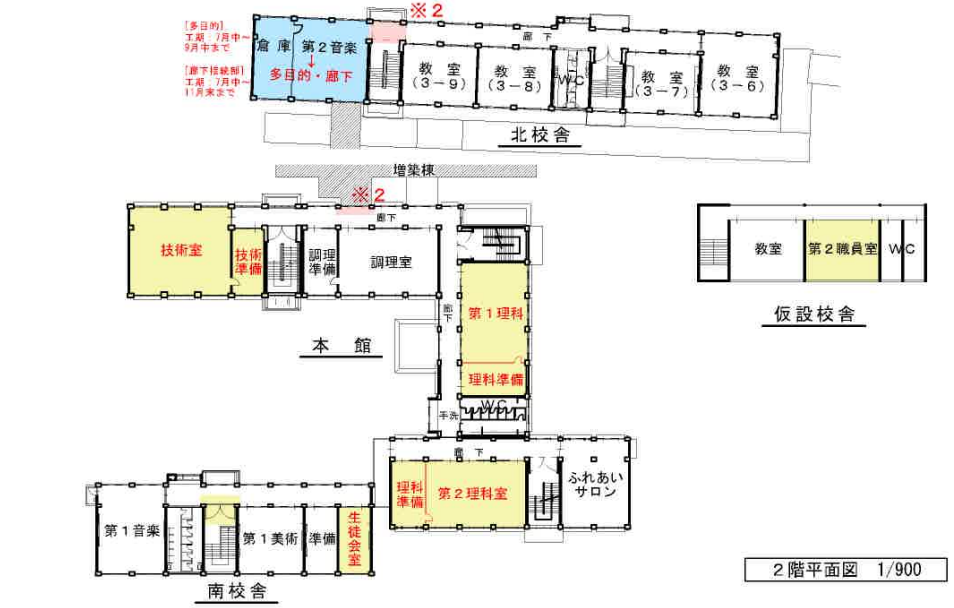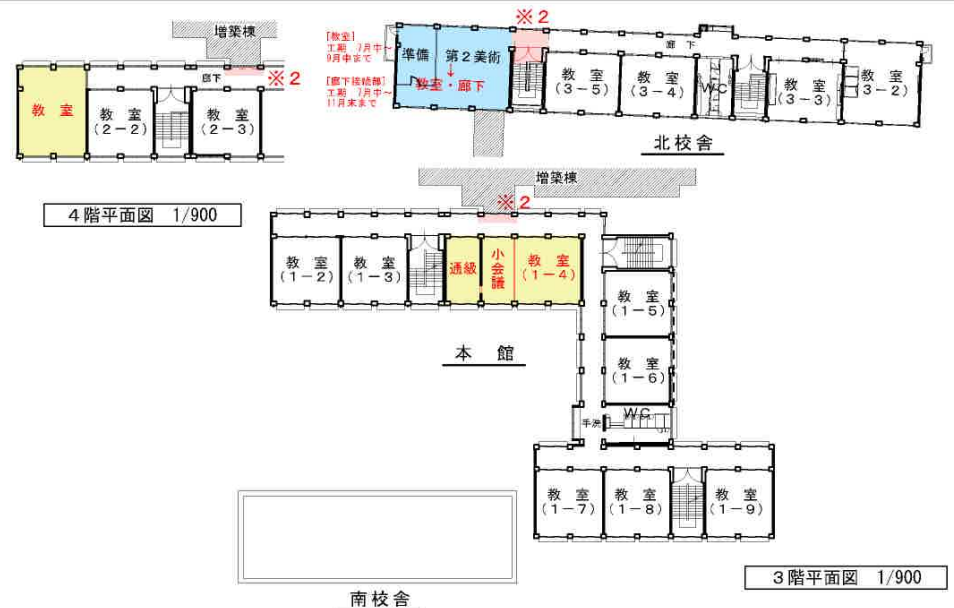


※1: 工事着手までに移設が必要
※2: 夏休み工事
※3: 増築棟完成まで使用不可
※4: 春休み工事


改修工事完了

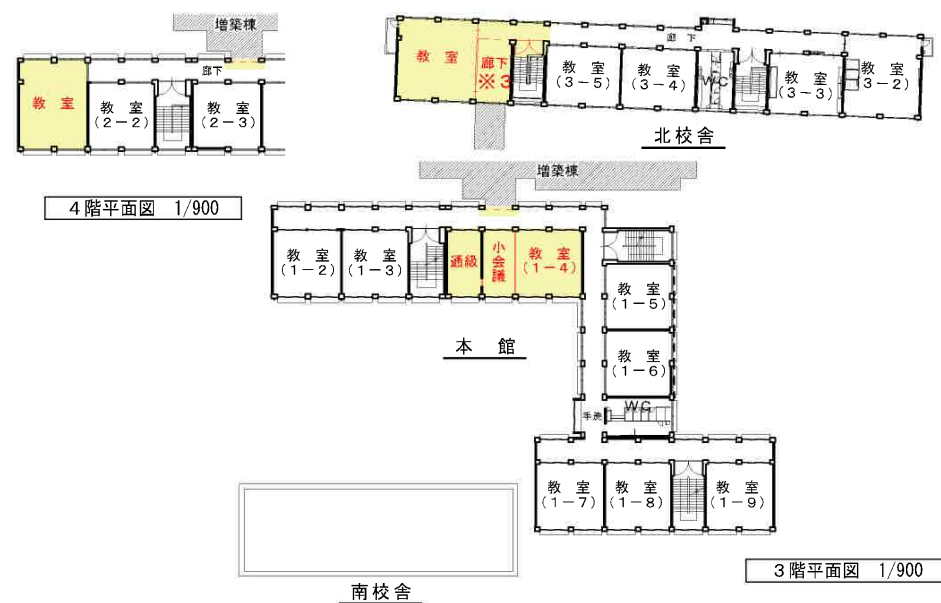


改修・増築棟工事完了

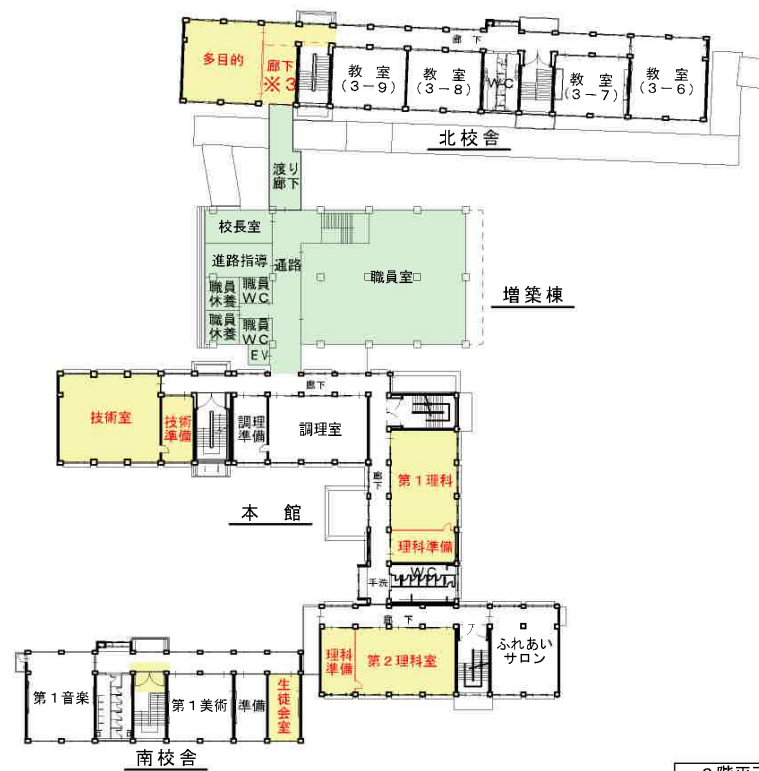


2階平面図 1/900

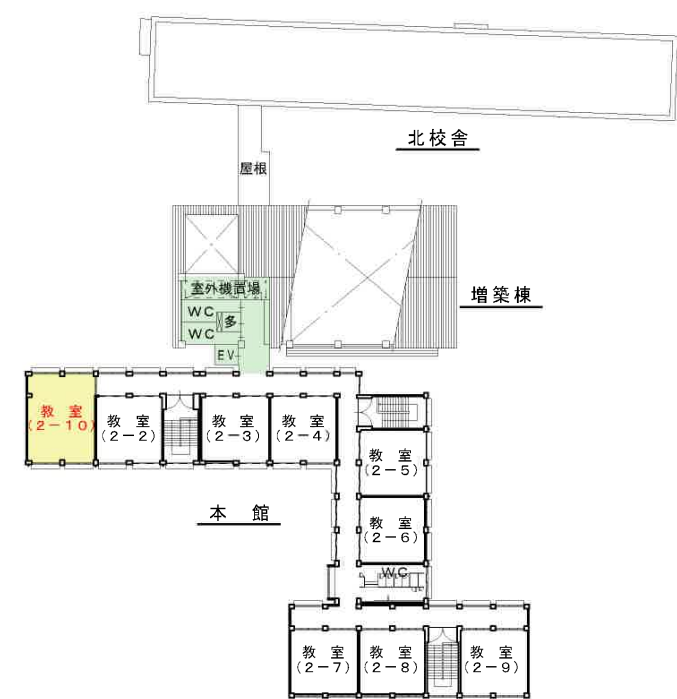

4階平面図 1/900

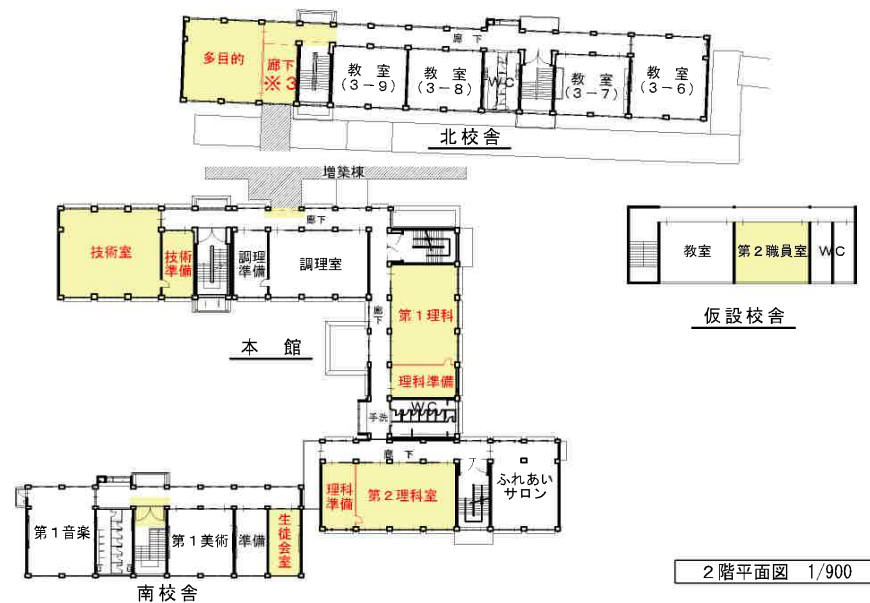


2階平面図 1/900

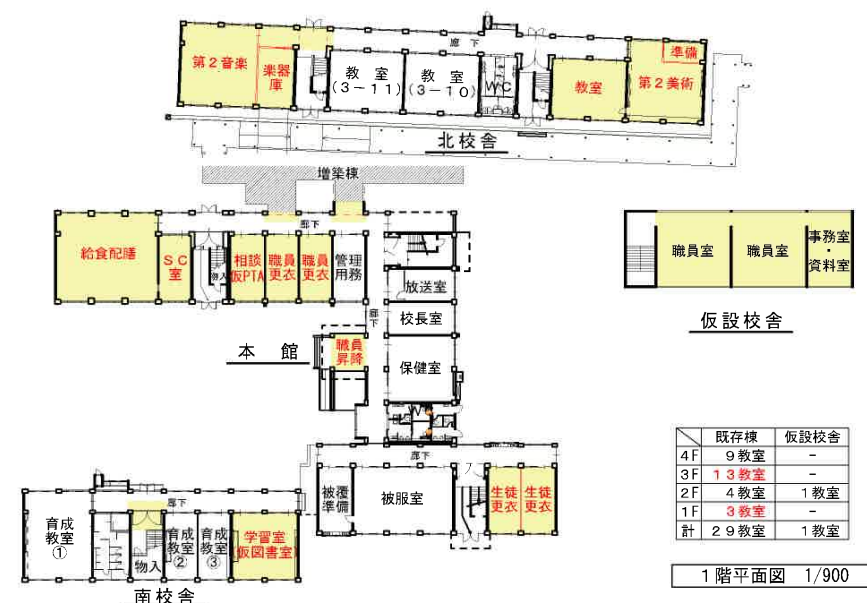

1階平面図 1/900



1階平面図 1/900

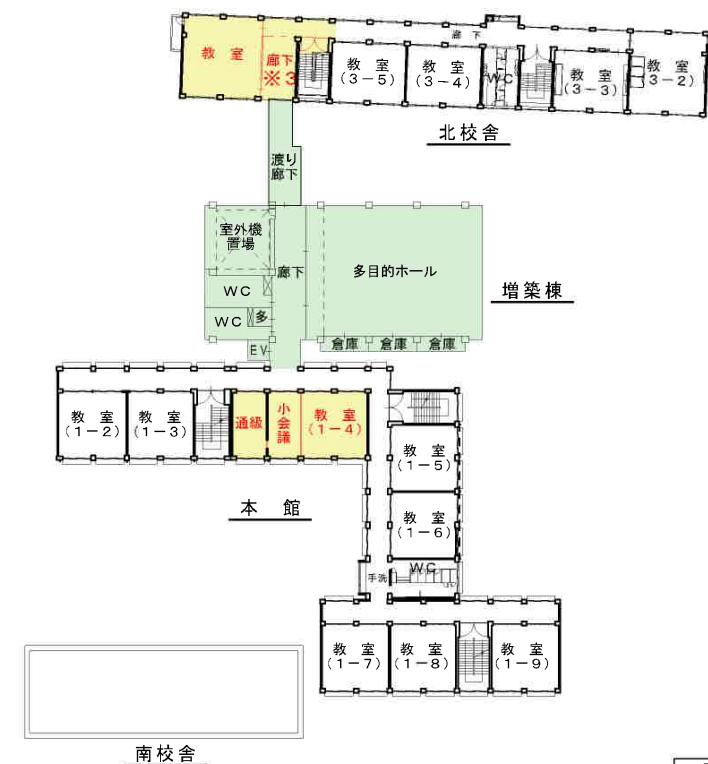


3階平面図 1/900

工事完了部分
 廊下・階段防火戸改修工事
 非常時には通行できるようにし、区画にも表示する
 内装工事
 増築棟を示す
 [室名]・移転先教室・改修後教室等
 仮設間仕切壁

※1：工事着手までに移設が必要
※2：夏休み工事
※3：増築棟完成まで使用不可
※4：春休み工事


■ 既存棟工事工程表案②

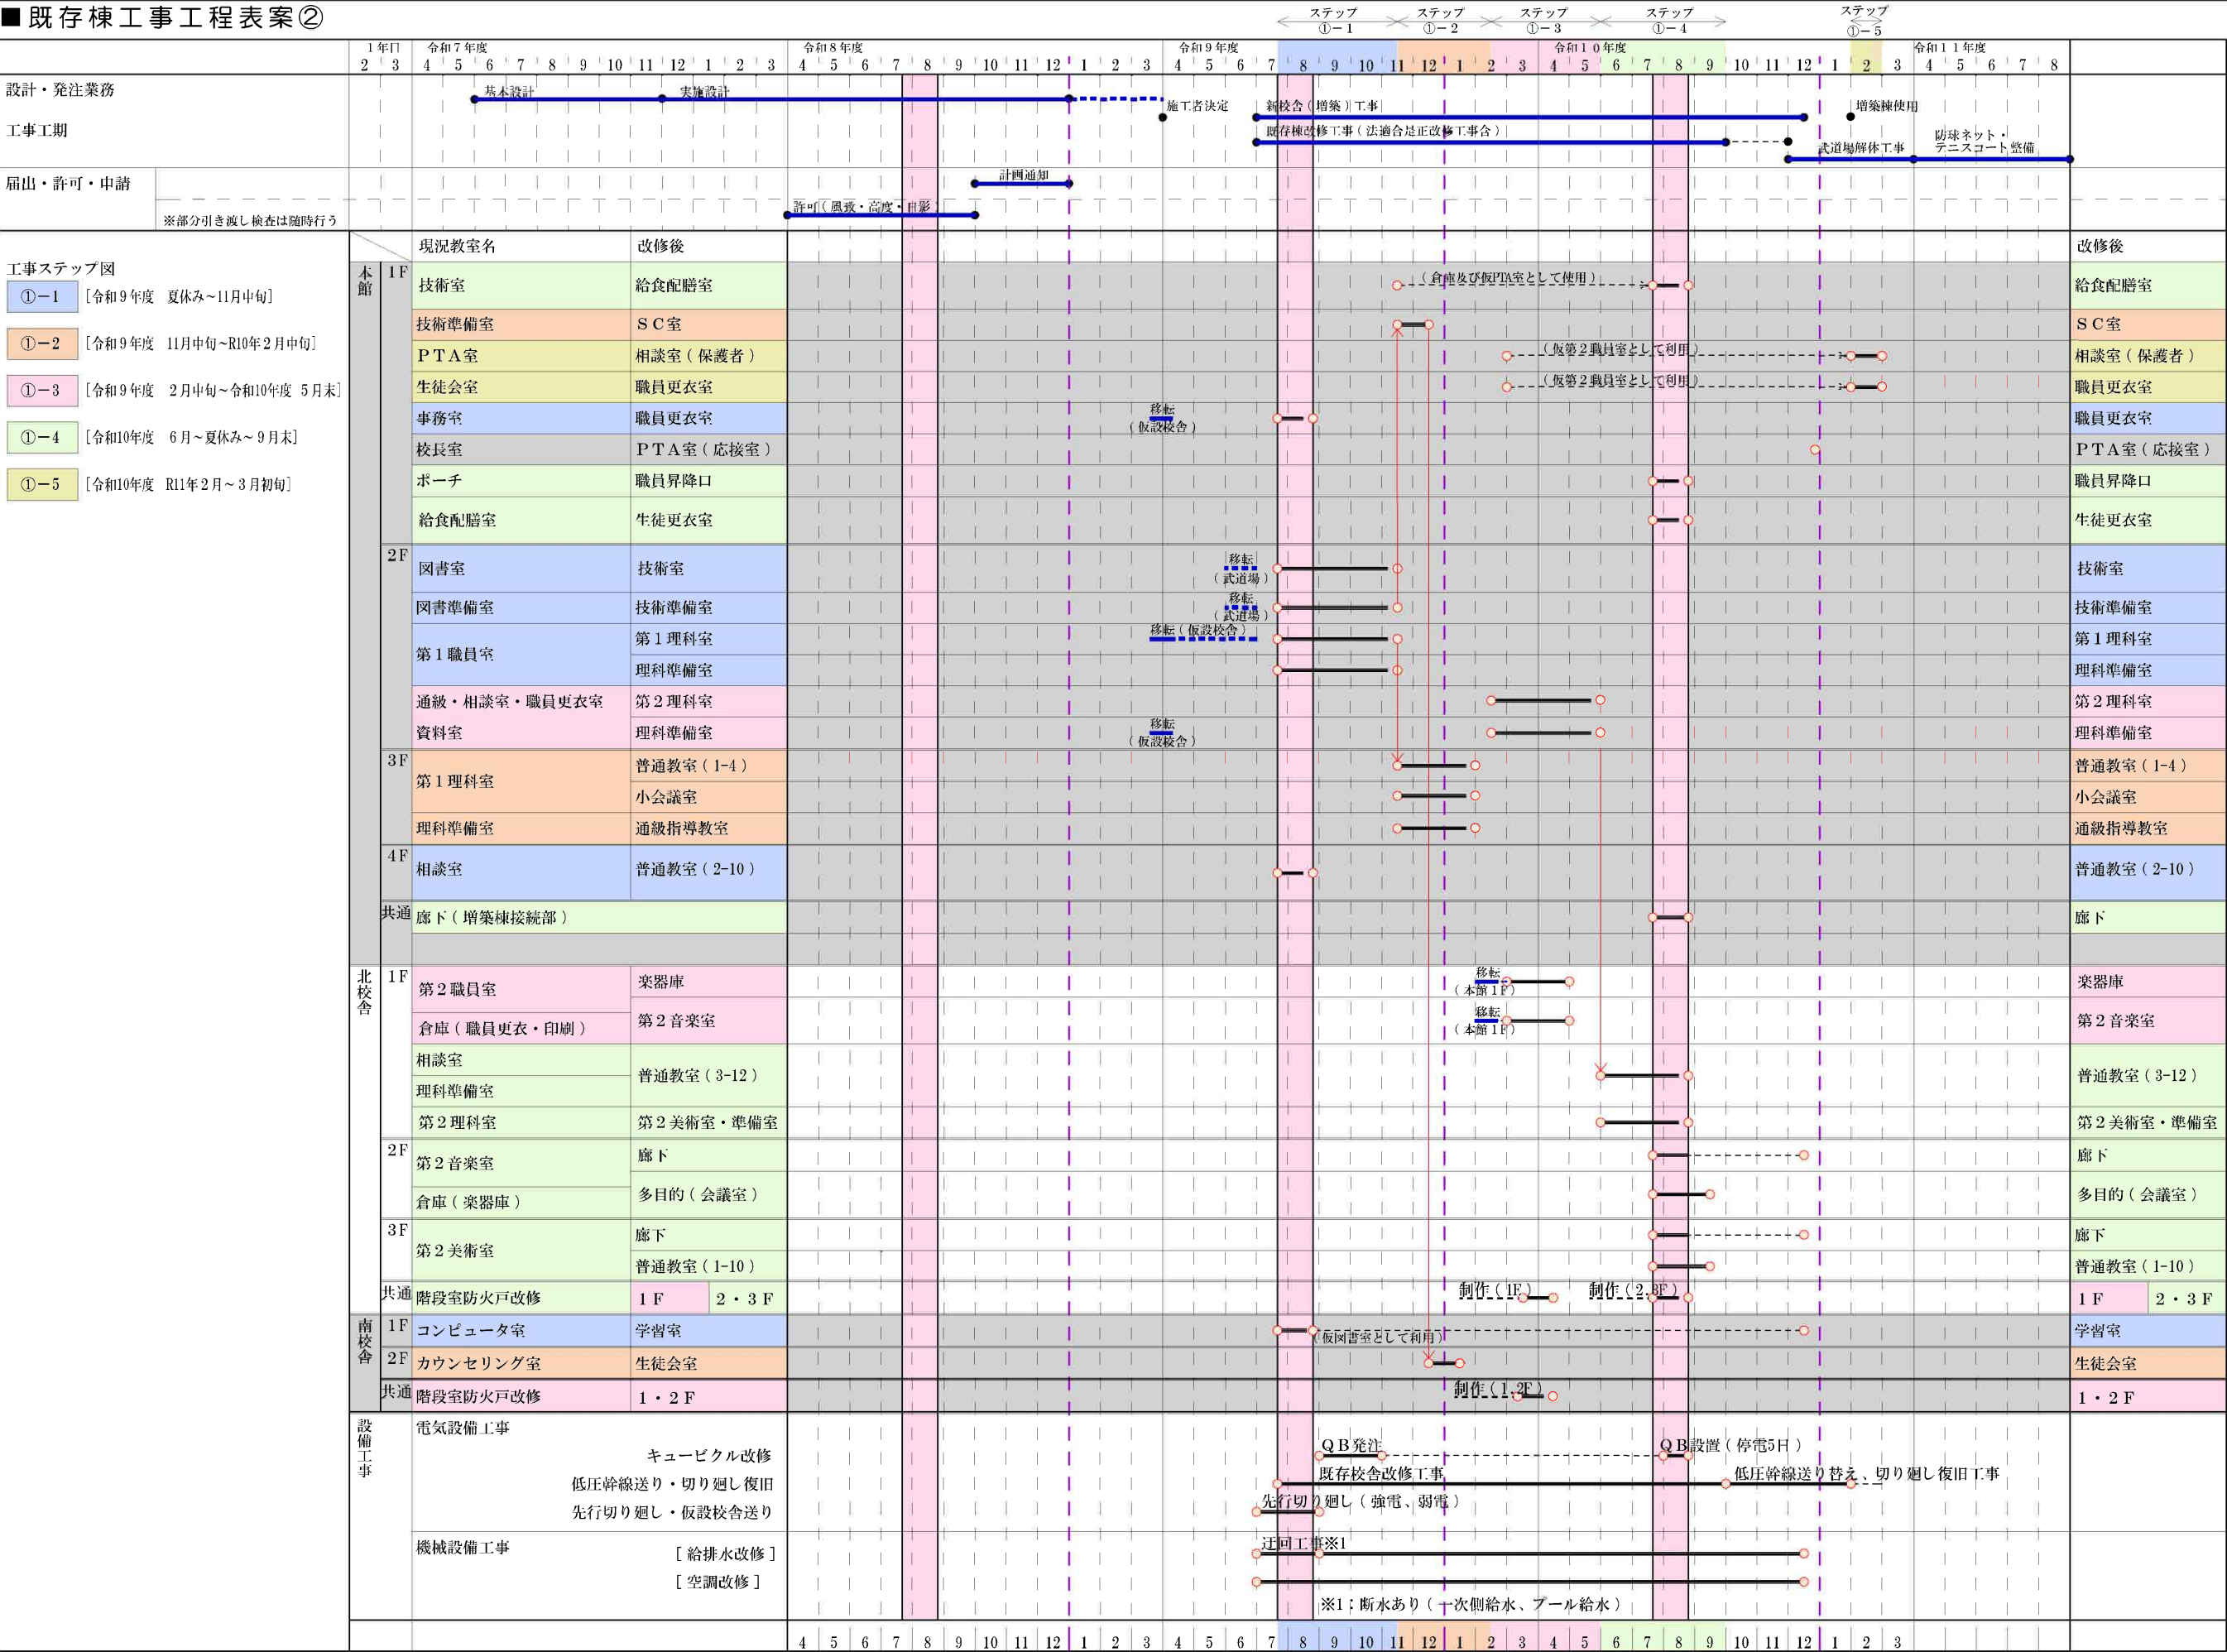


既存棟現況平面図




2階平面図 1/900

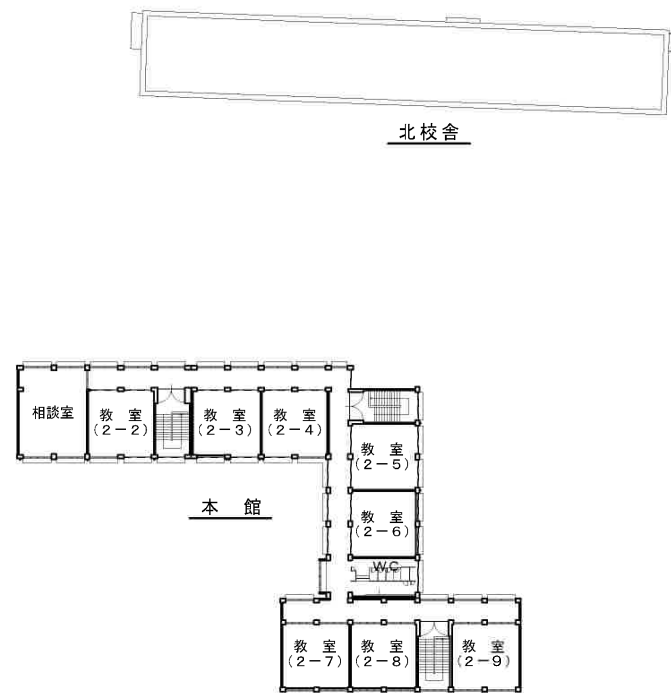

4階平面図 1/900

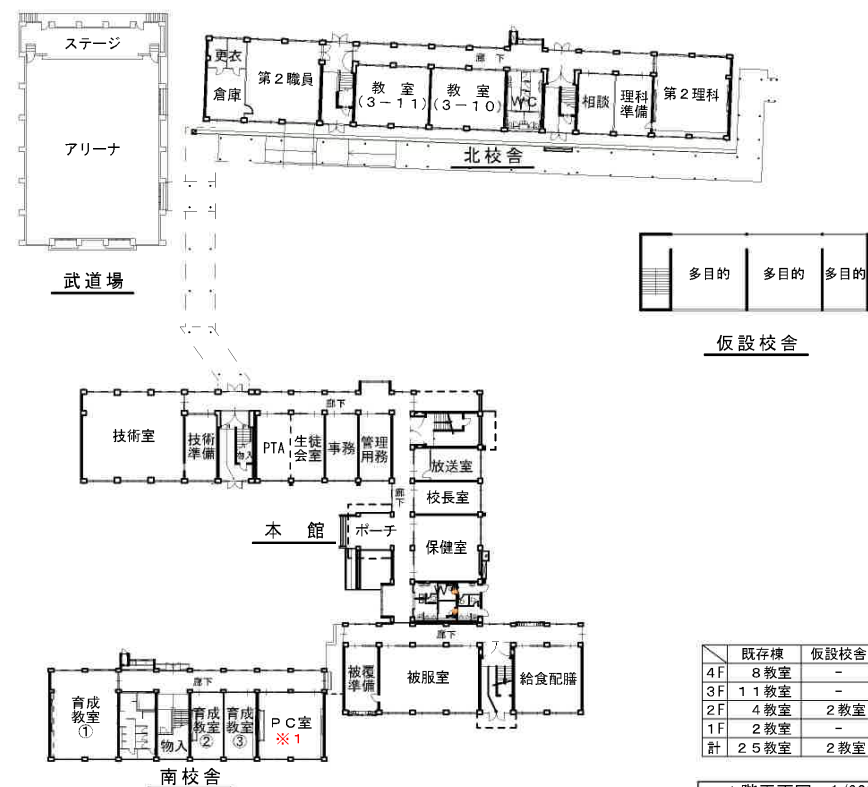


1階平面図 1/900

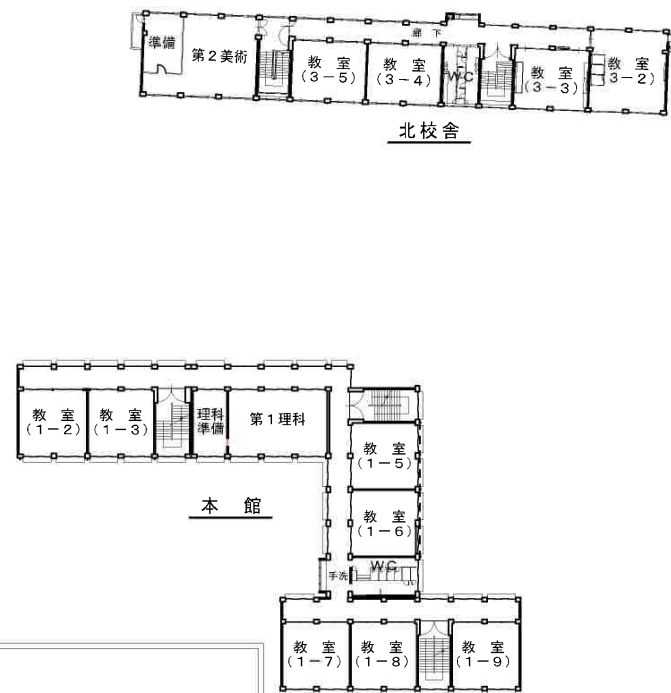


3階平面図 1/900


①-1 [令和9年度 夏休み～11月中旬]

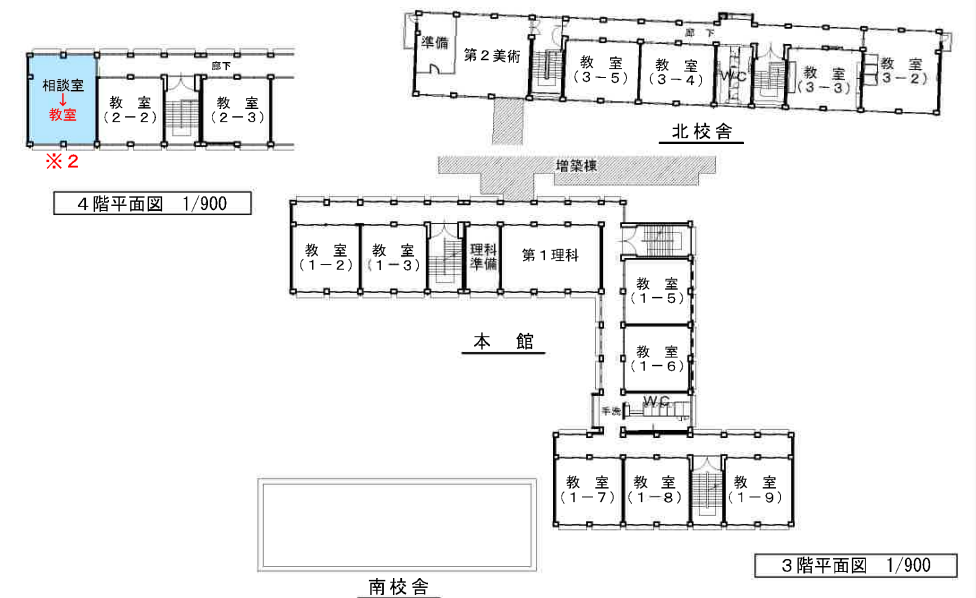

3階平面図 1/900

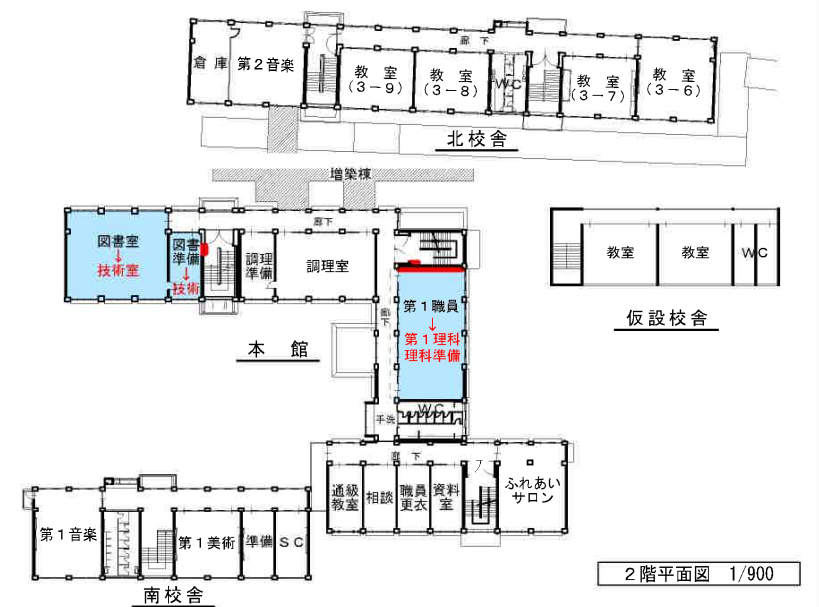

2階平面図 1/900

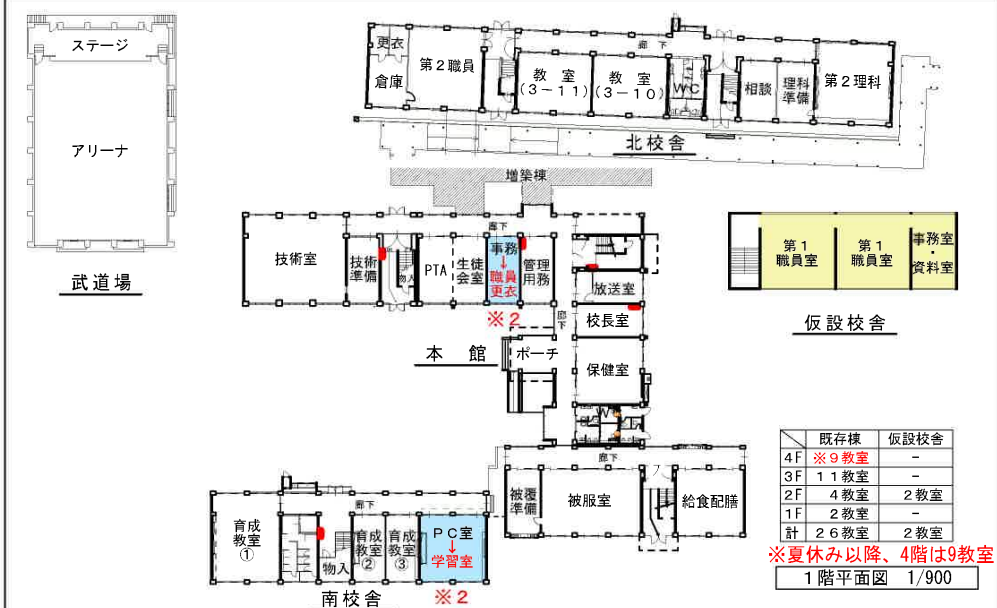

1 階平面図 1/900

 工事完了部分
 内装工事




廊下・階段防火戸改修工事
非常時には通行できよう
にし、区画にも表示する

[室名]-移転先教室・改修後教室等

----- 仮設間仕切壁

※1：工事着手までに移設が必要
※2：夏休み工事
※3：増築棟完成まで使用不可

①-2 [令和9年度 11月中旬～R10年2月中旬]

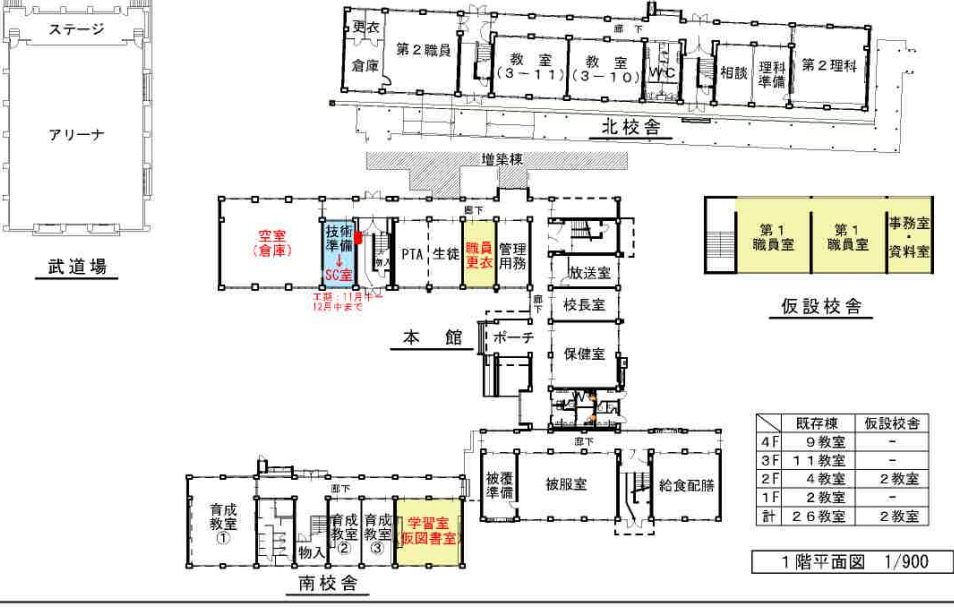
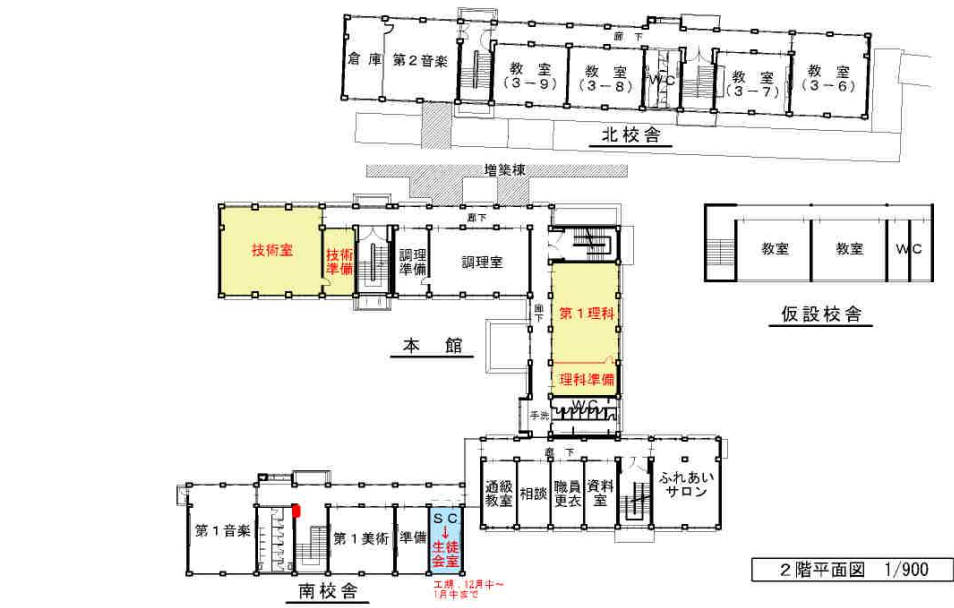
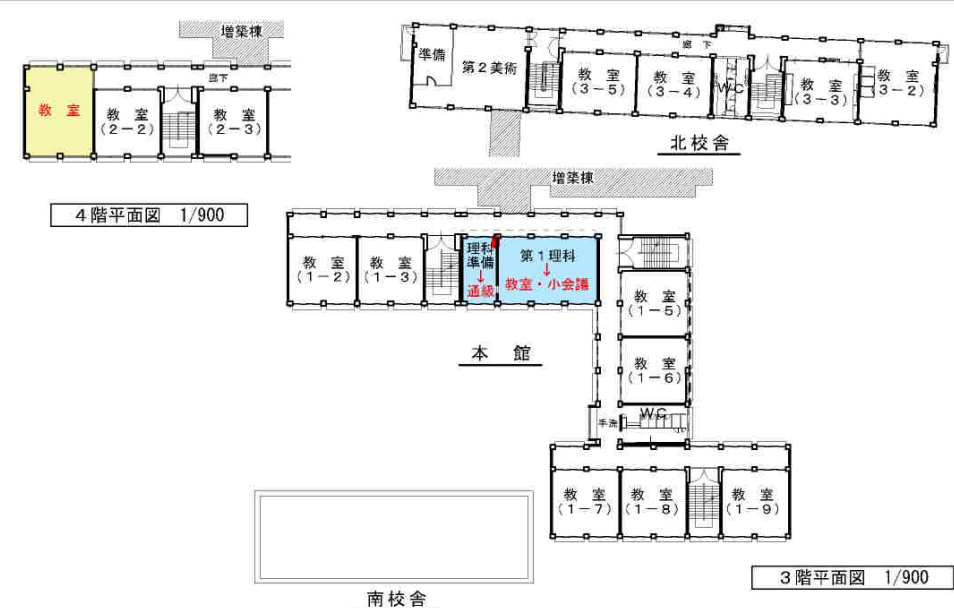


■ 工事完了部分 ■ 廊下・階段防火戸改修工事 ■ 内装工事 ■ 増築棟を示す

[室名]-移転先教室・改修後教室等




----- 仮設間仕切壁

①-3 [令和9年度 2月中旬～令和10年度 5月末]

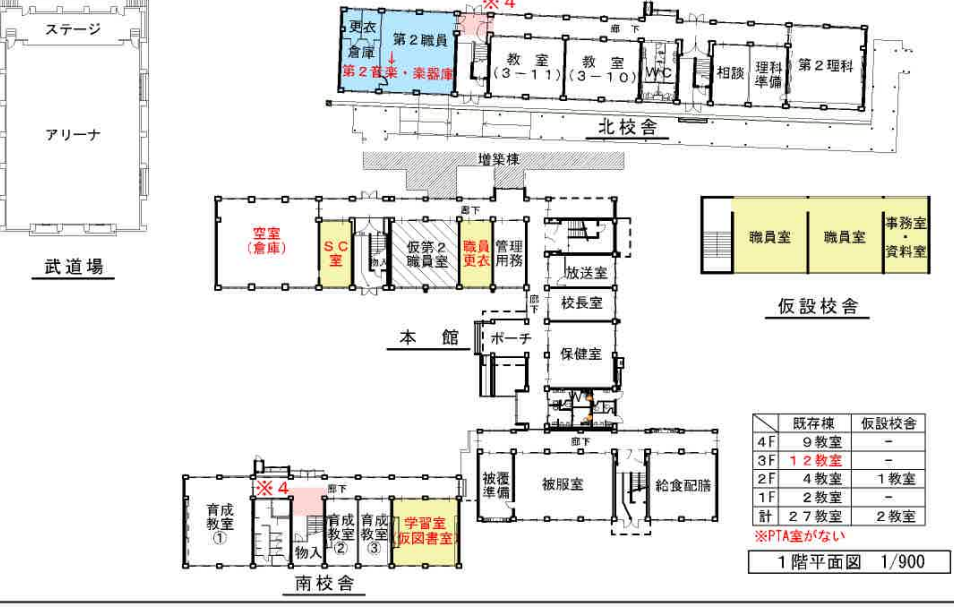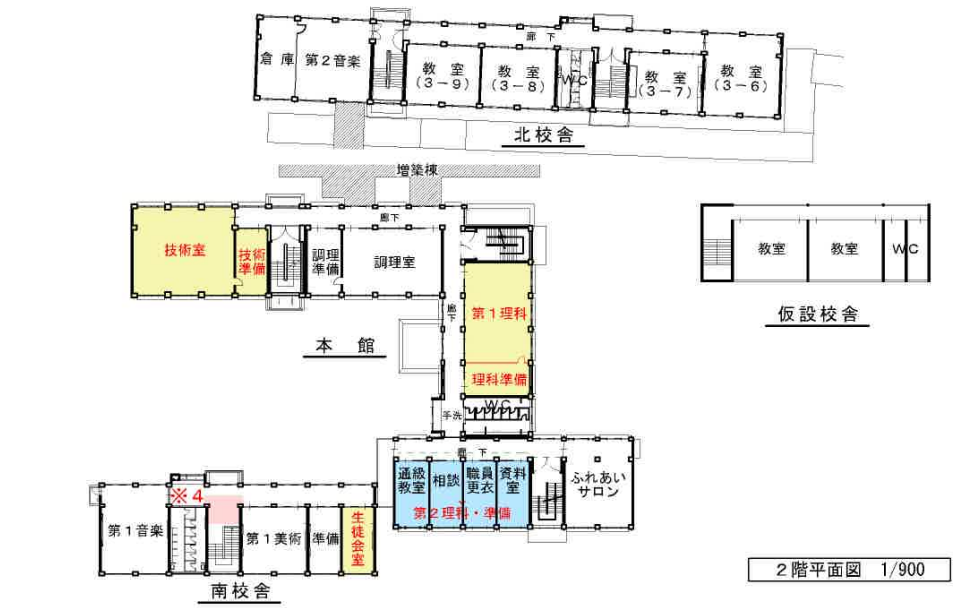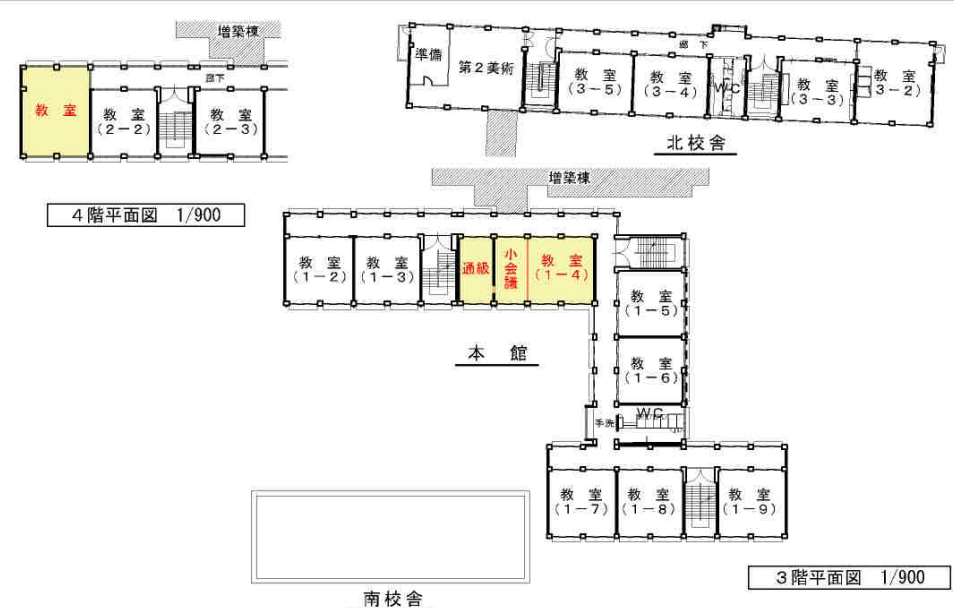


※1: 工事着手までに移設が必要
※2: 夏休み工事
※3: 増築棟完成まで使用不可
※4: 春休み工事

①-4 [令和10年度 6月～夏休み～9月末]

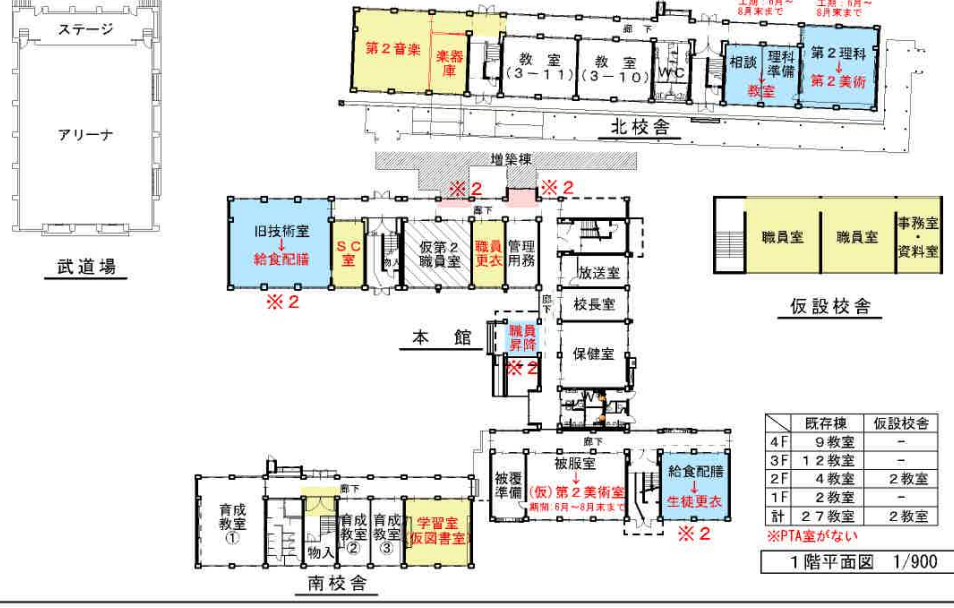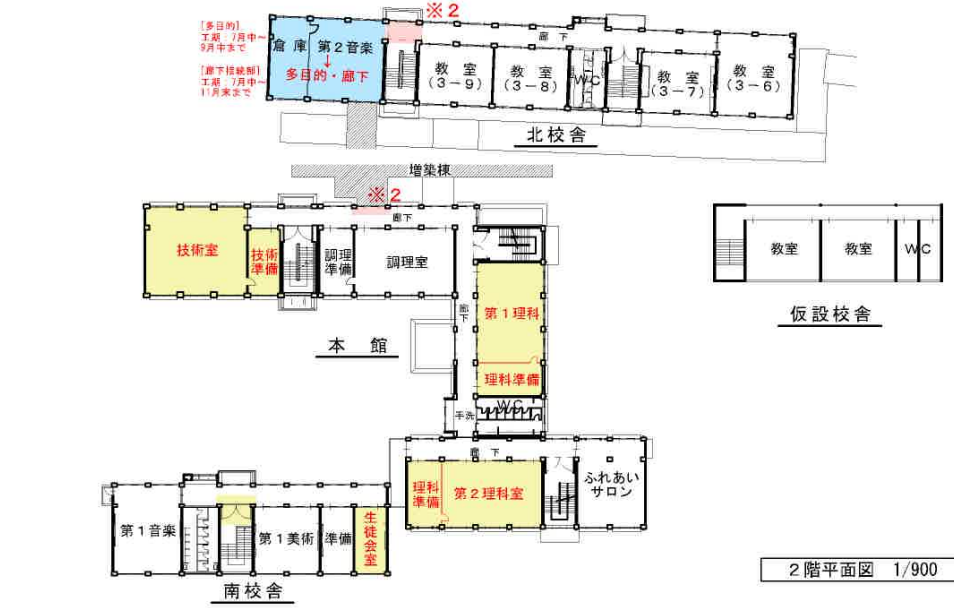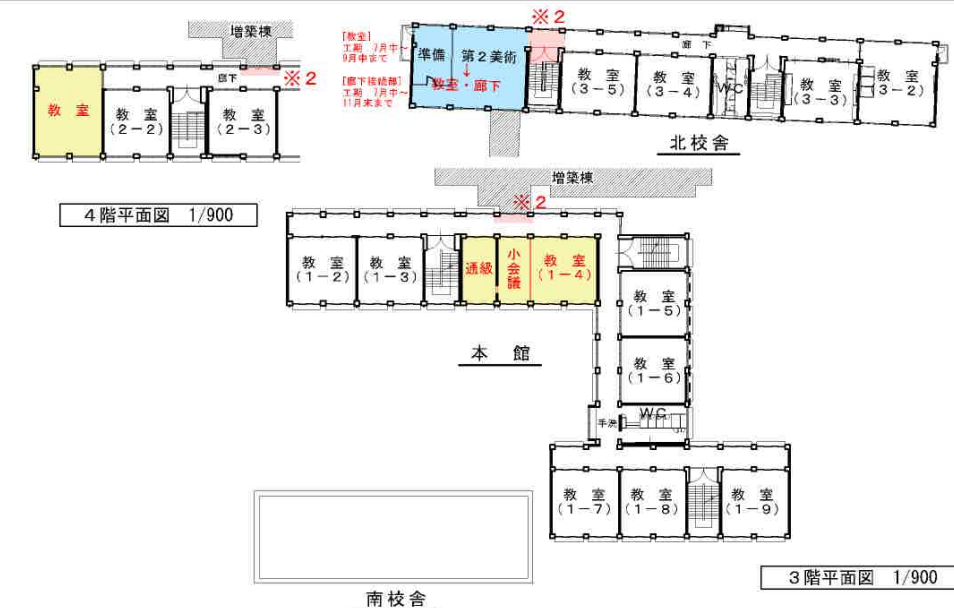

★ステップ図①との主な違い
・仮設校舎に普通教室を2教室計画 (①は1教室)
・本館1階に仮第2職員室を計画 (①は仮設校舎に計画)

①-5 [令和10年度] 令和11年2月～3月初旬（増築棟仮使用）


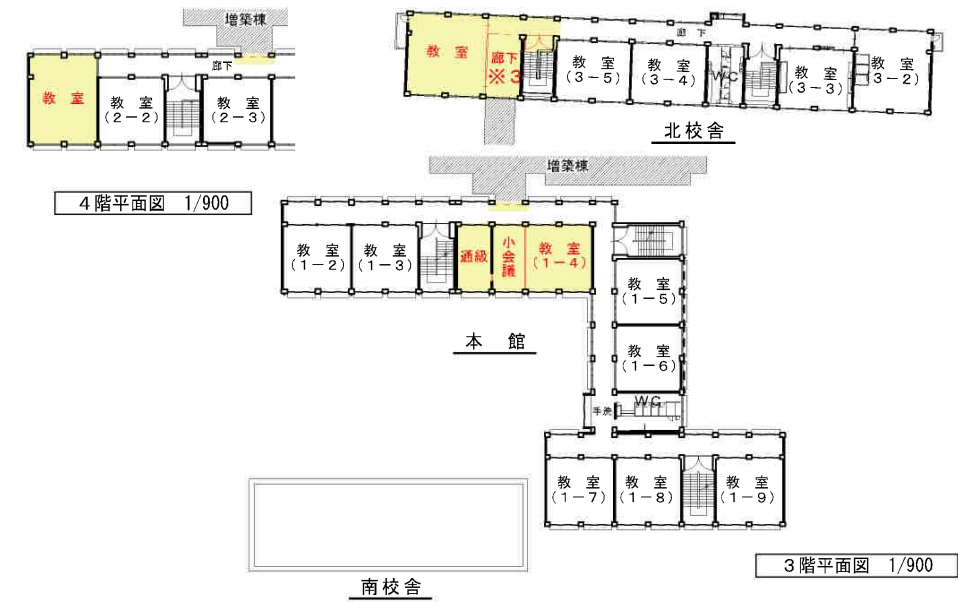


工事完了部分 廊下・階段防火戸改修工事 [室名]-移転先教室・改修後教室等 仮設間仕切壁 内装工事 増築棟を示す

改修・増築棟工事完了




※1: 工事着手までに移設が必要
※2: 夏休み工事
※3: 増築棟完成まで使用不可
※4: 春休み工事

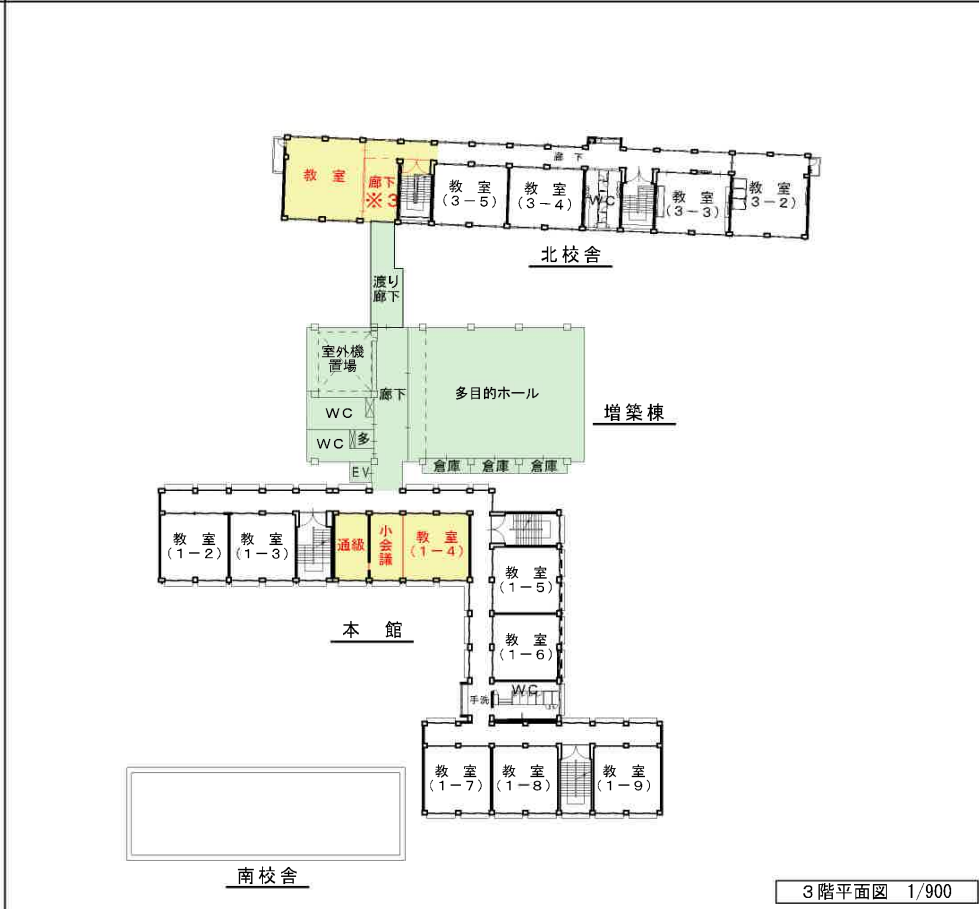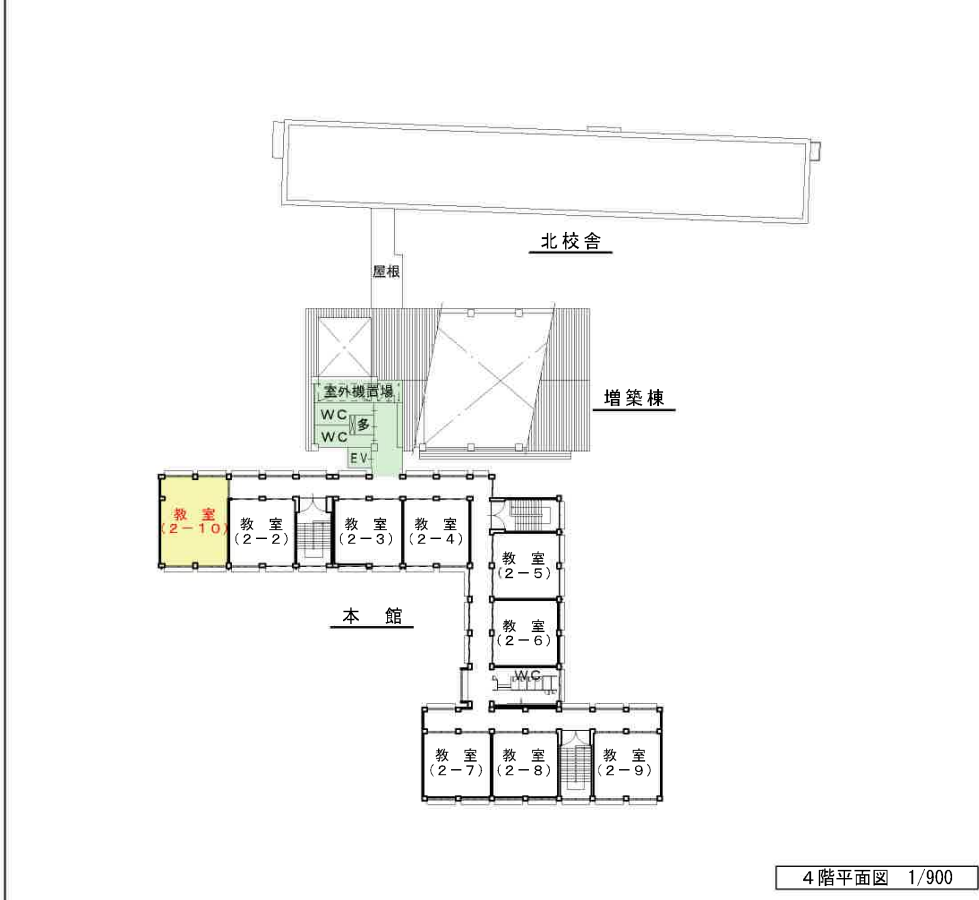

工事完了部分 廊下・階段防火戸改修工事 [室名]-移転先教室・改修後教室等 仮設間仕切壁 内装工事 増築棟を示す

凡 例	
	道路からの出入口
	生徒用通路
	学校関係者用通路（給食・職員等）
	工事用車両進入路
	仮囲い(フラットパネル H=3,000)
	仮囲いゲート(キャスターパネルゲート H=3,000 W=7,500 W=5,400)
	交通誘導員の配置位置を示す 工事期間中 2 名

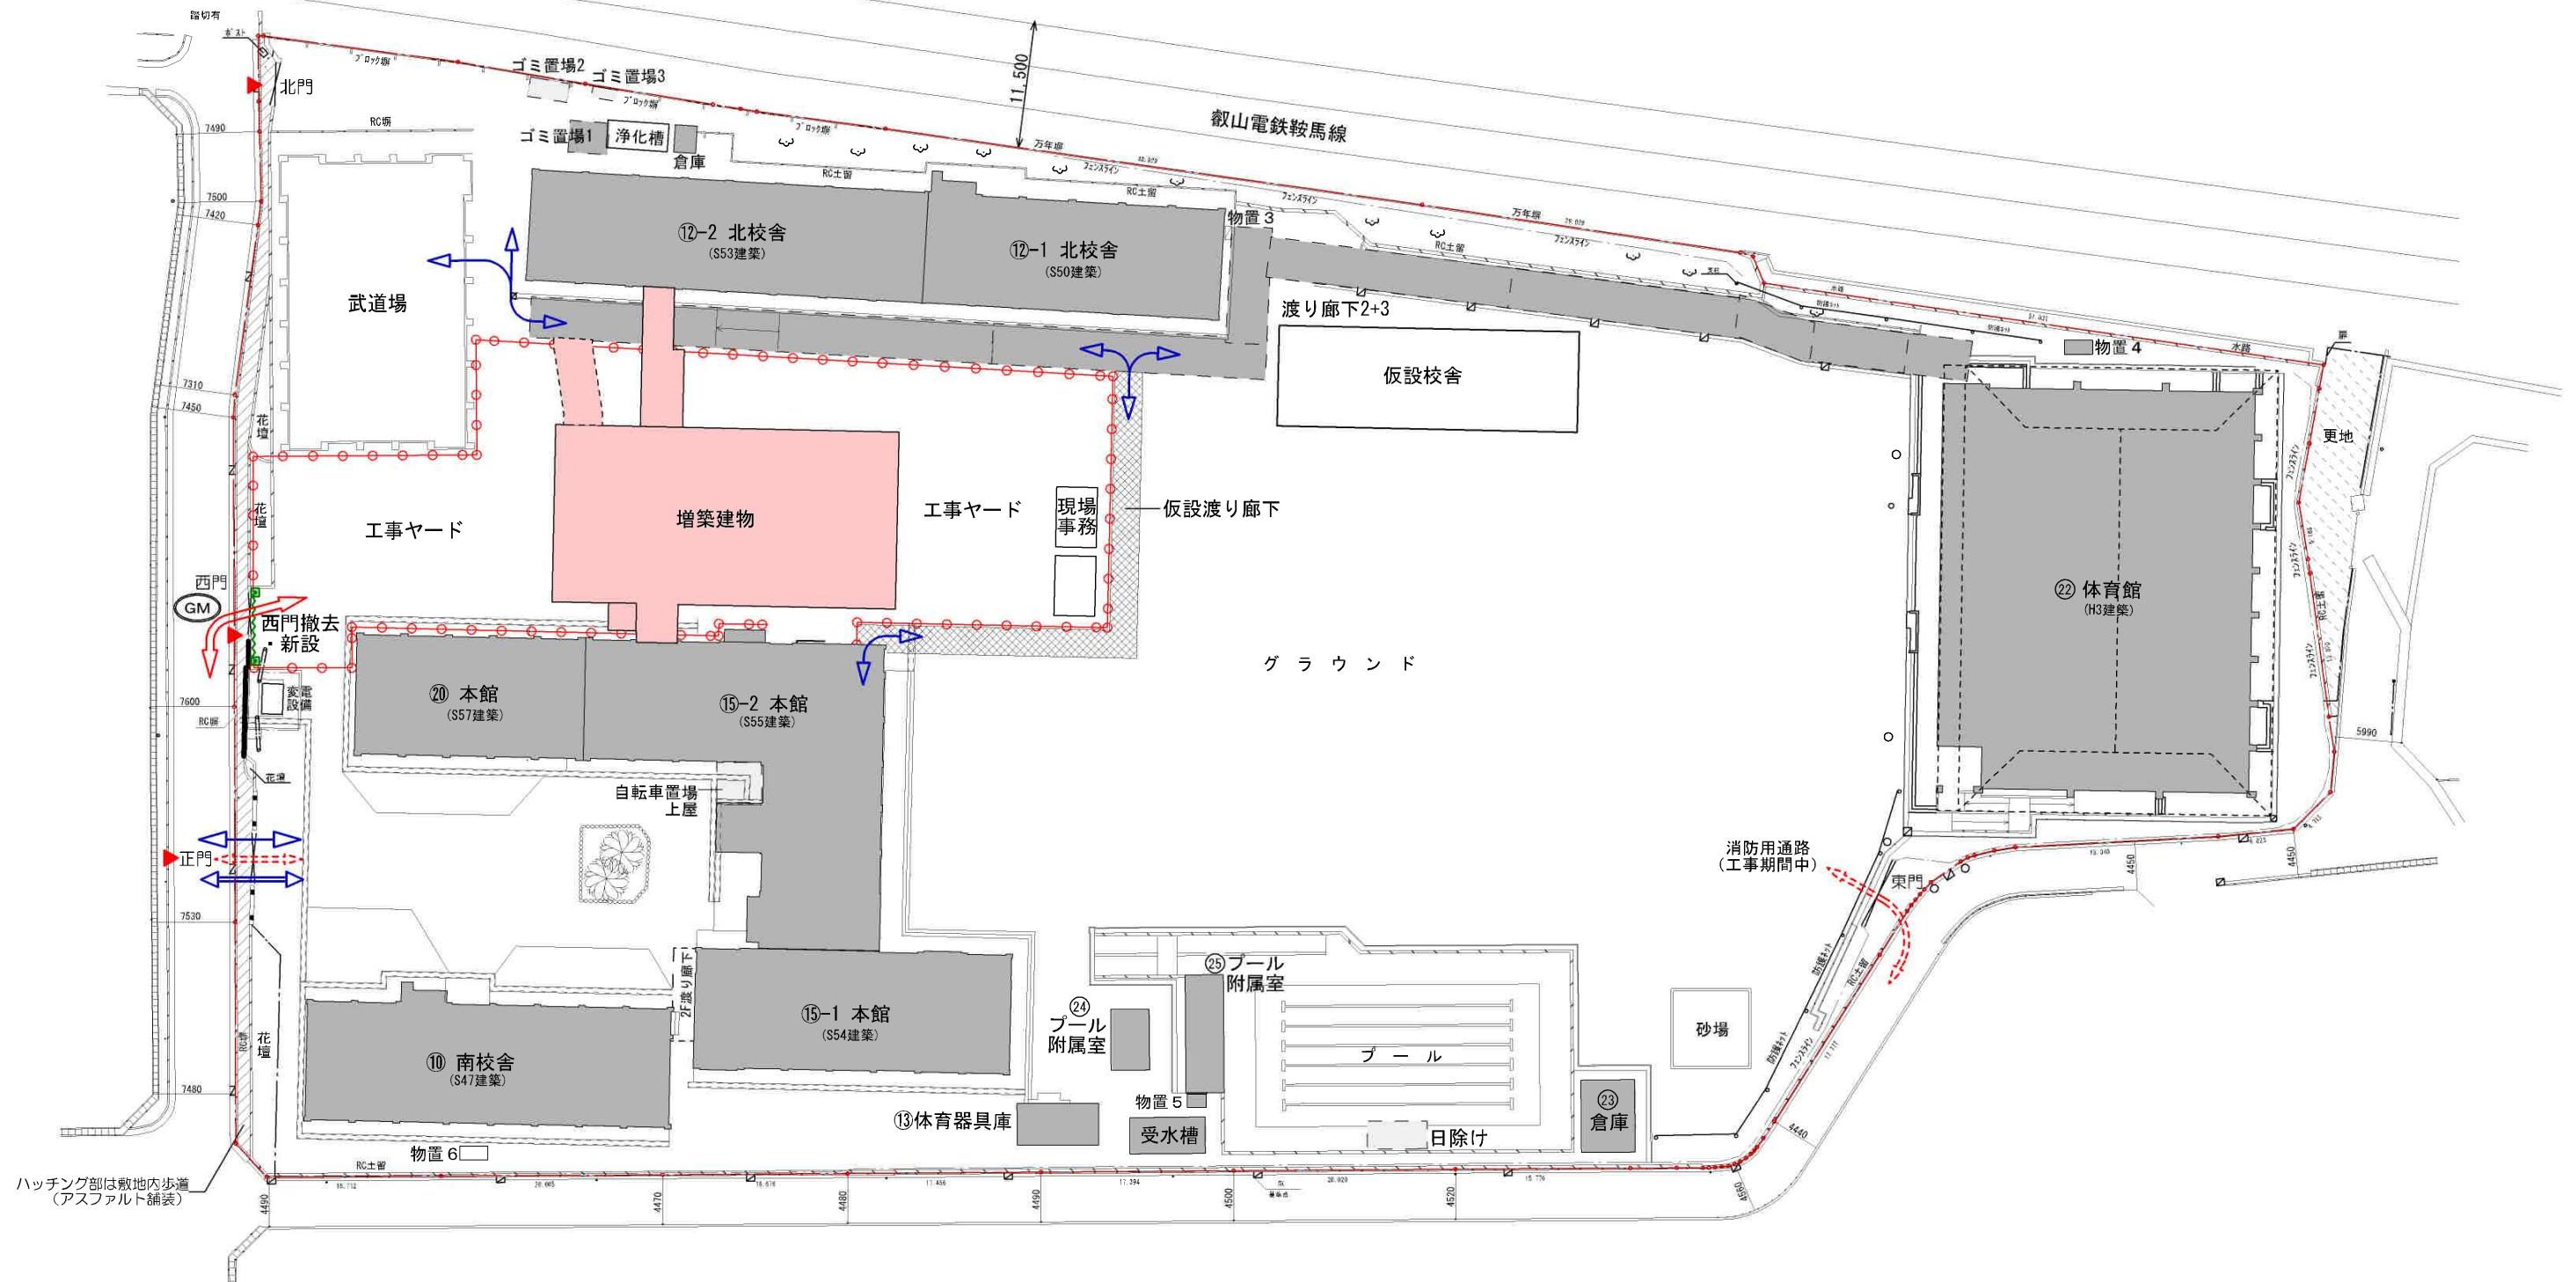

■仮設計画図（武道場解体時）

