

トンネル取付部の工事に着手しました！

みなさん、秋の深まりを感じる季節になってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか？

今年度は、来年度からのトンネル工事の準備として、トンネル南側取付部の工事に着手しています。昨年度よりも工事箇所が多くなり、御迷惑をおかけいたしますが、平成26年度中の完成を目指して、引き続き用地買収及び工事を進めてまいりますので、これまでと同様に御理解、御協力を頂きますようよろしくお願いいたします。

今回のかわら版では、二ノ瀬バイパス事業の現状と今年度の工事内容についてお知らせします。

①工事

今年度の工事箇所は、以下の3箇所です。

工事箇所1 トンネル南側取付部（打合橋から約150m北側の所です。）

工事箇所2 鞍馬小学校北側（昨年度に護岸工事を行った反対側で道路拡幅を予定しています。）

工事箇所3 鞍馬小学校前及び梶取橋南側（昨年度から引き続き施工中です。）

二ノ瀬バイパス
かわら版

其の八

次のページに工事の内容を書いておりますので御覧ください。

※道路の拡幅に伴い、鞍馬小学校横断歩道橋の架け替え工事を行いました。



②用地買収

前回のかわら版（平成22年12月発行）では、用地買収の進捗率は**8割**（買収済み24筆／全30筆）でしたが、現在の進捗率は**約9割**（買収済み26筆／全30筆）となりました。用地買収が完了した箇所から順次工事に着手しています。


③水文調査

トンネル工事による二ノ瀬集落の井戸等への影響を把握するため、水文調査を実施しています。今後もトンネル完成後まで引き続き調査いたします。


今年度の工事について

- 工事箇所1** 工事名：(主) 京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス) 道路改良(その5) 工事
 場所：京都市左京区静市野中町(下記の位置図を御覧下さい。)
 期間：平成23年 7月27日～平成24年 3月15日
 時間：昼間工事 午前9時～午後5時頃
 交通規制：車線規制は予定しておりませんが、府道下鴨静原大原線への工事出入口付近では、土砂搬出車両等が出入りするため、一時的に通行をお待ちいただく場合があります。
- 施工業者：公成建設株式会社
 現場担当者 中川 晃 連絡先 075-365-8320
 工事内容：南側取付部のうち、現況山林の切土造成および斜面緑化を行い、来年度から着手を予定しているトンネル工事の施工ヤードを確保します。
- 工事箇所2** 鞍馬小学校北側において鞍馬川側へ道路を拡幅する工事を予定しています。
- 工事箇所3** 昨年度から実施しています山側工事について、片側交互通行で御迷惑をおかけしています。当初、今年の8月末に完成する予定でしたが、工法変更のため引き続き施工しており、今年度中に完成の予定です。

二ノ瀬バイパス位置図

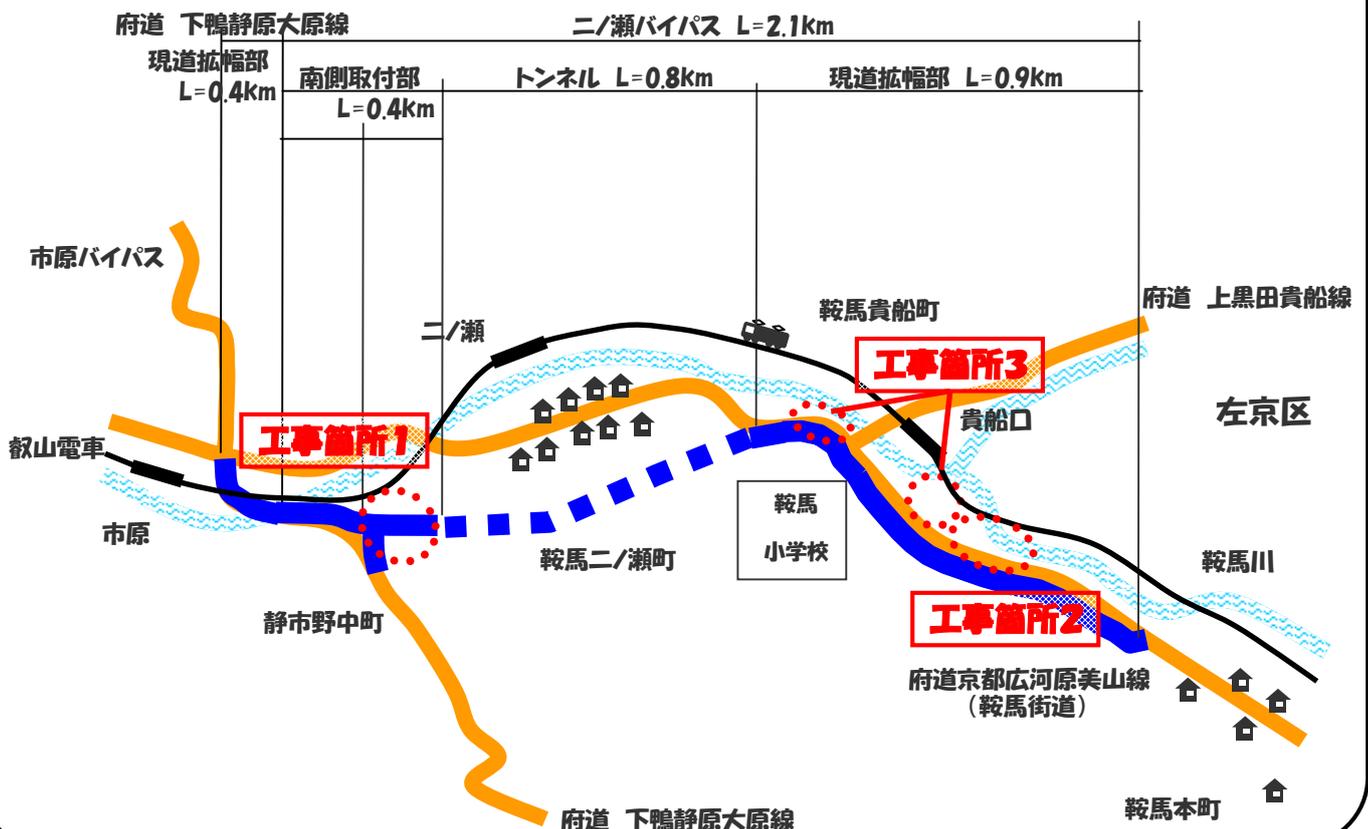

工事箇所図

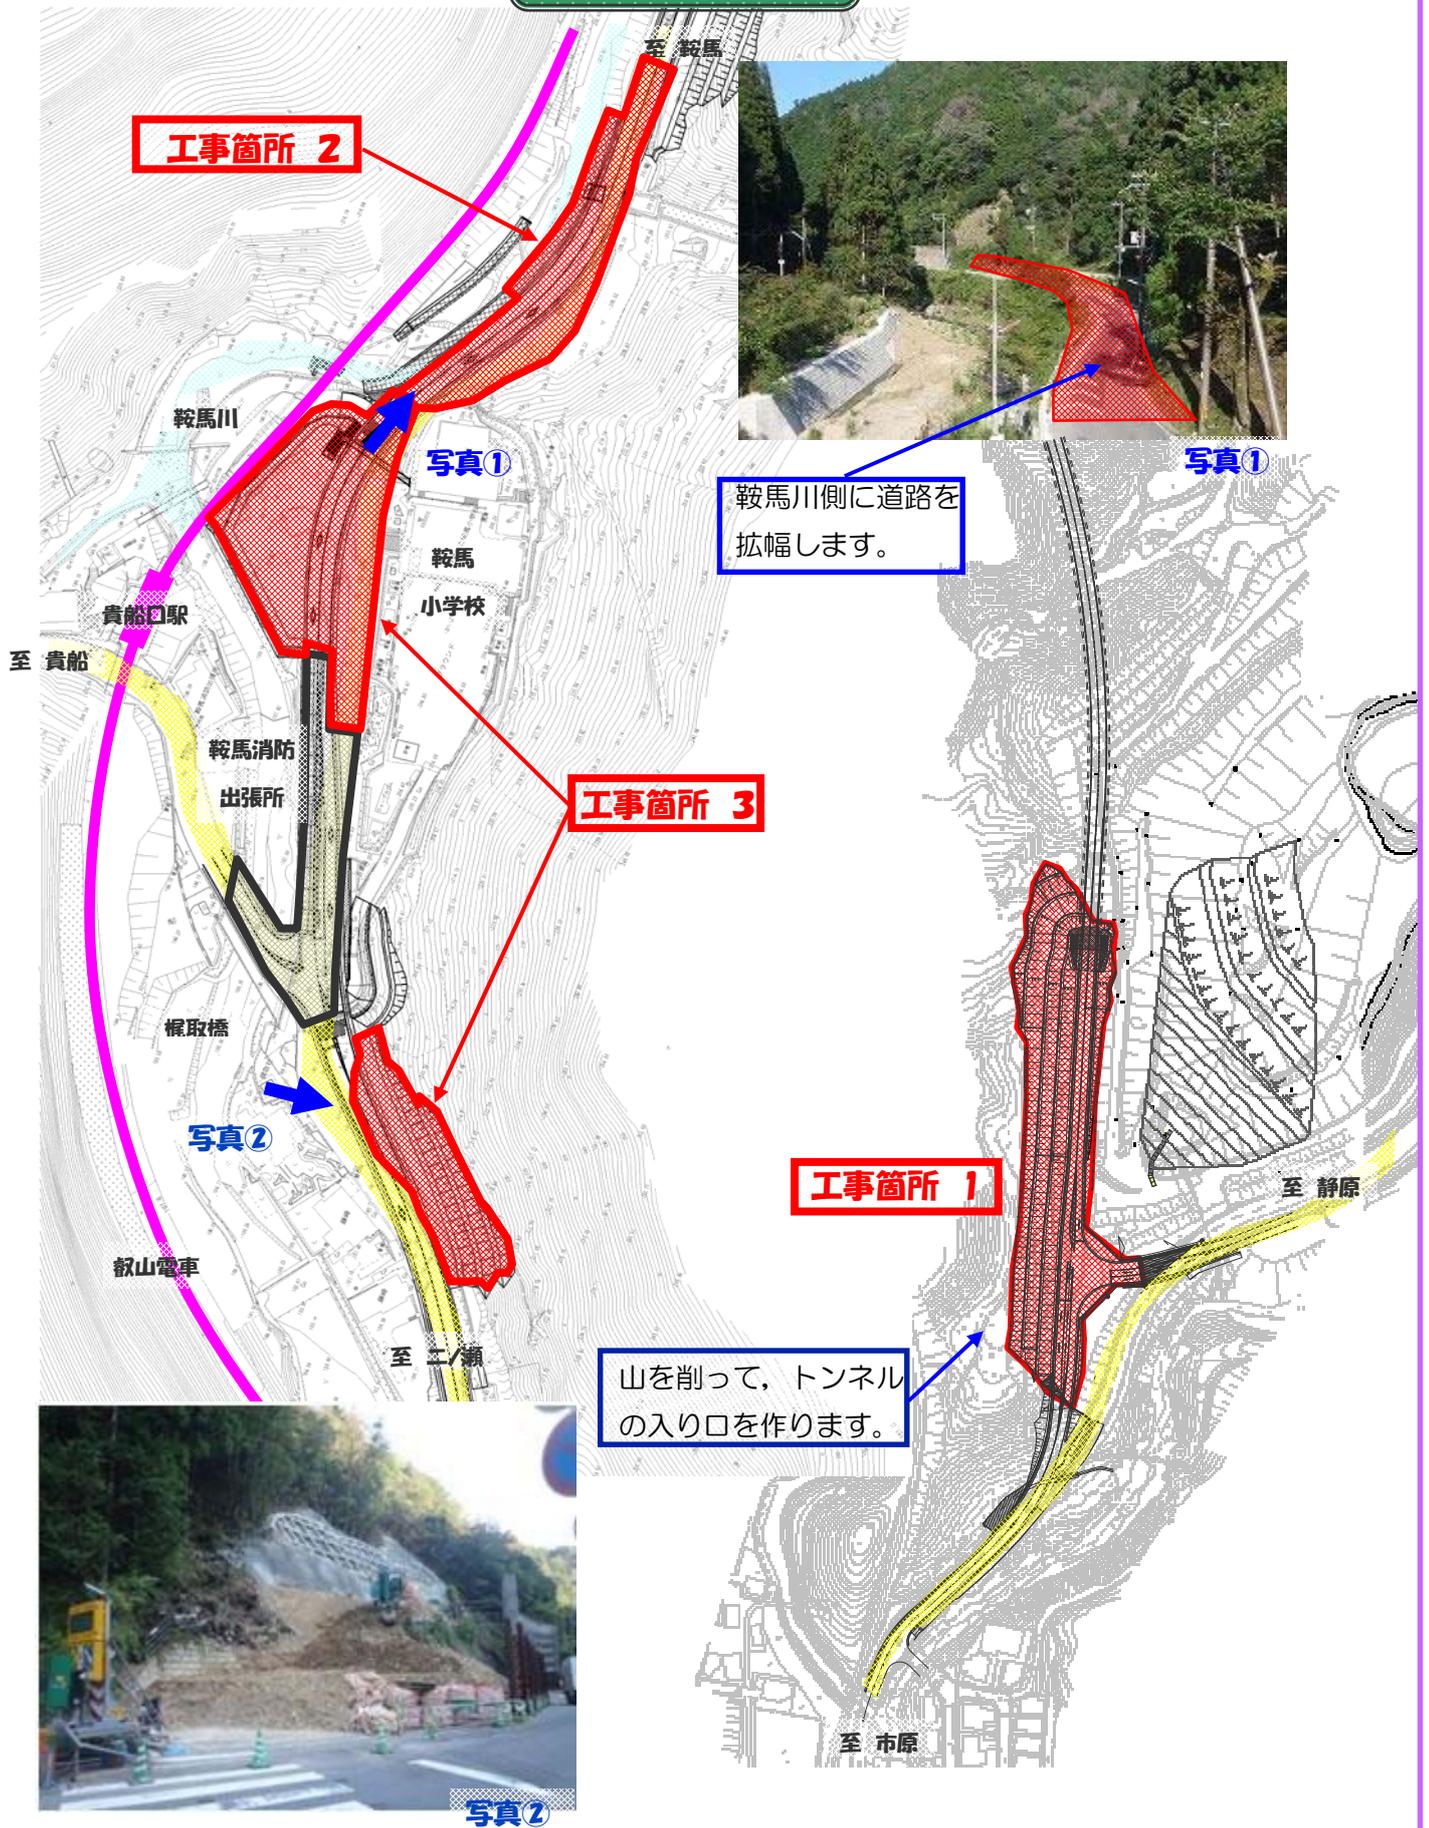

平成23年度・二ノ瀬バイパス 今後の予定など



決定しました。

- ☆ (主) 京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)道路改良(その5)工事
 - ・ 施工業者：公成建設株式会社



ただいま現地調査中...

- ◎ 水文調査(井戸, 沢, 水質調査等)：平成18年度から引続き実施中。
 - ・ 今年度委託業者 都コンサルタント株式会社

開催しました。

- ◇ 第16回 野中・二ノ瀬・鞍馬バイパス検討委員会：平成23年 9月16日

御意見,御質問はこちらまで

『二ノ瀬バイパスかわら版』(其の八)では、現在の用地買収や工事の状況及び今後の工事の予定についてお伝えしました。御意見,御質問がございましたら、下記までどしどしお寄せください!!

御意見,御質問のお寄せ先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

京都市建設局道路建設部道路建設課

建設第一係 渡辺, 小西, 大石, 大屋

電話番号：075-222-3577 FAX：075-213-0559



京都市建設局道路建設部道路建設課

ホームページ：www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/soshiki/10-3-2-0-0_1.html

同じです あなたとわたしの 大切さ
平成23年 11月 京都市印刷物第234494号
