

平成 11 年度京都市公共事業再評価対象事業一覧

区分	事業採択後 5 年を経過した後も未着工の事業
区分	事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業
区分	事業の進捗状況や社会情勢の急激な変化による事業

国庫補助事業

種 別	番号	事業名	区分	対応方針
道 路 事 業	1	一般国道 477 号		「事業継続」
河 川 事 業	2	旧安祥寺川		「事業継続」


京都市単独事業

種 別	番号	事業名	区分	対応方針
道 路 事 業	3	大原花背線		「条件付事業継続」
街 路 事 業	4	葛野大路		「事業継続」
	5	北泉通		「事業継続」
	6	御池通		「事業継続」
	7	向日町上鳥羽線		「事業継続」
	8	葛野西通		「事業継続」
	9	大原通		「事業継続」
	1 0	宝ヶ池通		「事業継続」
	1 1	山陰線側道北線		「事業継続」
	1 2	近鉄東側道		「事業継続」
土地区画整理事業	1 3	洛北第二地区		「事業継続」
合 計		1 3 事業		

1:50,000

京都市全図

平成 11 年度再評価対象事業全体図

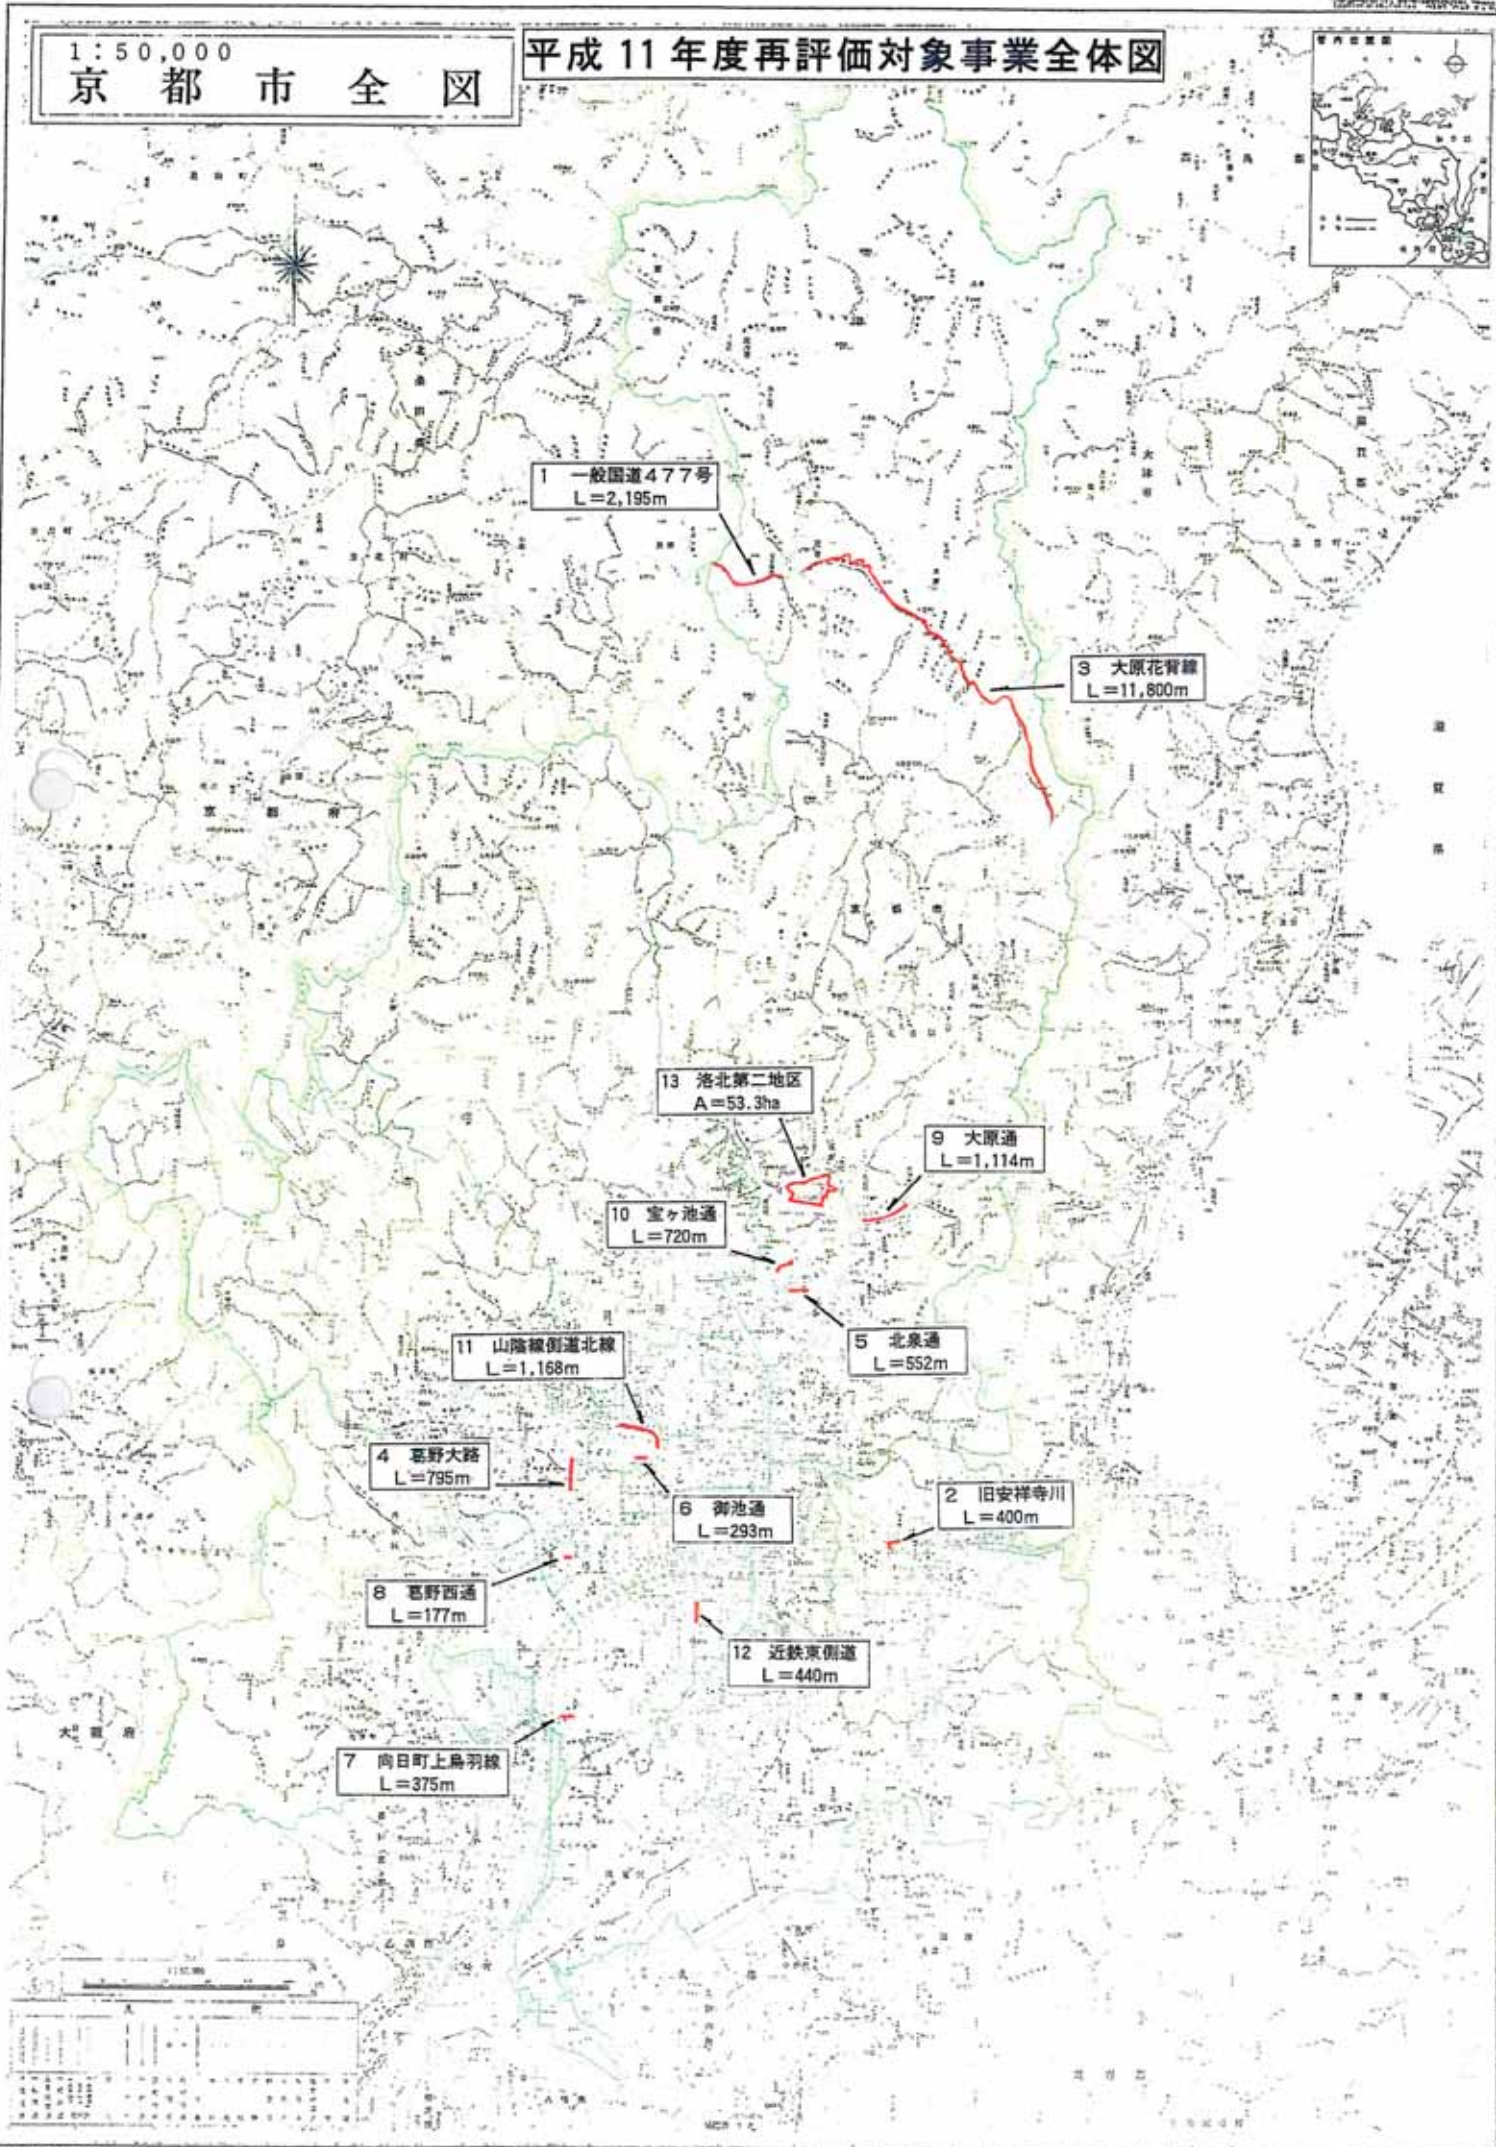

平成 11 年度再評価事業フォローアップ調査


(平成 18 年 3 月末)

事業名		街路事業 葛野大路		事業所管課	建設局街路部街路建設課
事業区間		自：京都市右京区西院笠目町（四条通） 至：京都市右京区山ノ内五反田町（御池通）		延長及び幅員	延長：795m 幅員：27m
事業採択年度		平成2年度	完成予定年度	当初：平成9年度 変更：平成17年度（事業認可最終施行年度）	
事業進捗					
年度	全体事業	平成16年度以前	平成17年度	平成18年度	平成19年度以降
工事	L= 795m C= 1,086百万円	L= 795m C= 1,086百万円	L= 0m C= 0百万円	L= 0m C= 0百万円	L= 0m C= 0百万円
用地	A= 17,400㎡ C= 9,273百万円	A= 17,400㎡ C= 9,273百万円	A= 0㎡ C= 0百万円	A= 0㎡ C= 0百万円	A= 0㎡ C= 0百万円
その他	C= 665百万円	C= 663百万円	C= 2百万円	C= 0百万円	C= 0百万円
計	C= 11,024百万円	C= 11,022百万円	C= 2百万円	C= 0百万円	C= 0百万円
進捗率		100.0%	100%	100%	100%
平成11年度再評価時点での課題，問題点 用地境界の確定の難航により，用地面積の確定が遅れている。（共用者多数）また，権利者との協議が整わない箇所については，土地収用の手続も検討する必要がある。					
平成17年度の取組 平成16年度の供用開始後（供用開始日は平成17年3月19日），道路区域決定図を作成した。					
平成18年度以降の取組 当面の目標 特記事項はない。 事業効果 市街地西部地域における南北幹線道路の整備により，渋滞を解消し，安全で円滑な道路交通を確保する。また，電線類地中化により，良好な景観及び歩行者等の安全を確保する。					


[箇所図]



[模式図]

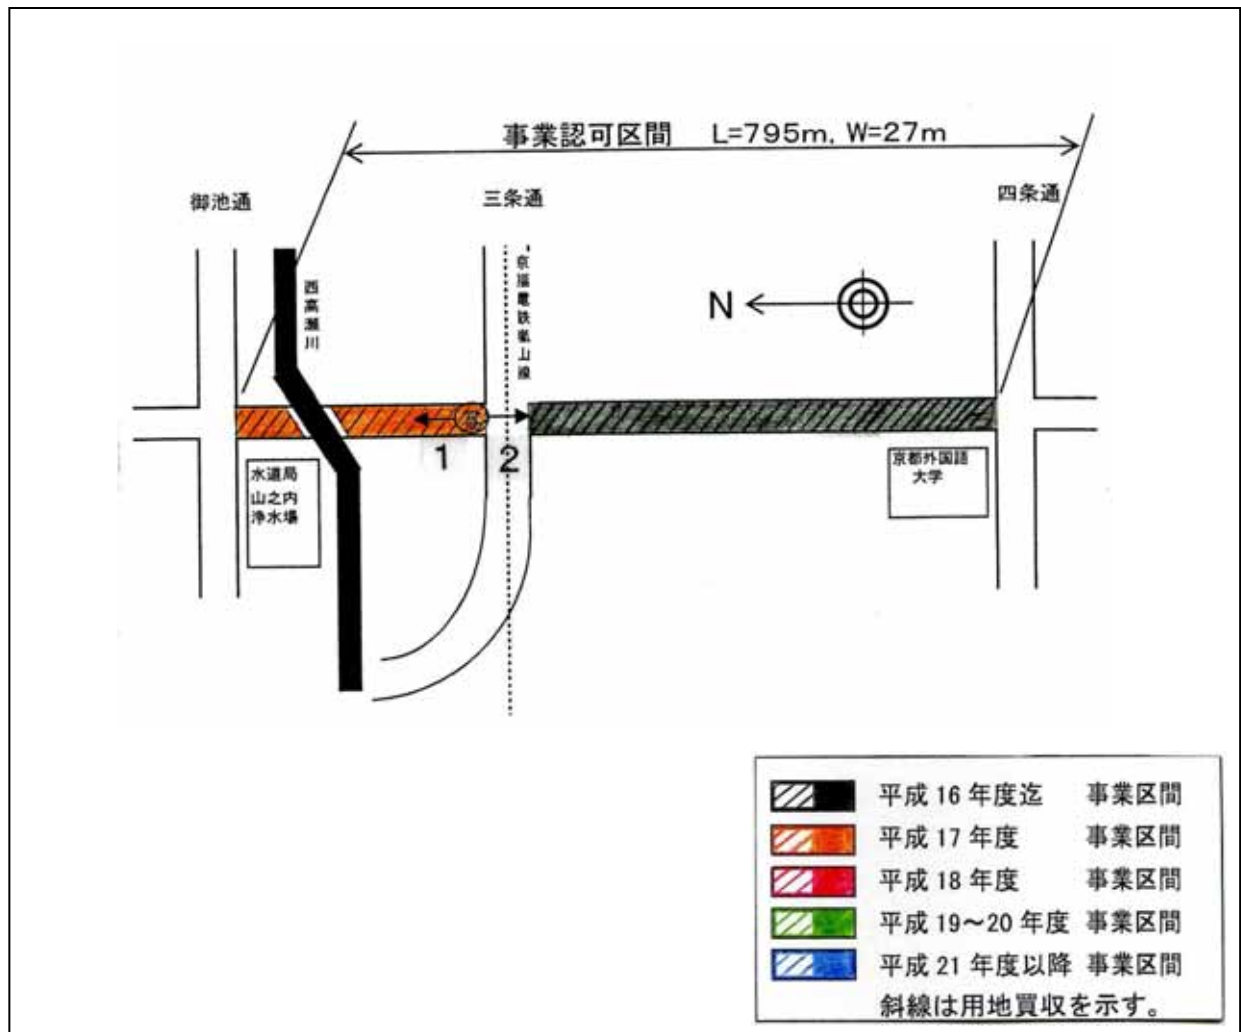

[事業概要]

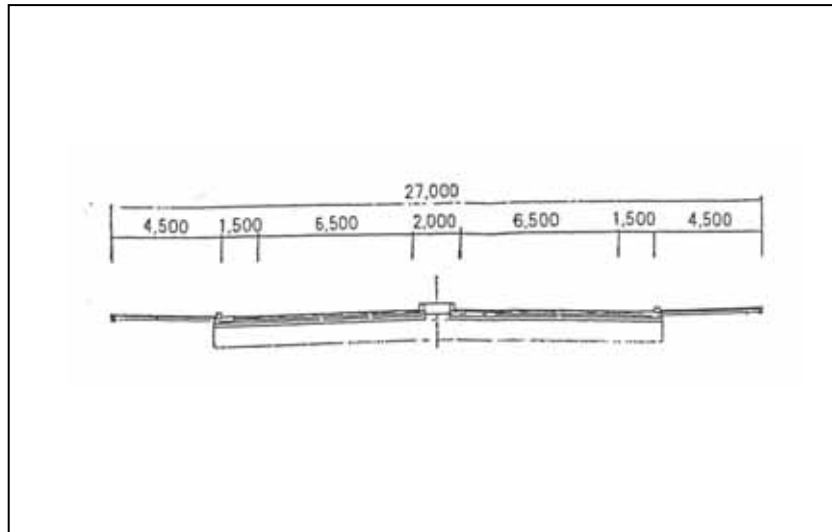

[写真] 1



2

