

平成 1 6 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧


再評価対象事業の該当条件

事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
 事業採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業
 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	補単	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数	対応方針
道路事業	1	補	一般国道 477 号 (大布施拡幅)	延長 L=2,195m 幅員 W=9.0(6.5)m	H2		15	「事業継続」
	2	補	宝が池通 (狐坂工区)	延長 L=600(820)m 幅員 W=11.0(16.5)m	H15 (S55)		2 (25)	「事業継続」
街路事業	3	補	向日町上鳥羽線	延長 L=395m 幅員 W=22.0m	H1		16	「事業継続」
	4	単	葛野西通	延長 L=177m 幅員 W=16.0m	H2		15	「事業継続」
	5	単	大原通	延長 L=1,114m 幅員 W=12.0m	S59		21	「事業継続」
	6	単	新十条通 (伏見工区)	延長 L=851m 幅員 W=7.5 ~ 77.0m	H7		10	「事業継続」
	7	単	新十条通 (山科工区)	延長 L=50m 幅員 W=64.0 ~ 73.0m	H7		10	「事業継続」
河川事業	8	補	新川	延長 L=890m	H7		10	「事業継続」
	9	補	旧安祥寺川	延長 L=400m	H2		15	「事業継続」
土地 整理 事業	10	単	洛北第二地区	面積 A=53.3ha	S53		27	「事業継続」

* 「補」は国庫補助事業，「単」は京都市単独事業を示す。

京都市街図 平成16年度 再評価対象事業 箇所図

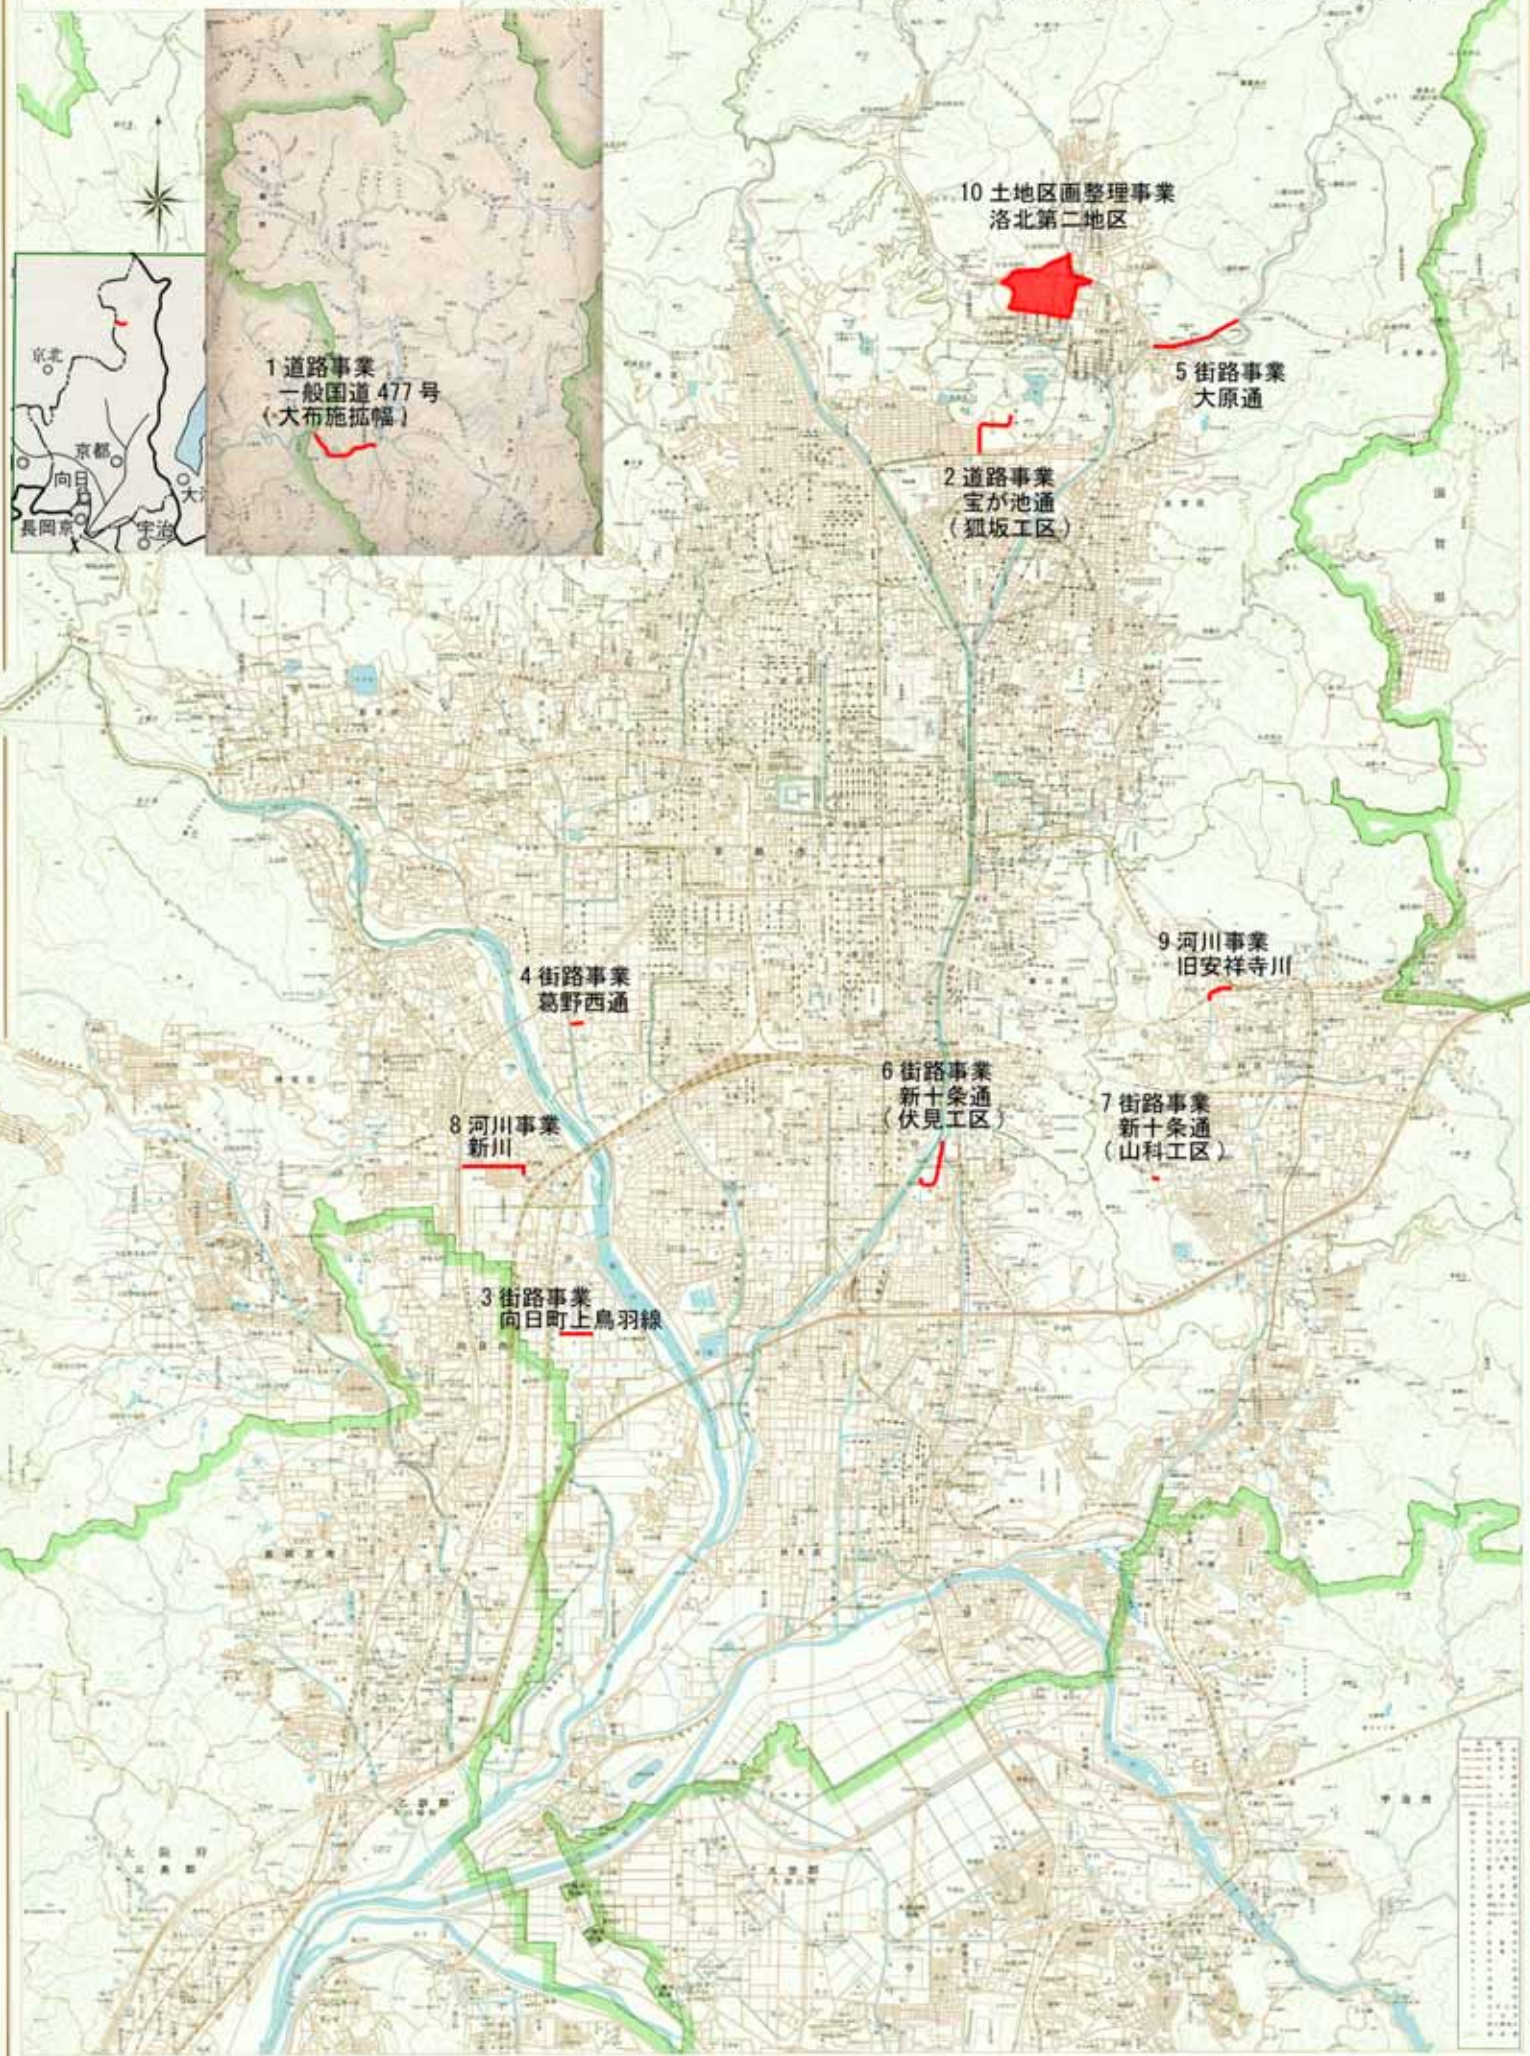

平成 16 年度再評価事業フォローアップ調書


(平成 18 年 3 月末)

事業名		道路事業 一般国道 4 7 7 号（大布施拡幅）		事業所管課	道路建設課
事業区間		自：京都市左京区花脊大布施町 至：京都市左京区花脊大布施町		延長及び幅員	延長 L = 2 ， 1 9 5 m 幅員 W = 9 . 0 （ 6 . 5 ） m
事業採択年度		平成 2 年度	完成予定年度	当初：平成 1 1 年度 変更：平成 2 2 年度	
事業進捗					
年度	全体事業	平成 1 6 年度以前	平成 1 7 年度	平成 1 8 年度	平成 1 9 年度以降
工事	L= 2,195 m C= 3,102 百万円	L= 1,005 m C= 1,650 百万円	L= 50 m C= 110 百万円	L= 50 m C= 82 百万円	L= 1,090 m C= 1,260 百万円
用地	A= 25,800 m ² C= 238 百万円	A= 23,700 m ² C= 228 百万円	A= — m ² C= — 百万円	A= 2,100 m ² C= 10 百万円	A= — m ² C= — 百万円
その他	測量，設計委託 C= 160 百万円	測量，設計委託 C= 103 百万円	C= — 百万円	測量，設計委託 C= 48 百万円	測量，設計委託 C= 9 百万円
計	C= 3,500 百万円	C= 1,981 百万円	C= 110 百万円	C= 140 百万円	C= 1,269 百万円
進捗率		57 %	60 %	64 %	100 %
平成 1 6 年度再評価時点での課題，問題点					
予算枠が伸びない中，優先的に重点配分しにくく，また，一部の用地買収に時間を要している。					
平成 1 7 年度 of 取組					
・ 上桂川 2 号橋上部工（工場製作） ・ 未買収地の土地所有者との交渉					
平成 1 8 年度以降 of 取組					
当面の目標 未買収地の買収及び上桂川 2 号橋・トンネル工事の完成。					
事業効果 幅員狭小及び線形不良区間を解消し，安全で円滑な道路交通の確保と沿道の地域づくりを支援する。 当面新たに約 4 5 0 m の供用を目指す。（計約 1 ， 4 0 0 m の供用）					
発現年度 平成 2 1 年度					


箇所図



[模式図]

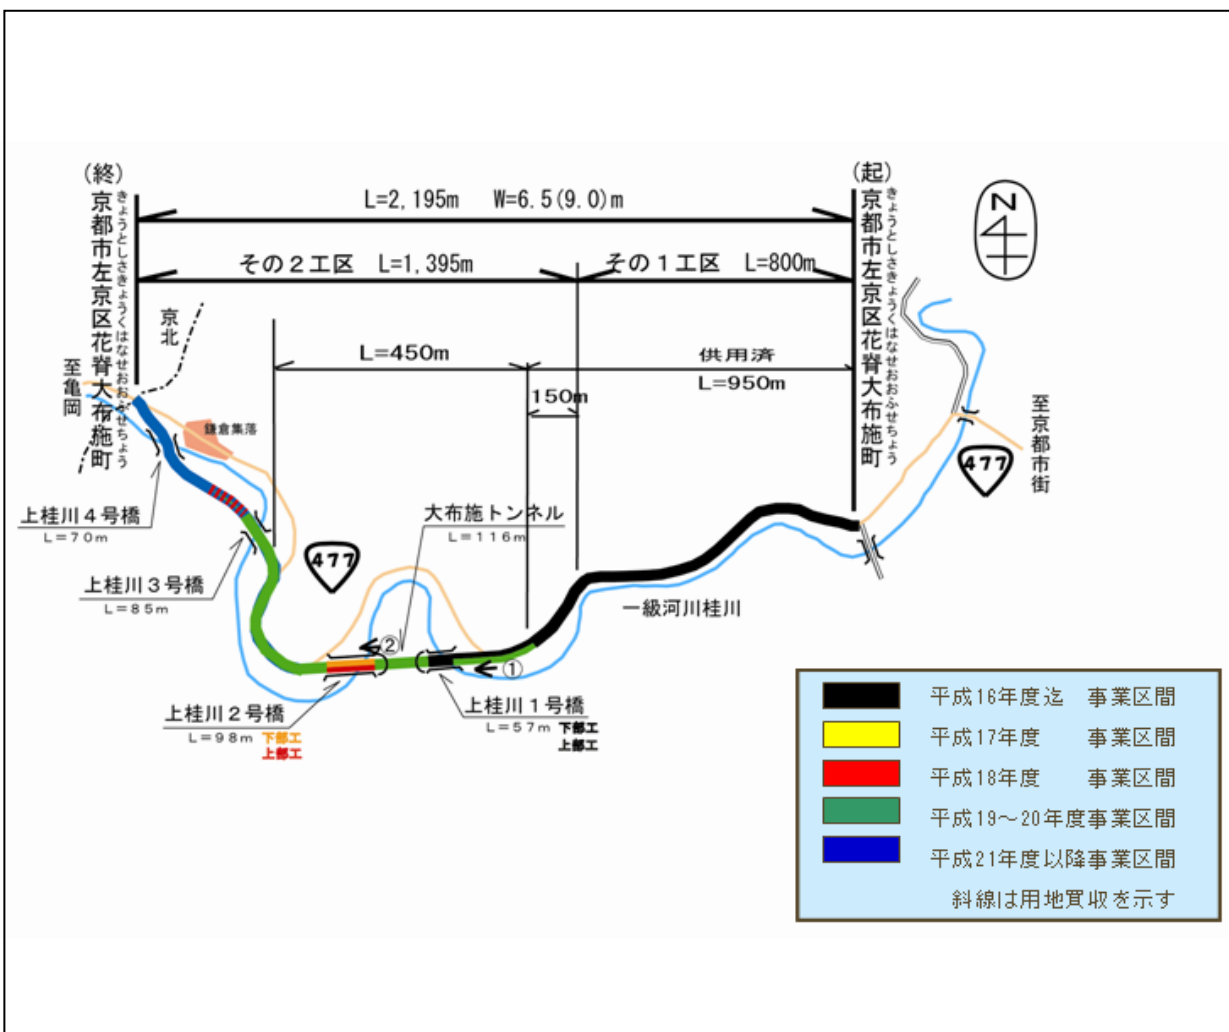

【事業概要】

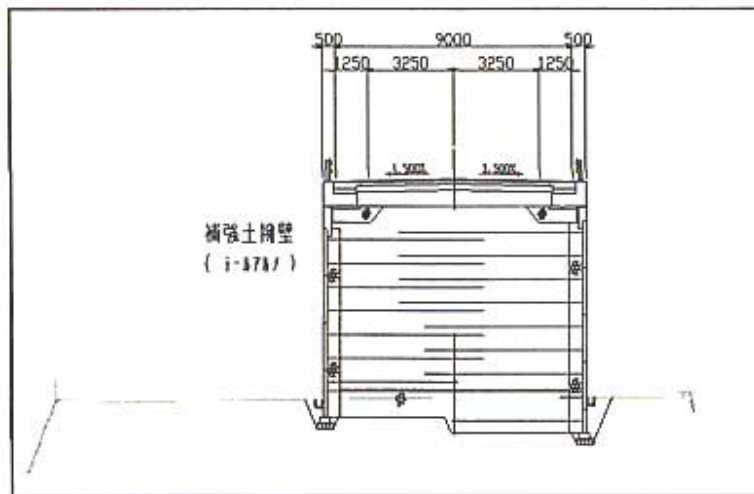

No 1

【写真】



No 2

