

## 平成 1 8 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧


### 再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

| 種別   | 番号 | 補単 | 事業名                   | 事業概要                                      | 採択年度 | 該当条件 | 経過年数 | 事業進捗率(%) | 備考                |
|------|----|----|-----------------------|-------------------------------------------|------|------|------|----------|-------------------|
| 河川事業 | 1  | 補  | 七瀬川                   | 延長 L=1,095m(950+145)<br>幅員 W=10.80~15.70m | H4   | ③    | 15   | 83       | 平成 13 年度<br>再評価実施 |
| 街路事業 | 2  | 単  | 西小路通                  | 延長 L=360m<br>幅員 W=11m                     | H4   | ③    | 15   | 53       | 平成 13 年度<br>再評価実施 |
|      | 3  | 補  | I・Ⅲ・25鴨川東岸線<br>(第2工区) | 延長 L=515m<br>幅員 W=21.0~30.6m              | H9   | ②    | 10   | 64       |                   |


\* 事業進捗率は平成 1 7 年度末の予算執行額の全体事業費における割合を示す。

# 京都市街図 平成18年度 再評価対象事業 箇所図

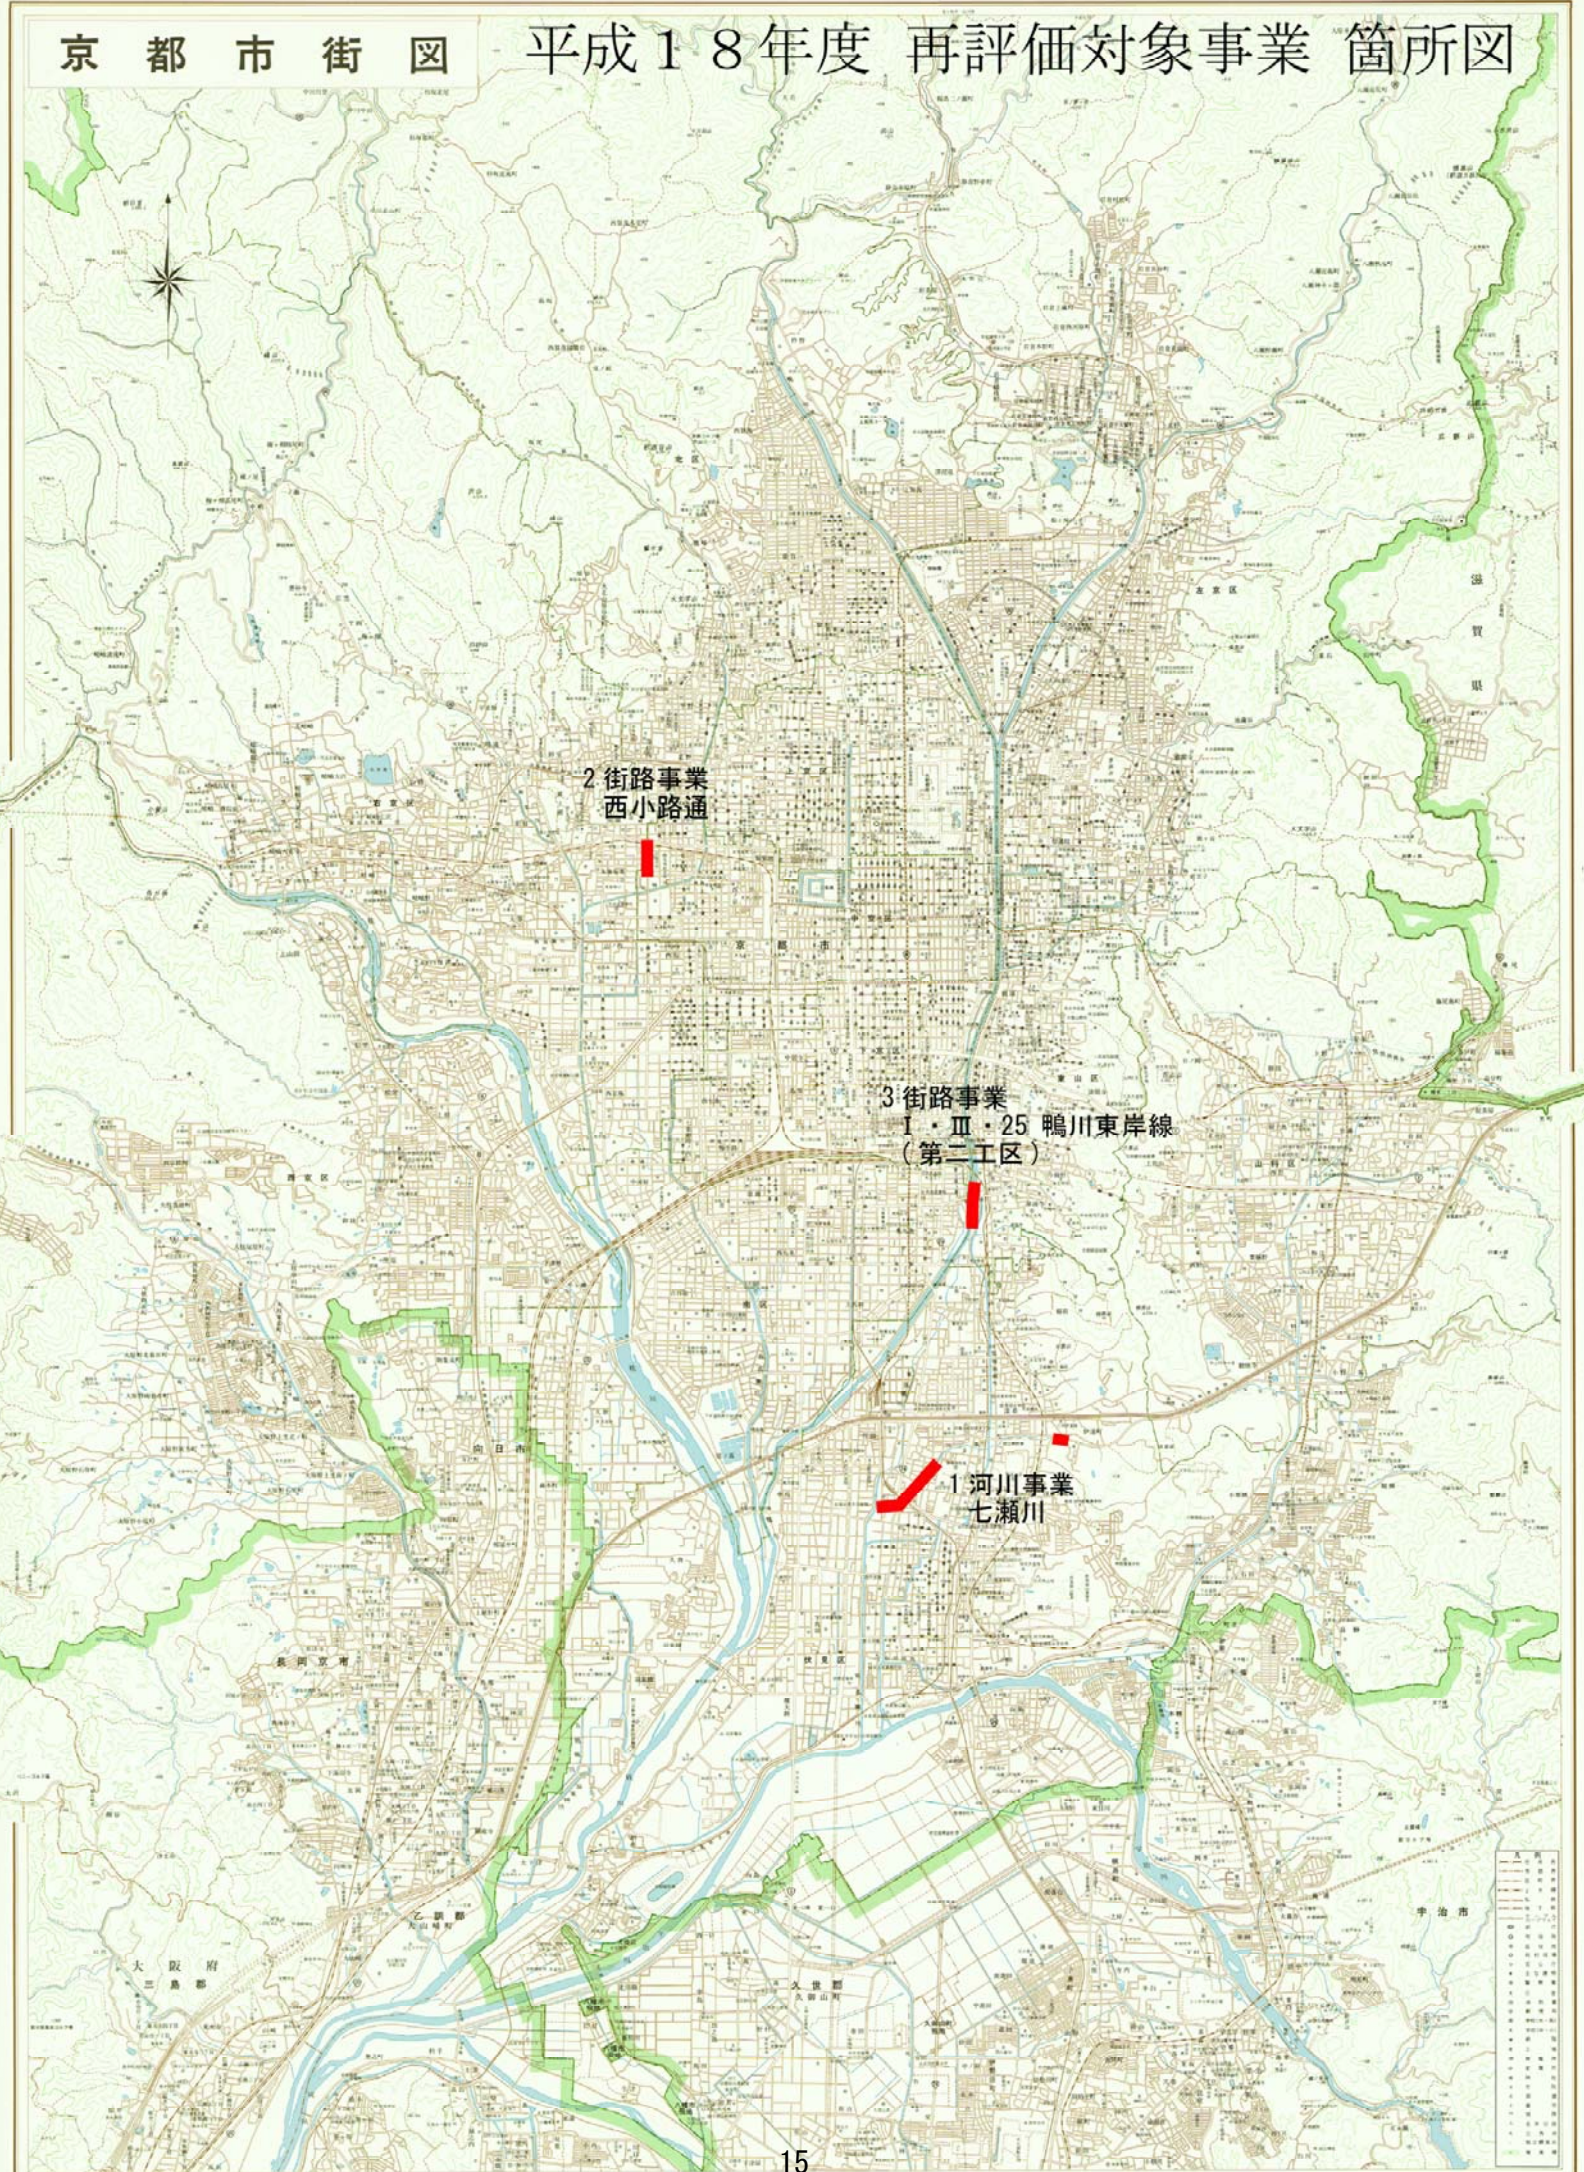

# 平成18年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)
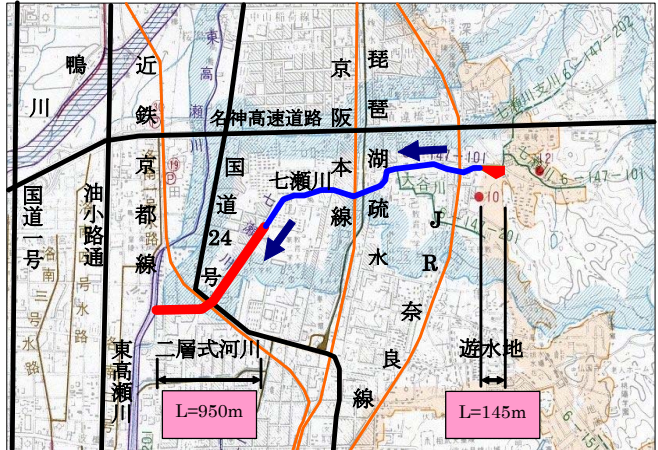
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                |                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                              | 河川事業 七瀬川                                    |                                                                                                | 事業所管課                  | 建設局水と緑環境部河川整備課                          |
| 事業区間                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自：伏見区竹田狩賀町（東高瀬川合流部）<br>至：伏見区深草大亀谷東久宝寺町（遊水地） |                                                                                                | 延長及び幅員                 | 延長L＝1,095m（950+145）<br>幅員W＝10.80～15.70m |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平成4年度                                       | 完成予定年度                                                                                         | 当初：平成13年度<br>変更：平成26年度 |                                         |
| <p>平成18年度再評価時点での課題、問題点</p> <p>施工方法や手順の見直しを行い、事業効果の早期発現に取り組んだ結果、二層式区間の整備による治水効果発現の見込みが立ち、順調に事業が進捗しているため、事業継続が妥当であるとの委員会の意見をいただいた。</p> <p>今後は、上中流部での宅地化の進行に伴い、早期に上流部の遊水地整備に向け着手する必要がある。</p>                                                                                        |                                             | <p>箇所図</p>  |                        |                                         |
| <p>平成20年度取組</p> <ul style="list-style-type: none"><li>二層式河川工事区間における残りの上部工築造が完了し、これにより、二層式全区間の築造が完了した。</li><li>遊水地予定地における未買収用地の地権者との交渉を進める。</li></ul>                                                                                                                             |                                             |                                                                                                |                        |                                         |
| <p>平成21年度以降取組</p> <p>当面の目標</p> <ul style="list-style-type: none"><li>上流部の遊水池の詳細設計に着手するとともに、並行して残る用地買収を進め、早期の治水効果発現を図る。</li></ul> <p>事業効果</p> <ul style="list-style-type: none"><li>都市河川としての治水安全度の向上</li></ul> <p>発現年度</p> <ul style="list-style-type: none"><li>平成26年度</li></ul> |                                             |                                                                                                |                        |                                         |

# 平成18年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)

|                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                            |                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                       | 街路事業 西小路通                             |                                                                                            | 事業所管課                             | 建設局道路建設部道路建設課       |
| 事業区間                                                                                                                                                                      | 自：右京区花園春日町（旧二条通）<br>至：右京区花園藪ノ下町（丸太町通） |                                                                                            | 延長及び幅員                            | 延長L＝360m<br>幅員W＝11m |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                    | 平成4年度                                 | 完成予定年度                                                                                     | 当初：平成7年度<br>変更：平成23年度（事業認可最終施行年度） |                     |
| 平成18年度再評価時点での課題、問題点<br><br>一部箇所において用地交渉が難航している。                                                                                                                           |                                       | 箇所図<br> |                                   |                     |
| 平成20年度 of 取組<br><br>公社買収による用地取得および用地の買戻しを行った。                                                                                                                             |                                       |                                                                                            |                                   |                     |
| 平成21年度以降 of 取組<br>当面の目標<br>買収対象となるマンション権利者との交渉を進め残りの用地買収に取り組むとともに、道路詳細設計を行う。また、既買収地の埋蔵文化財発掘調査を行う。<br><br>事業効果<br>本区間の整備を行うことにより、交差する東西主要幹線道路を結ぶ幹線道路として、安全かつ円滑な道路交通の確保を図る。 |                                       |                                                                                            |                                   |                     |

平成18年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |        |                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------|
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ⅰ・Ⅲ・25鴨川東岸線（第2工区）               |        | 事業所管課                                  | 建設局事業推進室                   |
| 事業区間                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自：京都市東山区福稲柿本町<br>至：京都市東山区福稲岸ノ上町 |        | 延長及び幅員                                 | 延長L＝515m<br>幅員W＝21.0～30.6m |
| 事業採択年度                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 平成9年度                           | 完成予定年度 | 当初：平成14年度<br>変更：平成21年度<br>（事業認可最終施行年度） |                            |
| 平成18年度再評価時点での課題、問題点<br>（用地買収の難航による事業の遅れ）<br>本事業区域は、大型物件や共有通路等が存在し相続手続きが多く、また、借家人の移転交渉に予測以上の時間を要したため事業が遅れたものである。                                                                                                                                                                                      |                                 |        | <div>箇所図</div>                         |                            |
| <div>平成20年度の取組</div> <div>（用地買収）</div> <p>平成20年度は、共有通路2筆（計約28㎡）について平成21年度から用地買収に入れるように準備を整えた。</p> <div>（協議）</div> <p>平成21年度からの工事の実施にあたり、関係機関と工程調整を行った。</p> <div>（関連）</div> <p>隣接する鴨川東岸線第1工区において、第2工区のとあい部を除き平成19年5月31日部分供用を開始した。</p>                                                                 |                                 |        |                                        |                            |
| <div>平成21年度以降の取組</div> <div>当面の目標</div> <div>（用地買収）</div> <p>残る2筆の共有通路（計約28㎡）の用地買収を行っていく。</p> <div>（工事）</div> <p>九条高架橋の耐震補強工事及び鴨川東岸線橋梁部のうち九条高架橋から北側の基礎工・下部工の工事等に着手していく。</p> <div>事業効果</div> <ul style="list-style-type: none"><li>平成20年6月1日に開通した京都高速道路（新十条通）のアクセス道路として、交通の円滑化と地域の活性化に寄与する。</li></ul> |                                 |        |                                        |                            |
