

平成 20 年度 再評価対象事業一覧

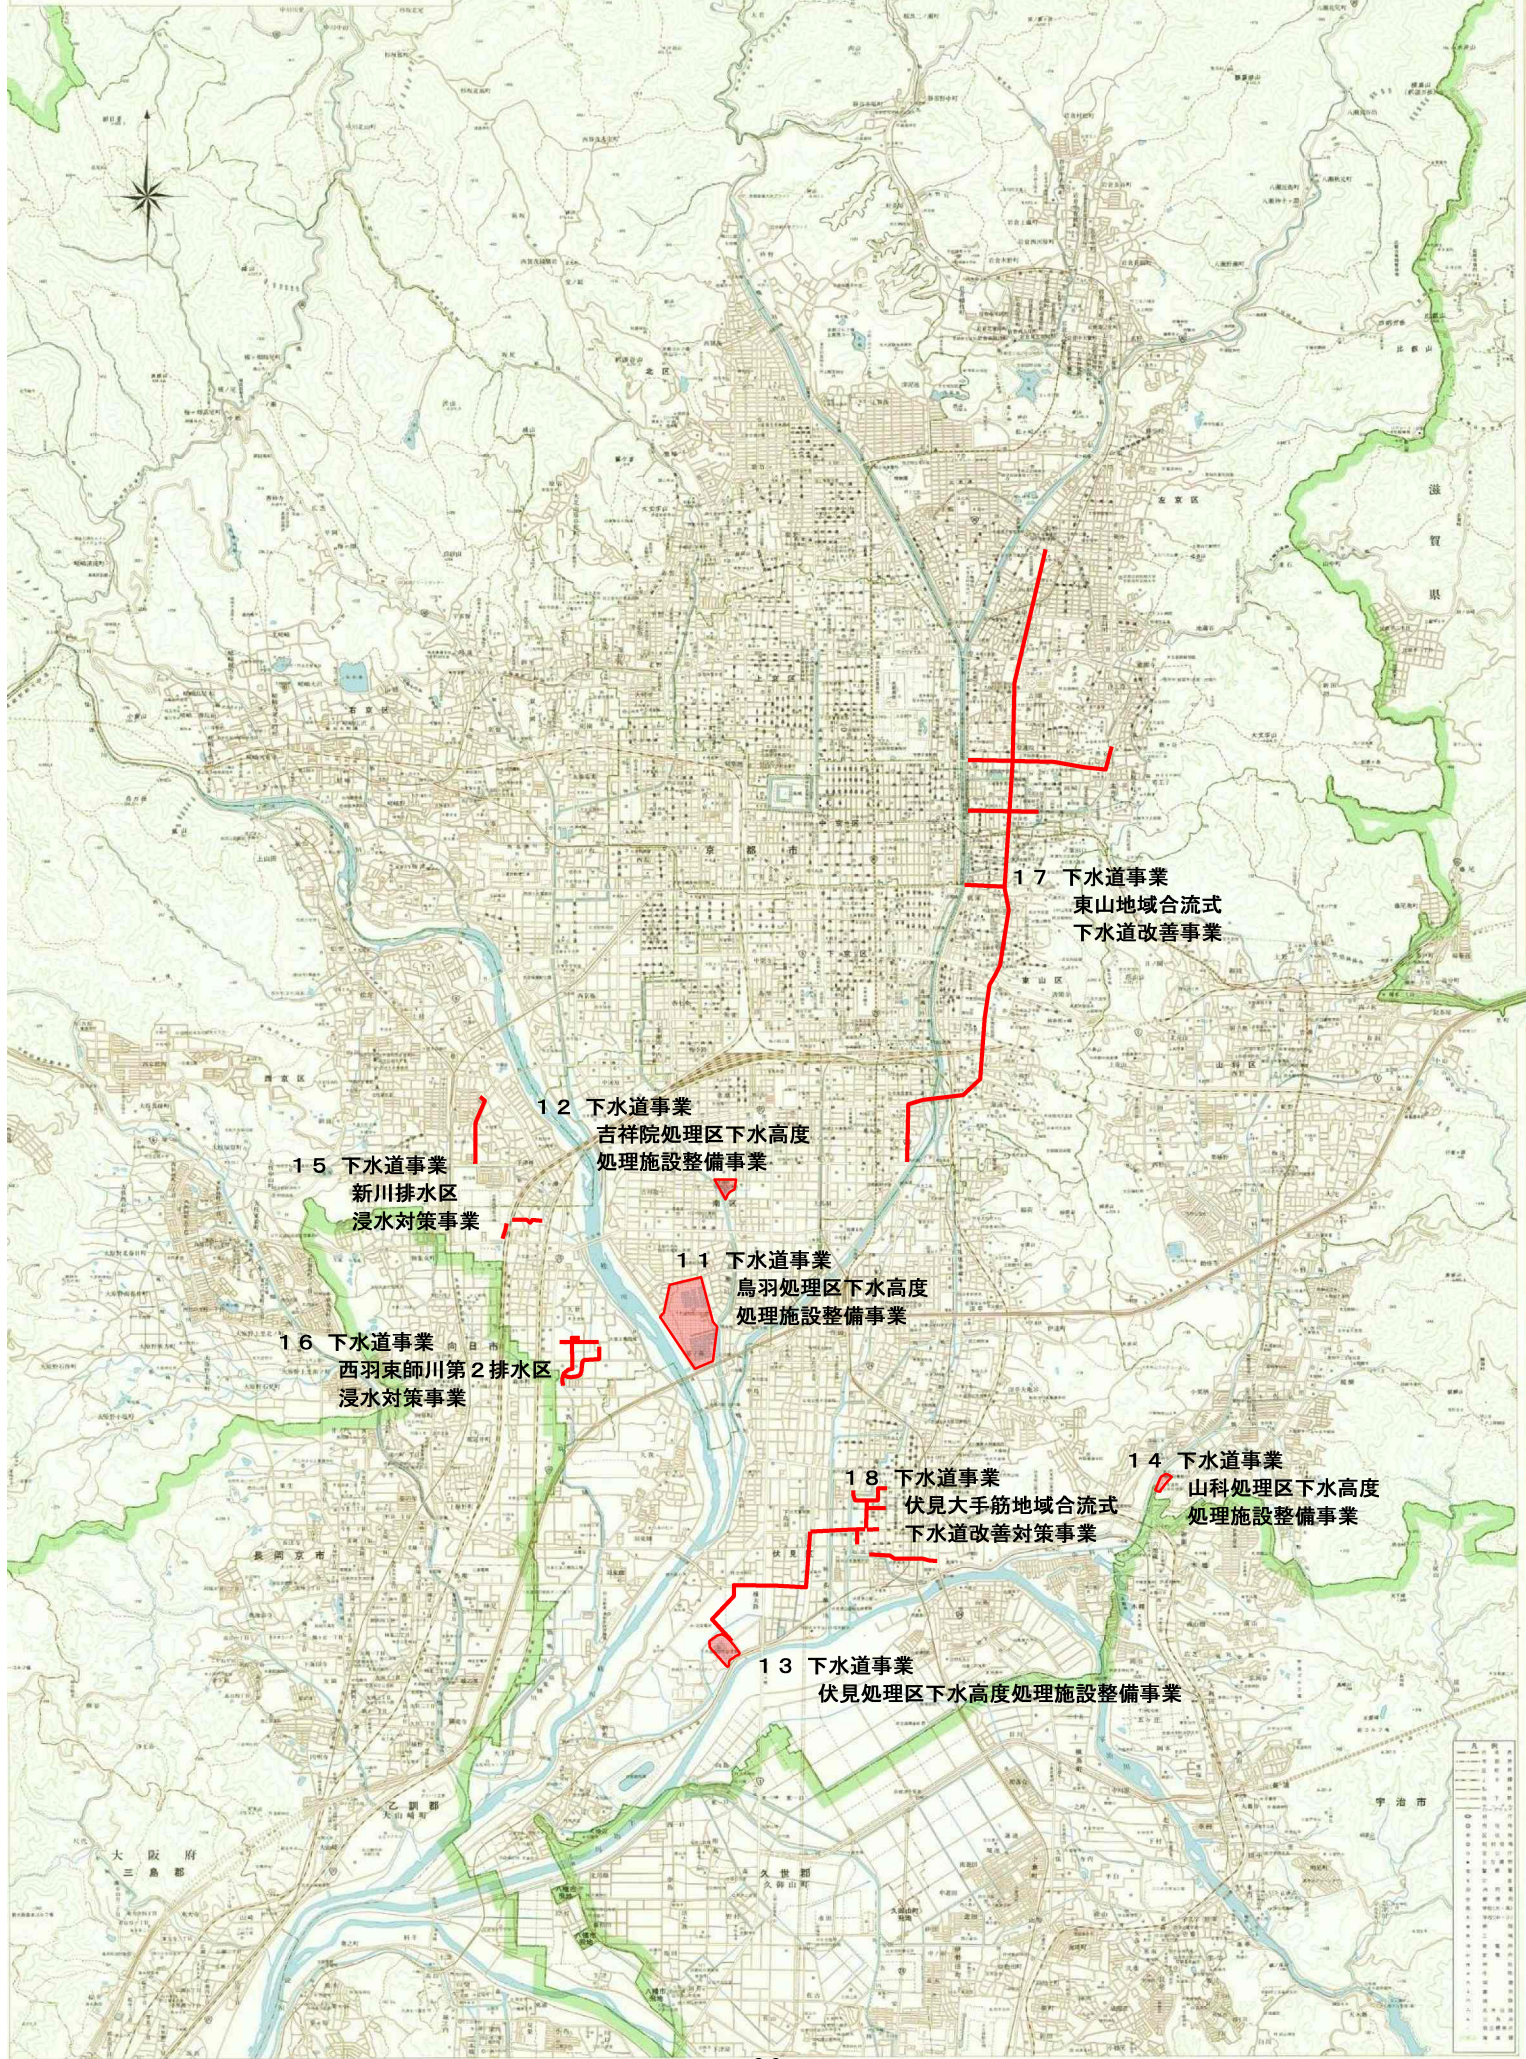
再評価対象事業の該当条件

- ①事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設整備事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④社会経済情勢の急激な変化，技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数 ※	進捗率(%)		備考
							H26.3	再評価時	
下水道事業	11	下水高度処理施設整備事業 鳥羽処理区	面積 A=8,200ha 処理能力 975,000m ³ /日	H2	③	25	40.3	34.2	
	12	下水高度処理施設整備事業 吉祥院処理区	面積 A=590ha 処理能力 114,000m ³ /日	H5	③	22	89.1	89.1	
	13	下水高度処理施設整備事業 伏見処理区	面積 A=1,920ha 処理能力 155,000m ³ /日	H7	③	20	60.0	48.9	
	14	下水高度処理施設整備事業 山科処理区	面積 A=2,040ha 処理能力 133,000m ³ /日	H12	③	15	32.1	32.1	
	15	浸水対策事業 新川排水区	面積 A=143ha	S61	③	29	14.8	6.4	
	16	浸水対策事業 西羽束師川第 2 排水区	面積 A=97ha	H8	③	19	80.2	72.2	
	17	下水道改善対策事業 東山地域合流式	面積 A=1,255ha	S61	③	29	96.9	93.5	
	18	下水道改善対策事業 伏見大手筋地域合流式	面積 A=272ha	H7	③	20	41.8	11.2	

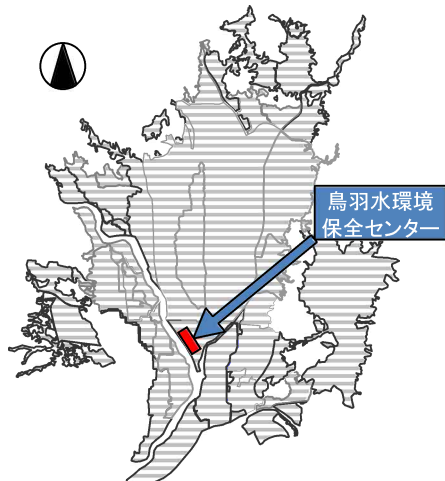
※ 経過年数は平成 26 年度における年数を示す。

京都市街図 平成20年度 再評価対象事業箇所図



平成20年度再評価事業フォローアップ調書

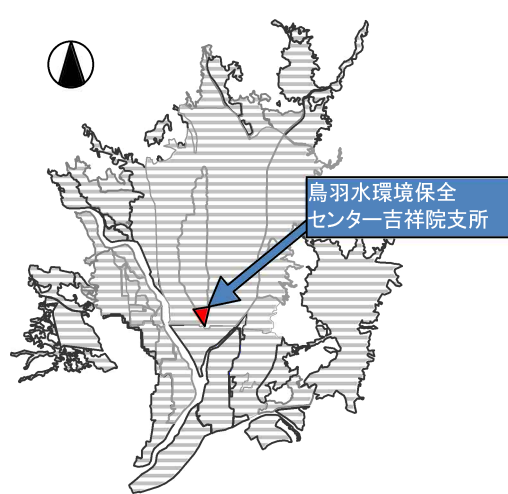
(平成26年3月末)

事業名		下水高度処理施設整備事業 鳥羽処理区		事業所管課		上下水道局下水道部計画課	
事業個所		鳥羽水環境保全センター (京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木)		平成25年度末現在	処理区域	A＝ 約8, 210 ha	
					処理能力	Q＝ 907, 000 m ³ /日 (一部高度処理)	
事業採択年度		平成2年度		完成予定年度		当初：平成27年度 変更：平成37年度	
事業進捗				箇所図			
種別	全体事業		平成25年度末				
工事	窒素除去能力 Q＝ 746,000 m ³ /日		窒素除去能力 Q＝ 183,000 m ³ /日				
	リン除去能力 Q＝ 746,000 m ³ /日		リン除去能力 Q＝ 285,000 m ³ /日				
	C＝ 42,610 百万円		C＝ 17,180 百万円				
その他							
計	C＝ 42,610 百万円		C＝ 17,180 百万円				
進捗率	34.2% ※ 【平成20年度再評価時】		40.3% 【平成26年3月末】				
平成20年度再評価時点での課題、問題点							
当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・近年の厳しい財政事情を受けて、改築更新事業との整合を図り、段階的かつ計画的に事業を行うことによって、より一層の経済性や効率性の向上を図ったため。 ・大阪湾における水質改善をさらに推進するため、国及び府が見直し作業中の流域別下水道整備総合計画において、許容される放流水質が厳しくなるため、処理場計画を見直し、より処理性能の高い施設計画とする必要性が生じたため。 評価委員会において「富栄養化の原因である窒素やリンを除去する高度処理は、水質改善の方策として有効な手段であり、計画的に推進する必要があることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。							
平成25年度の実績							
水処理施設（A～K系列）のうち、B系列における窒素除去を目的とした高度処理施設1／2の整備工事完了							
平成26年度以降の取組							
当面の目標 水処理施設（A～K系列）のうち、B系列における窒素除去を目的とした高度処理施設の完成							
事業効果 窒素除去能力の向上							
発現年度 平成27年度（B系列）							

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

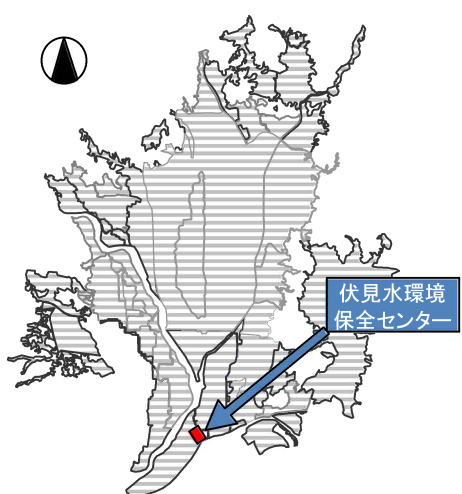
(平成26年3月末)

事業名		下水高度処理施設整備事業 吉祥院処理区		事業所管課		上下水道局下水道部計画課	
事業個所		鳥羽水環境保全センター吉祥院支所 (旧吉祥院水環境保全センター) (京都市南区吉祥院東浦町)		平成25年度末現在	処理区域	A＝約590 ha	
					処理能力	Q＝74,000 m ³ /日 (一部高度処理)	
事業採択年度		平成5年度		完成予定年度		当初：平成27年度 変更：平成37年度	
事業進捗				箇所図			
種別	全体事業		平成25年度末				
工事	窒素除去能力 Q＝23,300 m ³ /日 リン除去能力 Q＝23,300 m ³ /日 C＝2,110 百万円		窒素除去能力 Q＝34,000 m ³ /日 C＝1,880 百万円				
	C＝2,110 百万円		C＝1,880 百万円				
その他							
計	C＝2,110 百万円		C＝1,880 百万円				
進捗率	89.1% ※ 【平成20年度再評価時】		89.1% 【平成26年3月末】				
平成20年度再評価時点での課題、問題点							
当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・近年の厳しい財政事情を受けて、改築更新事業との整合を図り、段階的かつ計画的に事業を行うことによって、より一層の経済性や効率性の向上を図ったため。 ・大阪湾における水質改善をさらに推進するため、国及び府が見直し作業中の流域別下水道整備総合計画において、許容される放流水質が厳しくなるため、処理場計画を見直し、より処理性能の高い施設計画とする必要性が生じたため。 評価委員会において「富栄養化の原因である窒素やリンを除去する高度処理は、水質改善の方策として有効な手段であり、計画的に推進する必要があることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。							
平成25年度の実施							
鳥羽水環境保全センターとの一体的な整備運用に向けた組織の総合							
平成26年度以降の実施							
当面の目標 処理区を統合し、鳥羽水環境保全センターと一体的な整備、運用 事業効果 効率的な窒素及びリン除去を推進 発現年度 平成28年度							

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

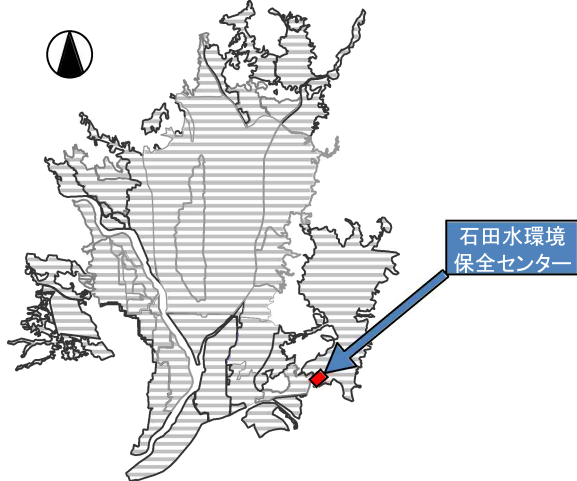
(平成26年3月末)

事業名		下水高度処理施設整備事業 伏見処理区		事業所管課		上下水道局下水道部計画課	
事業個所		伏見水環境保全センター (京都市伏見区横大路千両松町)		平成25年度末現在	処理区域	A＝ 約1,930 ha	
					処理能力	Q＝ 148,000 m ³ /日 (一部高度処理)	
事業採択年度		平成7年度		完成予定年度		当初：平成27年度 変更：平成37年度	
事業進捗				箇所図			
種別	全体事業		平成25年度末				
工事	窒素除去能力 Q＝ 117,000 m ³ /日 リン除去能力 Q＝ 117,000 m ³ /日 C＝ 6,600 百万円		窒素除去能力 Q＝ 16,500 m ³ /日 リン除去能力 Q＝ 104,500 m ³ /日 C＝ 3,960 百万円				
その他							
計	C＝ 6,600 百万円		C＝ 3,960 百万円				
進捗率	48.9% ※ 【平成20年度再評価時】		60.0% 【平成26年3月末】				
平成20年度再評価時点での課題、問題点							
当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・近年の厳しい財政事情を受けて、改築更新事業との整合を図り、段階的かつ計画的に事業を行うことによって、より一層の経済性や効率性の向上を図ったため。 ・大阪湾における水質改善をさらに推進するため、国及び府が見直し作業中の流域別下水道整備総合計画において、許容される放流水質が厳しくなるため、処理場計画を見直し、より処理性能の高い施設計画とする必要性が生じたため。 評価委員会において「富栄養化の原因である窒素やリンを除去する高度処理は、水質改善の方策として有効な手段であり、計画的に推進する必要があることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。							
平成25年度の実績							
老朽化した施設や設備の改築更新に合わせて段階的に高度処理化を進めており、当年度の実績はない。							
平成26年度以降の実績							
当面の目標 分流系施設における窒素除去を目的とした高度処理施設の整備 事業効果 窒素除去能力の向上 発現年度 平成30年度							

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

事業名		下水高度処理施設整備事業 山科処理区		事業所管課		上下水道局下水道部計画課	
事業個所		石田水環境保全センター (京都市伏見区石田西ノ坪)		平成25年 度末現在	処理区域	A＝ 約2,050 ha	
					処理能力	Q＝ 126,000 m ³ /日 (一部高度処理)	
事業採択年度		平成12年度		完成予定年度		当初：平成27年度 変更：平成37年度	
事業進捗				箇所図			
種別	全体事業		平成25年度末				
工事	窒素除去能力 Q＝ 135,000 m ³ /日 リン除去能力 Q＝ 135,000 m ³ /日 C＝ 9,590 百万円		窒素除去能力 Q＝ 26,000 m ³ /日 C＝ 3,080 百万円				
その他							
計	C＝ 9,590 百万円		C＝ 3,080 百万円				
進捗率	32.1% ※ 【平成20年度再評価時】		32.1% 【平成26年3月末】				
平成20年度再評価時点での課題、問題点							
当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・近年の厳しい財政事情を受けて、改築更新事業との整合を図り、段階的かつ計画的に事業を行うことによって、より一層の経済性や効率性の向上を図ったため。 ・大阪湾における水質改善をさらに推進するため、国及び府が見直し作業中の流域別下水道整備総合計画において、許容される放流水質が厳しくなるため、処理場計画を見直し、より処理性能の高い施設計画とする必要性が生じたため。 評価委員会において「富栄養化の原因である窒素やリンを除去する高度処理は、水質改善の方策として有効な手段であり、計画的に推進する必要があることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。							
平成25年度取組							
老朽化した施設や設備の改築更新に合わせて段階的に高度処理化を進めており、当年度の取組はない。							
平成26年度以降取組							
当面の目標 下水の高度処理施設の整備							
事業効果 窒素及びリンの除去能力の向上							
発現年度 平成37年度							

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

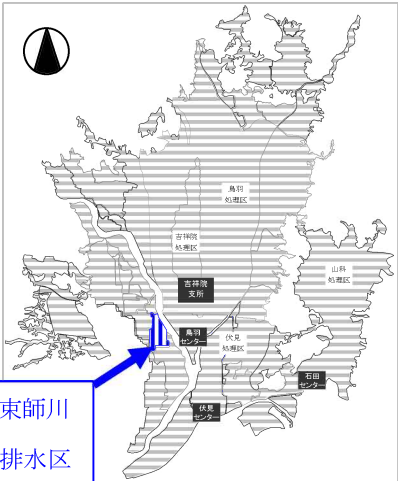
(平成26年3月末)

事業名		浸水対策事業 新川排水区		事業所管課	上下水道局下水道部計画課
事業区域		京都市西京区下津林地区他		対象面積	面積A＝ 143 ha
事業採択年度		昭和61年度		完成予定年度	当初：平成12年度 変更：平成29年度
事業進捗				箇所図	
種別	全体事業		平成25年度末		
工事	L＝ 4,980 m C＝ 4,540 百万円		L＝ 498 m C＝ 670 百万円		
その他					
計	C＝ 4,540 百万円		C＝ 670 百万円		
進捗率	6.4% ※ 【平成20年度再評価時】		14.8% 【平成26年3月末】		
平成20年度再評価時点での課題、問題点 当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・新川改修事業と連携を図りながら、限られた財源の中で、宅地化や土地区画整理事業による市街化の進行に合わせて浸水対策を事業化し、段階的な整備を行う必要がある。 評価委員会において「浸水被害を解消し、より安全で安心な都市環境を実現するには、下水道による浸水対策を着実に推進することが重要であることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。					
平成25年度の実施設計を継続実施 阪急桂駅東側地域（新川流域）における新川第6排水区の実施設計を継続実施					
当面の目標 新川6号幹線の整備工事着手 事業効果 浸水安全度の向上 発現年度 平成29年度					

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

事業名		浸水対策事業 西羽束師川第2排水区		事業所管課	上下水道局下水道部計画課
事業区域		京都市南区久世地区他		対象面積	面積A＝ 97 ha
事業採択年度		平成8年度		完成予定年度	当初：平成12年度 変更：平成34年度
事業進捗				箇所図 	
種別	全体事業	平成25年度末			
工事	L＝ 2,760 m C＝ 3,530 百万円	L＝ 2,510 m C＝ 2,830 百万円			
その他					
計	C＝ 3,530 百万円	C＝ 2,830 百万円			
進捗率	72.2% ※ 【平成20年度再評価時】	80.2% 【平成26年3月末】			
平成20年度再評価時点での課題、問題点					
当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・河川改修や向日町上鳥羽線の工事と連携をはかりながら、限られた財源の中で、宅地化や土地区画整理事業による市街化の進行に合わせて浸水対策を事業化し、段階的な整備を行う必要がある。 評価委員会において「浸水被害を解消し、より安全で安心な都市環境を実現するには、下水道による浸水対策を着実に推進することが重要であることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。					
平成25年度の取組					
流域雨水幹線接続支線の整備工事完了					
平成26年度以降の取組					
当面の目標 排水路改修等の完了					
事業効果 浸水安全度の向上					
発現年度 平成34年度					

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

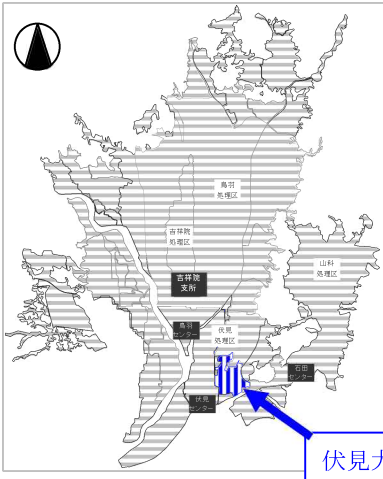
(平成26年3月末)

事業名		合流式下水道改善対策事業 東山地域		事業所管課	上下水道局下水道部計画課
事業区域		京都市左京区（北大路通り以南）、 京都市東山区		対象面積	面積A＝ 1, 255 ha
事業採択年度		昭和61年度		完成予定年度	当初：平成15年度 変更：平成27年度
事業進捗				箇所図	
種別	全体事業	平成25年度末			
工事	L= 16,550 m C= 43,000 百万円	L= 15,340 m C= 42,040 百万円			
その他					
計	C= 43,000 百万円	C= 41,680 百万円			
進捗率	93.5% ※ 【平成20年度再評価時】	96.9% 【平成26年3月末】			
平成20年度再評価時点での課題，問題点 当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・鴨川東岸線の整備と連携を図りながら事業を進めている。 評価委員会において「浸水被害を解消し，より安全で安心な都市環境を実現するには，下水道による浸水対策が重要であることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。					
平成25年度の実組 分水人孔及び接続管渠の整備工事を継続実施					
平成26年度以降の実組 当面の目標 分水人孔及び東大路幹線への接続管渠の整備 事業効果 汚濁負荷量の削減，公衆衛生上の安全確保，浸水安全度の向上等 発現年度 平成27年度					

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。

平成20年度再評価事業フォローアップ調書

(平成26年3月末)

事業名		合流式下水道改善対策事業 伏見大手筋地域		事業所管課	上下水道局下水道部計画課
事業区域		京都市伏見区濠川，宇治川派流流域		対象面積	面積A＝ 272 ha
事業採択年度		平成7年度		完成予定年度	当初：平成15年度 変更：平成35年度
事業進捗				箇所図 	
種別	全体事業	平成25年度末			
工事	L＝ 5,910 m C＝ 13,210 百万円	L＝ 2,542 m C＝ 5,520 百万円			
その他					
計	C＝ 13,210 百万円	C＝ 5,520 百万円			
進捗率	11.2% ※ 【平成20年度再評価時】	41.8% 【平成26年3月末】			
平成20年度再評価時点での課題，問題点 当初計画に比べて下記の理由により事業が遅れている。 ・限られた財源の中で，伏見処理区の改善対策として浸水被害が多発した伏見区深草地区北部の浸水対策を先行させるとともに，当地域では河川の水環境の改善を優先した段階的な整備計画とした。 評価委員会において「浸水被害を解消し，より安全で安心な都市環境を実現するには，下水道による浸水対策が重要であることから『事業継続』は妥当である。」という意見をいただいた。					
平成25年度の実績 大手筋幹線・大手筋南幹線・大手筋北幹線の整備工事完了					
平成26年度以降の取組 当面の目標 幹線の整備及び分水人孔等の整備 事業効果 汚濁負荷量の削減，公衆衛生上の安全確保等 発現年度 平成35年度					

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。
