

平成 23 年度 再評価対象事業一覧


再評価対象事業の該当条件

- ①事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ②事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設整備事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③再評価の実施後 5 年間（下水道事業については 10 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ④社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数 ※	進捗率(%)		備考
							H28. 3	再評価時	
道路事業	4	城南宮道	延長L=280m 幅員W=12m	H10	④	18	100. 0	47. 1	平成27年度

※ 経過年数は平成27年度における年数を示す。

京都市街図 平成23年度 再評価対象事業箇所図

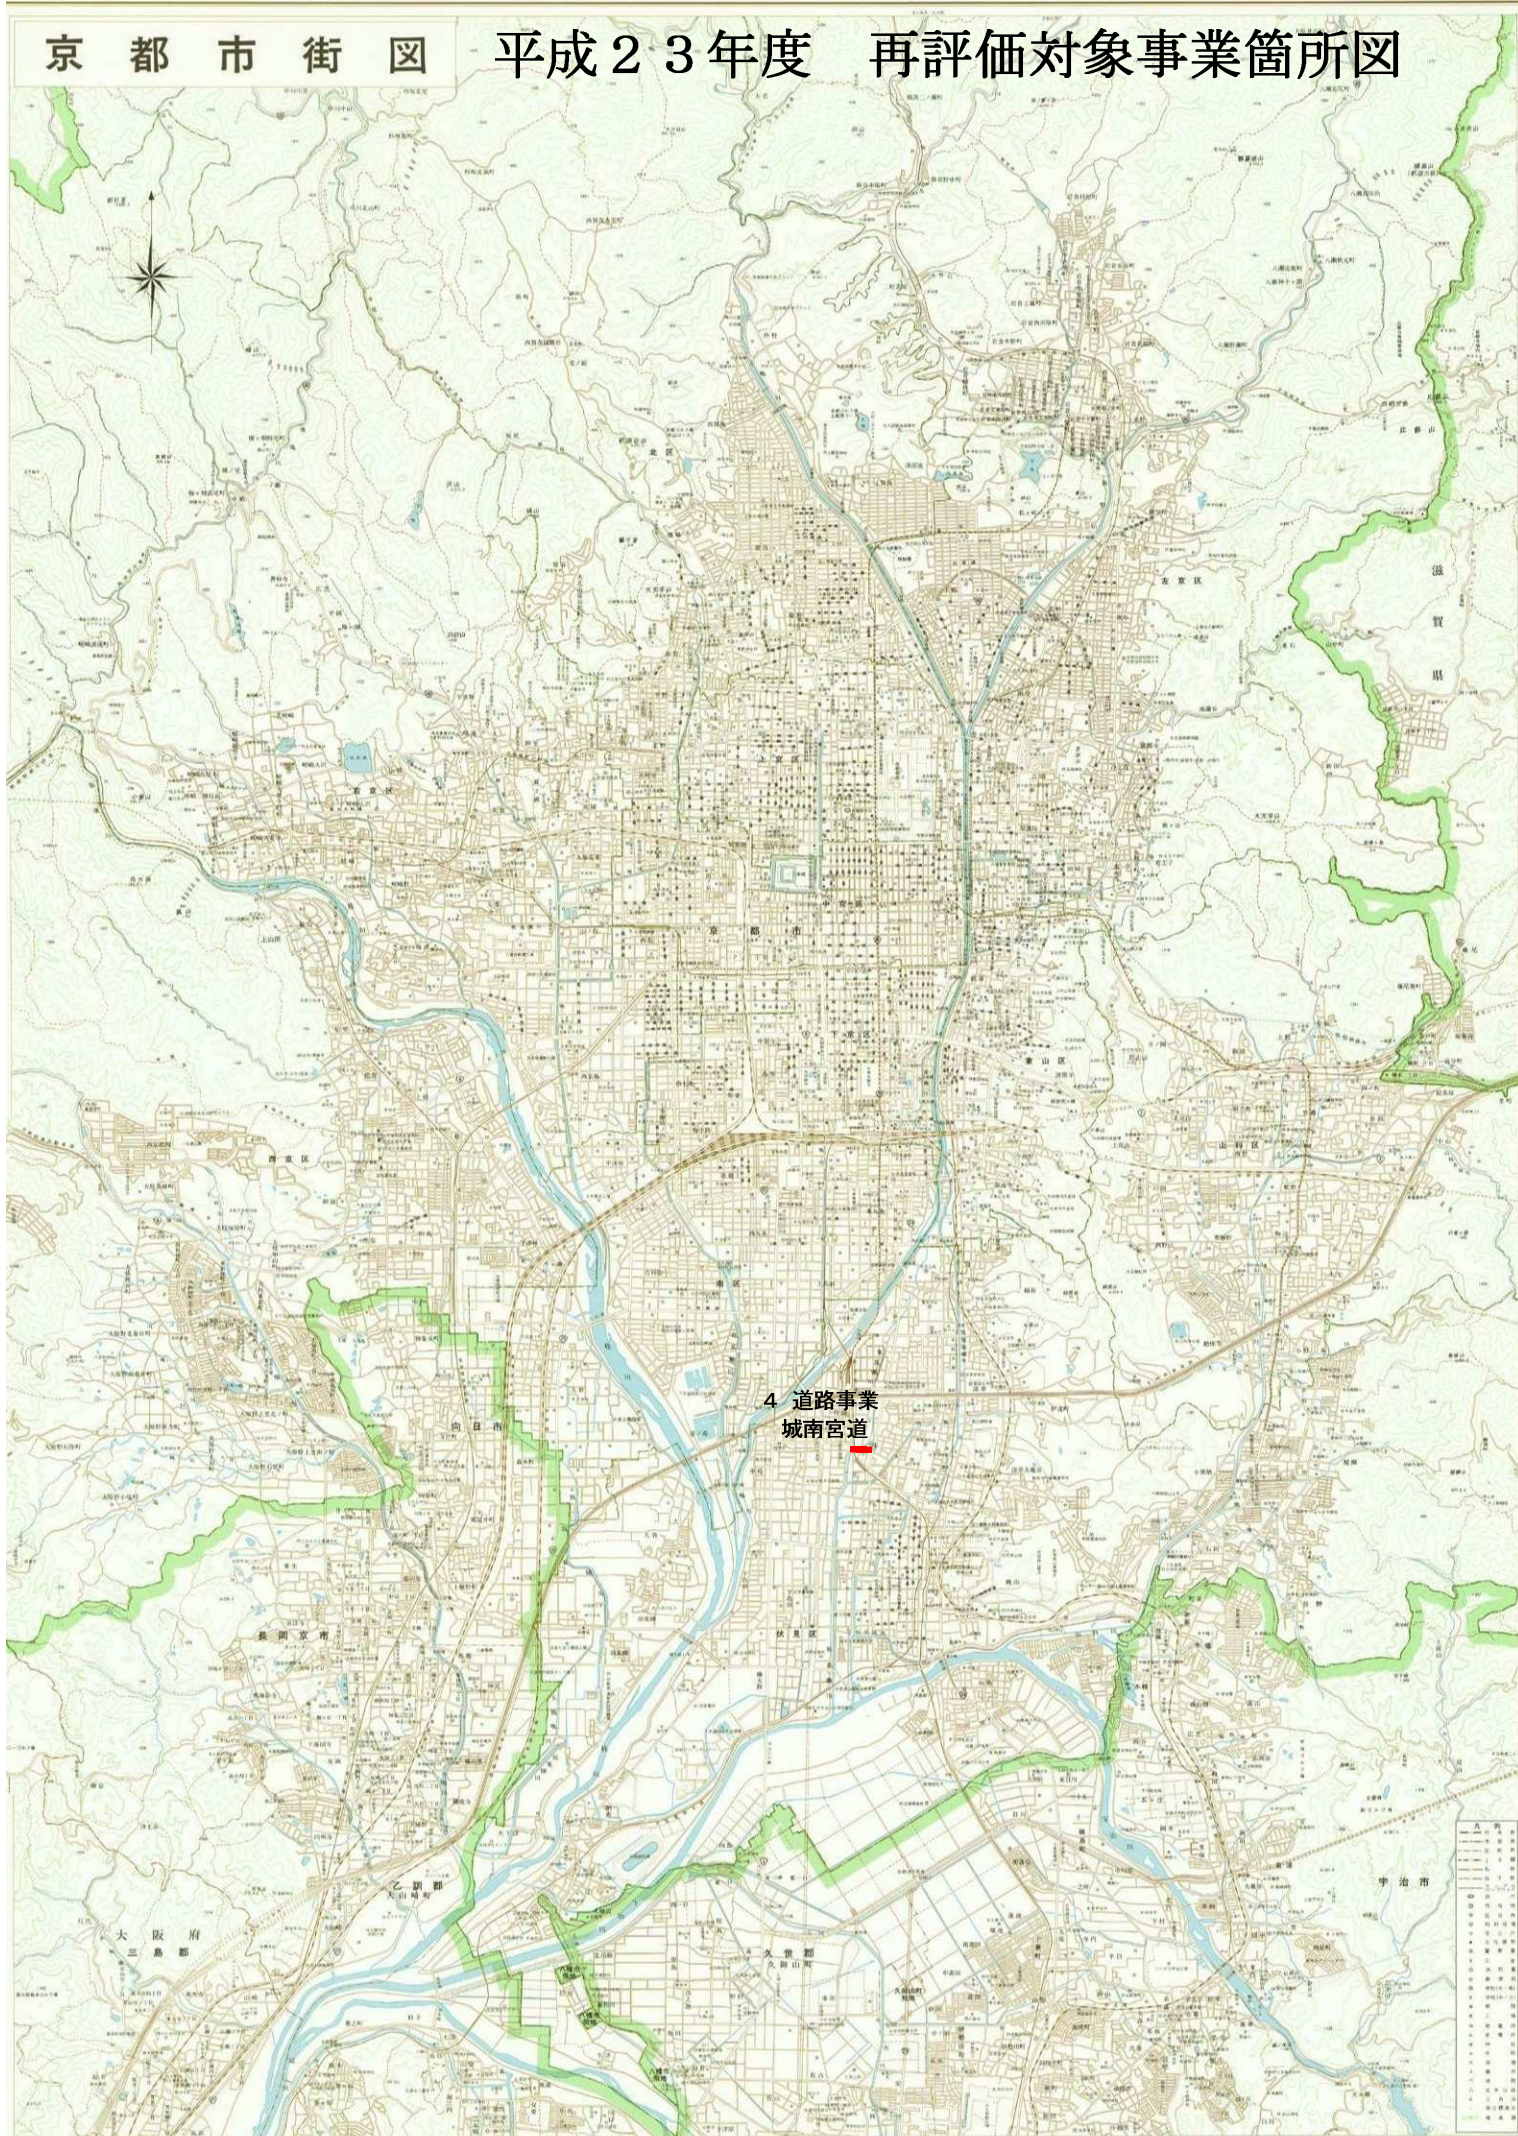

平成23年度再評価事業フォローアップ調書

(平成28年3月末)

事業名		道路事業 城南宮道		事業所管課	建設局道路建設部 道路環境整備課
事業区間		自：京都市伏見区竹田七瀬川町 至：京都市伏見区竹田浄菩提院町		延長及び幅員	延長L＝280m 幅員W＝12m
事業採択年度		平成10年度		完成予定年度	当初：平成28年度 変更：平成27年度
事業進捗				箇所図	
種別	全体事業		平成27年度末		
工事	L＝	280 m	L＝	280 m	
	C＝	280 百万円	C＝	280 百万円	
用地	A＝	1,531 m ²	A＝	1,531 m ²	
	C＝	737 百万円	C＝	737 百万円	
その他	C＝	212 百万円	C＝	212 百万円	
計	C＝	1,229 百万円	C＝	1,229 百万円	
進捗率	47.1% ※ 【平成23年度再評価時】		100% 【平成28年3月末】		

平成23年度再評価時点での課題、問題点

評価委員会において「用地買収に時間を要していたが、用地先行取得分を含めると、約99%の用地が確保されている状況である。交通量が比較的多いにも関わらず、歩道が一部にしかなく、車道幅員が狭いため、地域住民からも本事業の早期完成を望む声は大きいことから、『事業継続』は妥当である。」との意見をいただいた。

平成27年度の実施	
・ 国道24号付近の道路工事の実施により、全ての工事が完了し、全区間供用開始した。（事業完了）	

平成28年度以降の実施	
事業効果	
・ 全区間において歩道を整備することにより、安全で快適な歩行空間が確保される。	
・ 片側1車線の2車線の道路の整備により、車両の離合が困難な状況を改善することで、車両の円滑な通行が可能となる。	
発現年度	
平成27年度	

※再評価を実施した年度当初の事業進捗率を示す。
