


令和 7 年度 フォローアップ調書

フォローアップ対象事業箇所図 (平成30年度～令和5年度)

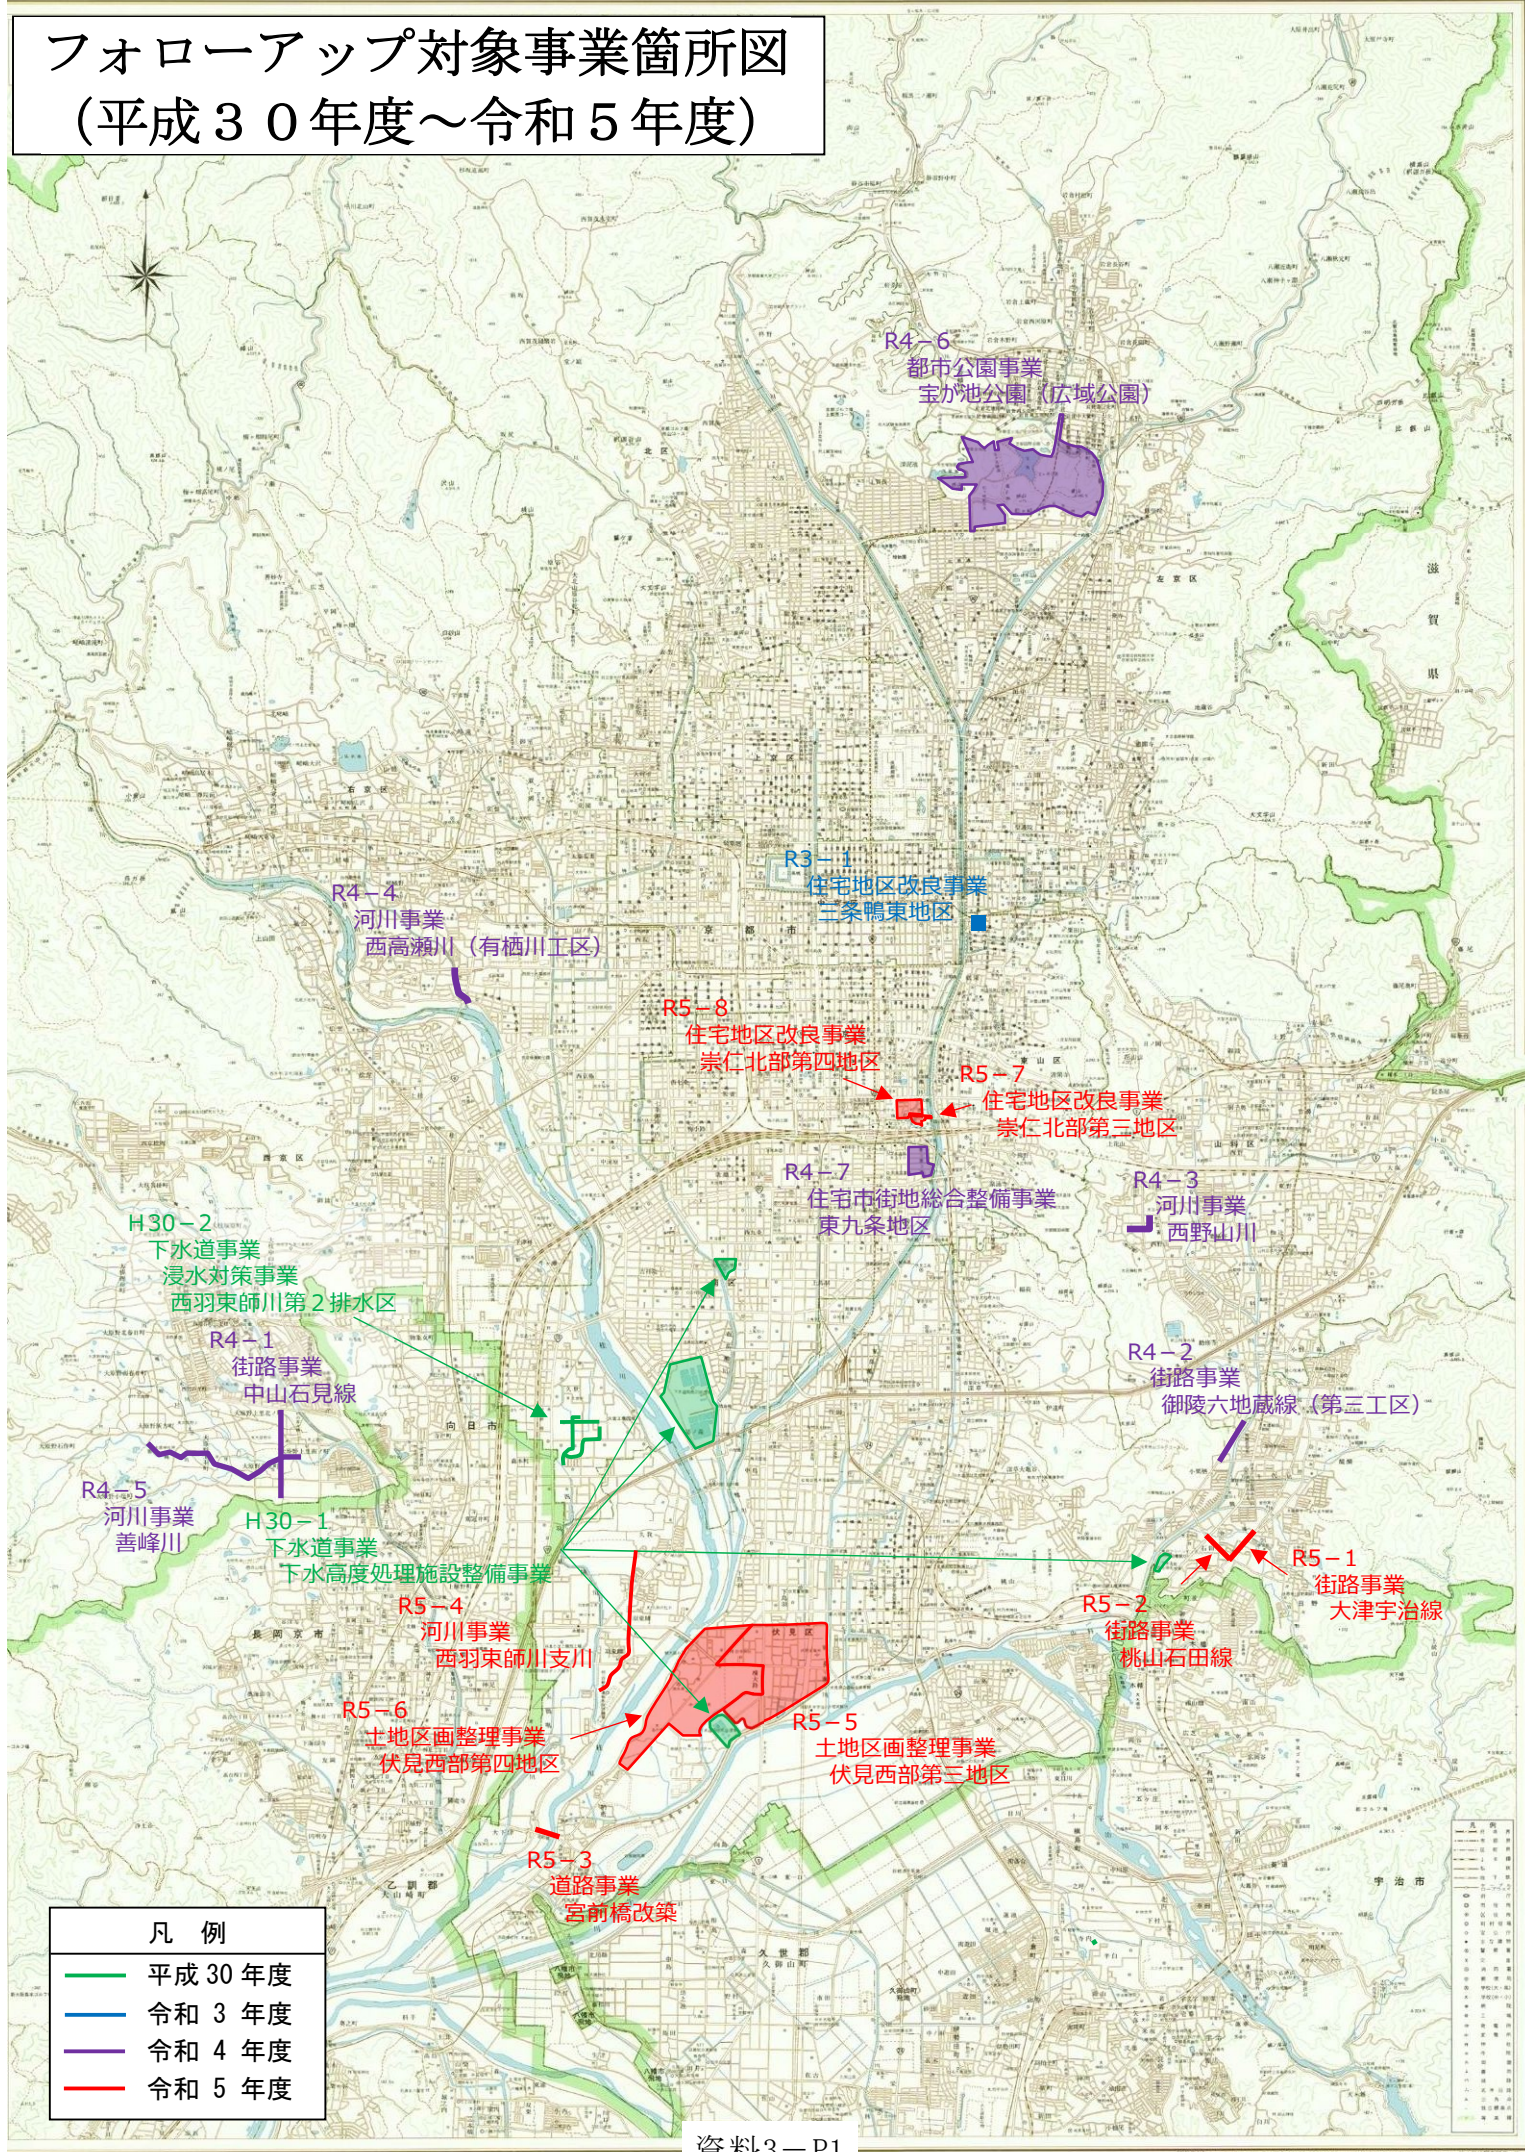

令和7年度 フォローアップ調査

再 評 価 実施年度	種 別	No.	事 業 名	担 当	延長/幅員/面積	事業区間	進捗率			事業計画			変 更 の 有 無	特記事項
							(今回)	(前回)	増減	項目	(今回)	(前回)		
							令和7年度フォローアップ (令和7年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ			令和7年度フォローアップ (令和7年3月末時点)	前回再評価 または 昨年度フォローアップ		
令和5年度	街路事業	1	大津宇治線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=396m 幅員 W=12.0～ 16.0m	自：京都市伏見区石田大山町 至：京都市伏見区石田大山町	33.2%	17.0%	16.2%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成21年度 令和12年度 18.50億円	平成21年度 令和12年度 18.50億円	無	①進捗状況（完了の有無等） ②事業計画の変更 ③事業を取巻く状況の変化 ④前回再評価における指摘事項 ⑤その他 前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点)
		2	桃山石田線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=364m 幅員 W=16.0m	自：京都市伏見区石田森東町 至：京都市伏見区石田内里町	49.6%	48.2%	1.4%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成21年度 令和11年度 16.00億円	平成21年度 令和11年度 16.00億円	無	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点)
	道路事業	3	宮前橋改築	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=640m 幅員 W=15.0～ 18.5m	自：京都市伏見区淀大下津町 至：京都市伏見区納所町	60.8%	59.8%	1.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成21年度 令和12年度 60.00億円	平成21年度 令和9年度 47.67億円	有	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点) ②完成予定年度及び全体事業費の変更
	河川事業	4	西羽東師川支川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,000m 幅員 W=17.4m	自：京都市伏見区羽東師古川町 至：京都市伏見区久我森の宮町	73.8%	70.0%	3.8%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和61年度 令和11年度 123.44億円	昭和61年度 令和11年度 123.44億円	無	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点)
	土地区画整理事業	5	伏見西部第三地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=104.5ha	京都市伏見区横大路三栖池田 屋敷町他	91.2%	90.1%	1.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和59年度 令和15年度 181.57億円	昭和59年度 令和15年度 181.57億円	無	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点)
		6	伏見西部第四地区	建設局都市整備部 南部区画整理事務所	面積 A=116.7ha	京都市伏見区横大路中ノ庄町他	57.5%	55.0%	2.5%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和63年度 令和13年度 280.00億円	昭和63年度 令和13年度 280.00億円	無	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点) ②事業計画を変更予定
	住宅地区改良事業	7	崇仁北部第三地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=2.73ha	京都市下京区上之町他	98.6%	98.6%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和58年度 令和11年度 126.78億円	昭和58年度 令和6年度 126.78億円	有	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点) ②完成予定年度の変更
		8	崇仁北部第四地区	都市計画局住宅部 すまいまちづくり課	面積 A=6.80ha	京都市下京区郷之町他	80.4%	79.3%	1.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和60年度 令和11年度 434.89億円	昭和60年度 令和6年度 434.89億円	有	前回の記載は令和5年度再評価時の内容 (進捗率は令和5年3月末時点) ②完成予定年度の変更
令和4年度	街路事業	1	中山石見線	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=1,059m 幅員 W=25m	自：京都市西京区大原野東竹の里町 至：京都市西京区大原野石見町	69.2%	76.2%	-7.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和10年度 88.79億円	平成5年度 令和10年度 79.31億円	有	②全体事業費の変更
		2	御陵六地蔵線（第三工区）	建設局道路建設部 道路建設課	延長 L=632m 幅員 W=15m	自：京都市伏見区小栗栖々ヶ瀬町 至：京都市伏見区小栗栖牛ヶ瀬町	53.5%	53.5%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成4年度 令和7年度 37.40億円	平成4年度 令和7年度 37.40億円	無	②事業計画を変更予定
	河川事業	3	西野山川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=635m 幅員 W=9.8m	自：京都市山科区西野山射庭ノ上町 至：京都市山科区西野山百々町	95.9%	91.6%	4.3%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和9年度 30.07億円	平成5年度 令和9年度 30.07億円	無	
		4	西高瀬川（有栖川工区）	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=560m 幅員 W=20m	自：京都市右京区梅津横口町 （桂川合流域） 至：京都市右京区梅津後藤町 （四条通）	88.3%	87.6%	0.7%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和9年度 37.33億円	平成5年度 令和9年度 37.33億円	無	
		5	善峰川	建設局土木管理部 河川整備課	延長 L=2,100m 幅員 W=28m	自：京都市西京区大原野上里南ノ町 至：京都市西京区大原野灰方町	73.6%	72.8%	0.8%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和63年度 令和9年度 39.19億円	昭和63年度 令和9年度 39.19億円	無	
		6	宝が池公園（広域公園）	建設局みどり政策 推進室	面積 A=128.9ha	京都市左京区上高野流田町8他地内	68.6%	64.0%	4.6%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	昭和49年度 令和14年度 266.50億円	昭和49年度 令和14年度 266.50億円	無	
	住宅市街地総合 整備事業	7	東九条地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	整備地区面積 A=9.43ha	京都市南区東九条東岩本町、 南岩本町、北河原町、南河原町	97.3%	95.2%	2.1%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成5年度 令和7年度 219.71億円	平成5年度 令和7年度 219.71億円	無	②事業計画を変更予定
令和3年度	住宅地区改良事業	1	三条鴨東地区	都市計画局住宅室 すまいまちづくり課	面積 A=1.26ha	京都市東山区若松町他	84.2%	84.2%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成11年度 令和11年度 104.29億円	平成11年度 令和6年度 103.19億円	有	②完成予定年度及び全体事業費の変更
平成30年度	下水道事業	1	下水高度処理施設整備事業	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=13,000ha	鳥羽水環境保全センター他	46.1%	46.1%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成2年度 令和25年度 609.10億円	平成2年度 令和25年度 609.10億円	無	②事業計画を変更予定
		2	浸水対策事業 西羽東師川第2排水区	上下水道局下水道部 計画課	面積 A=97ha	南区久世地区他	80.2%	80.2%	0.0%	事業採択年度 完成予定年度 全体事業費	平成8年度 令和10年度 35.30億円	平成8年度 令和10年度 35.30億円	無	
