

令和5年度施設整備予定箇所

令和5年度の新規箇所

令和5年度以前からの継続箇所

① 新青果棟Ⅱ期整備
 (今後の予定)
 R7~8年度: 青果3号棟解体
 R8年度: 新青果棟Ⅱ期着工
 R10年度: 新青果棟Ⅱ期竣工

② 関連仮設店舗の設計・工事
 R4年4月~R5年7月
 (改修工事完了後、随時仮設移転)

⑤ 関連5号棟・関連施設棟解体工事
新青果棟設備切回し工事
 R5年4月~R6年3月
 (今後の予定)
 R5年度: 新青果棟Ⅰ期着工
 R7年度: 新青果棟Ⅰ期竣工

⑥ 塩干冷蔵庫棟工事
 R3年10月~R4年12月

③ 新関連棟基本・実施設計
 R5~6年度
 (今後の予定)
 R6~7年度: 新関連棟着工
 R7年度: 新関連棟竣工


⑦ 新水産棟見学エリア展示施工
 R5年4月1日供用開始予定

④ 鮮魚冷蔵庫棟等解体工事
 R3年11月~R4年12月

賑わいゾーン 民間工事
 R5年度事業着手
 R7年度開業予定

「ホテルエミオン京都」
 R2年7月開業

「京都 梅小路 花伝抄」
 R4年6月開業

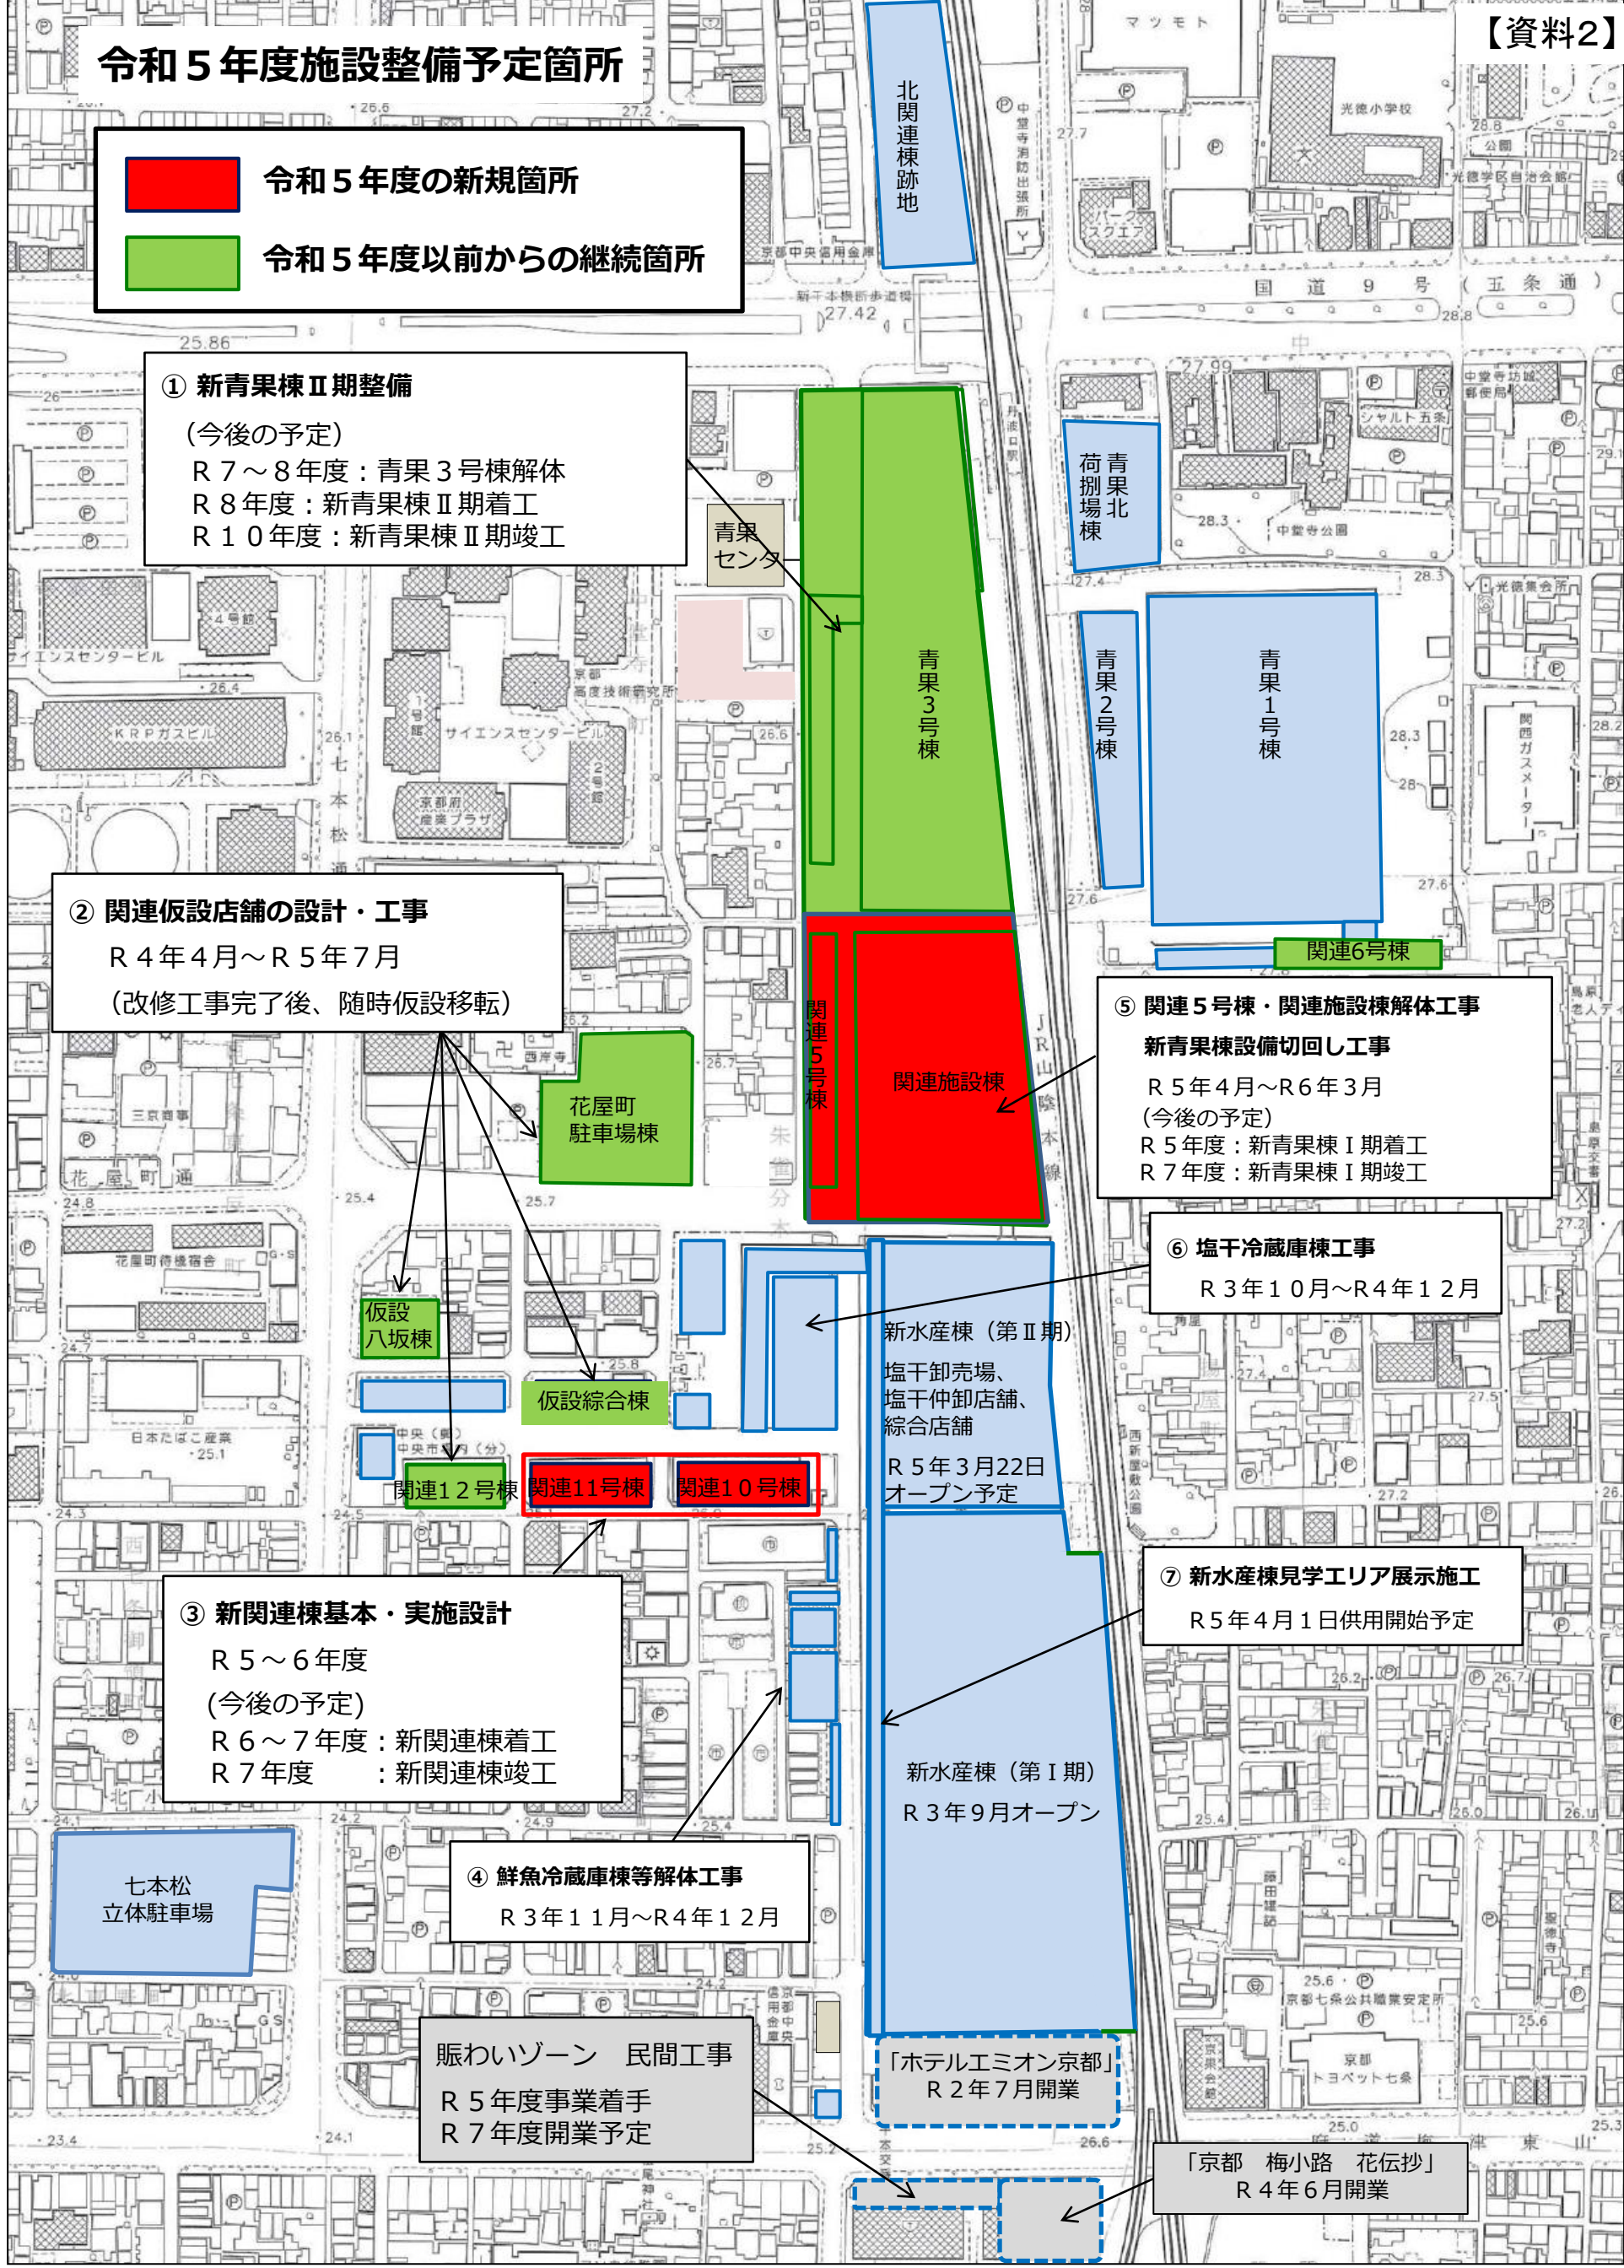

北関連棟跡地

青果センター

荷捌場棟

青果2号棟

青果1号棟

関連6号棟

関連5号棟

関連施設棟

花屋町駐車場棟

仮設八坂棟

仮設総合棟

関連12号棟

関連11号棟

関連10号棟

新水産棟(第Ⅱ期)
塩干卸売場、
塩干仲卸店舗、
総合店舗
R5年3月22日
オープン予定

新水産棟(第Ⅰ期)
R3年9月オープン

七本松
立体駐車場

「ホテルエミオン京都」
R2年7月開業

「京都 梅小路 花伝抄」
R4年6月開業
