「道路のり面維持保全計画」の進捗状況（令和８年９月末時点）

本計画では、「対策優先箇所」と「点検に基づく対策箇所」の２つを軸に、道路のり面（人工のり面及び自然斜面）の防災対策を行うこととしています。（詳しくは計画を参照）

「対策優先箇所※」について

※対策優先箇所とは対策が必要な箇所の中でも早期に対策が必要な箇所

【目標】（令和４年度から令和８年度まで）

Ａグループ（残り１５箇所）の対策完了

Ｂグループ（残り２２箇所）の早期着手・早期完了



【進捗状況】

＜Ａグループ＞
着手済　１５箇所　１００％
対策済　１０箇所　　６７％


＜Ｂグループ＞
着手済　２２箇所１００％
対策済　　８箇所　３６％

「点検に基づく対策箇所」について

日常・災害点検等により早期の対策が必要となった箇所の対策を完了させる。

【進捗状況】


令和4年度 対策完了	令和5年度 対策完了	令和6年度 対策完了	令和7年度 対策完了	令和8年度 対策完了	合計
5箇所	7箇所	6箇所	0箇所	2箇所	20箇所

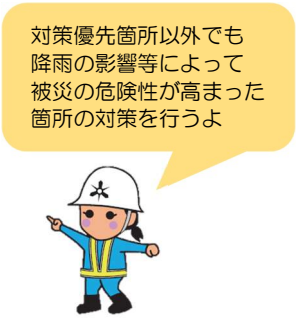

対策事例

【路線名】
中地日吉線

【完成年度】
令和６年度

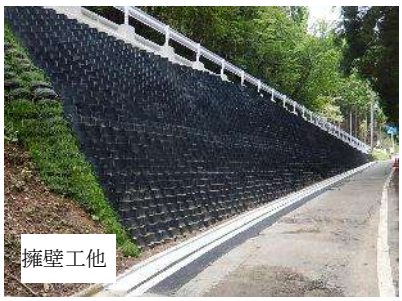

【路線名】
沓掛西大路
五条線

【完成年度】
令和６年度



表　対策優先箇所（残り３７箇所）進捗状況一覧

優先区間※	路線名	Ａグループ（１５箇所）			Ｂグループ（２２箇所）		
		箇所数	着手済	うち対策済	箇所数	着手済	うち対策済
Ⅰ	一般国道１６２号	9	9	7	4	4	4
	一般国道３６７号	－	－	－	－	－	－
	一般市道渋谷蹴上線	－	－	－	－	－	－
Ⅱ	一般国道４７７号	2	2	1	1	1	0
	主要府道京都広河原美山線	－	－	－	4	4	1
	主要府道下鴨大津線	2	2	1	2	2	0
	主要府道下鴨静原大原線	1	1	1	－	－	－
	主要府道京都京北線	－	－	－	1	1	0
	一般府道上黒田貴船線	1	1	0	－	－	－
	一般府道柚原向日線	－	－	－	－	－	－
	一般府道宮ノ辻神吉線	－	－	－	4	4	1
	一般市道小野１号線	－	－	－	1	1	1
	一般市道久多２号線	－	－	－	1	1	0
Ⅲ	一般国道４７７号	－	－	－	2	2	1
	主要府道京都日吉美山線	－	－	－	1	1	0
	一般府道久多広河原線	－	－	－	1	1	0
合計		１５	１５	１０	２２	２２	８

※優先区間とは、災害発生時における医療活動及び避難者への緊急物資の供給等に必要な緊急輸送道路や山間部の集落の避難対策、社会的に与える影響が大きい要素を考慮し、優先度が高い順に優先区間Ⅰから Ⅲに分類したものです。

（詳しくは計画１２ページを参照）
