

平成 11 年度京都市公共事業再評価対象事業一覧

- | | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|---|
| (| 区分① | 事業採択後 5 年を経過した後も未着工の事業 |) |
| 区分② | 事業採択後 10 年を経過した時点で継続中の事業 | | |
| 区分③ | 事業の進捗状況や社会情勢の急激な変化による事業 | | |

国庫補助事業

種 別	番号	事業名	区分	対応方針
道 路 事 業	1	一般国道 477 号	②	「事業継続」
河 川 事 業	2	旧安祥寺川	②	「事業継続」


京都市単独事業

種 別	番号	事業名	区分	対応方針
道 路 事 業	3	大原花背線	②	「条件付事業継続」
街 路 事 業	4	葛野大路	②	「事業継続」
	5	北泉通	②	「事業継続」
	6	御池通	②	「事業継続」
	7	向日町上鳥羽線	②	「事業継続」
	8	葛野西通	②	「事業継続」
	9	大原通	②	「事業継続」
	10	宝ヶ池通	②	「事業継続」
	11	山陰線側道北線	②	「事業継続」
	12	近鉄東側道	②	「事業継続」
土地区画整理事業	13	洛北第二地区	②	「事業継続」
合 計		13事業		

1:50,000

京都市全図

平成11年度再評価対象事業全体図

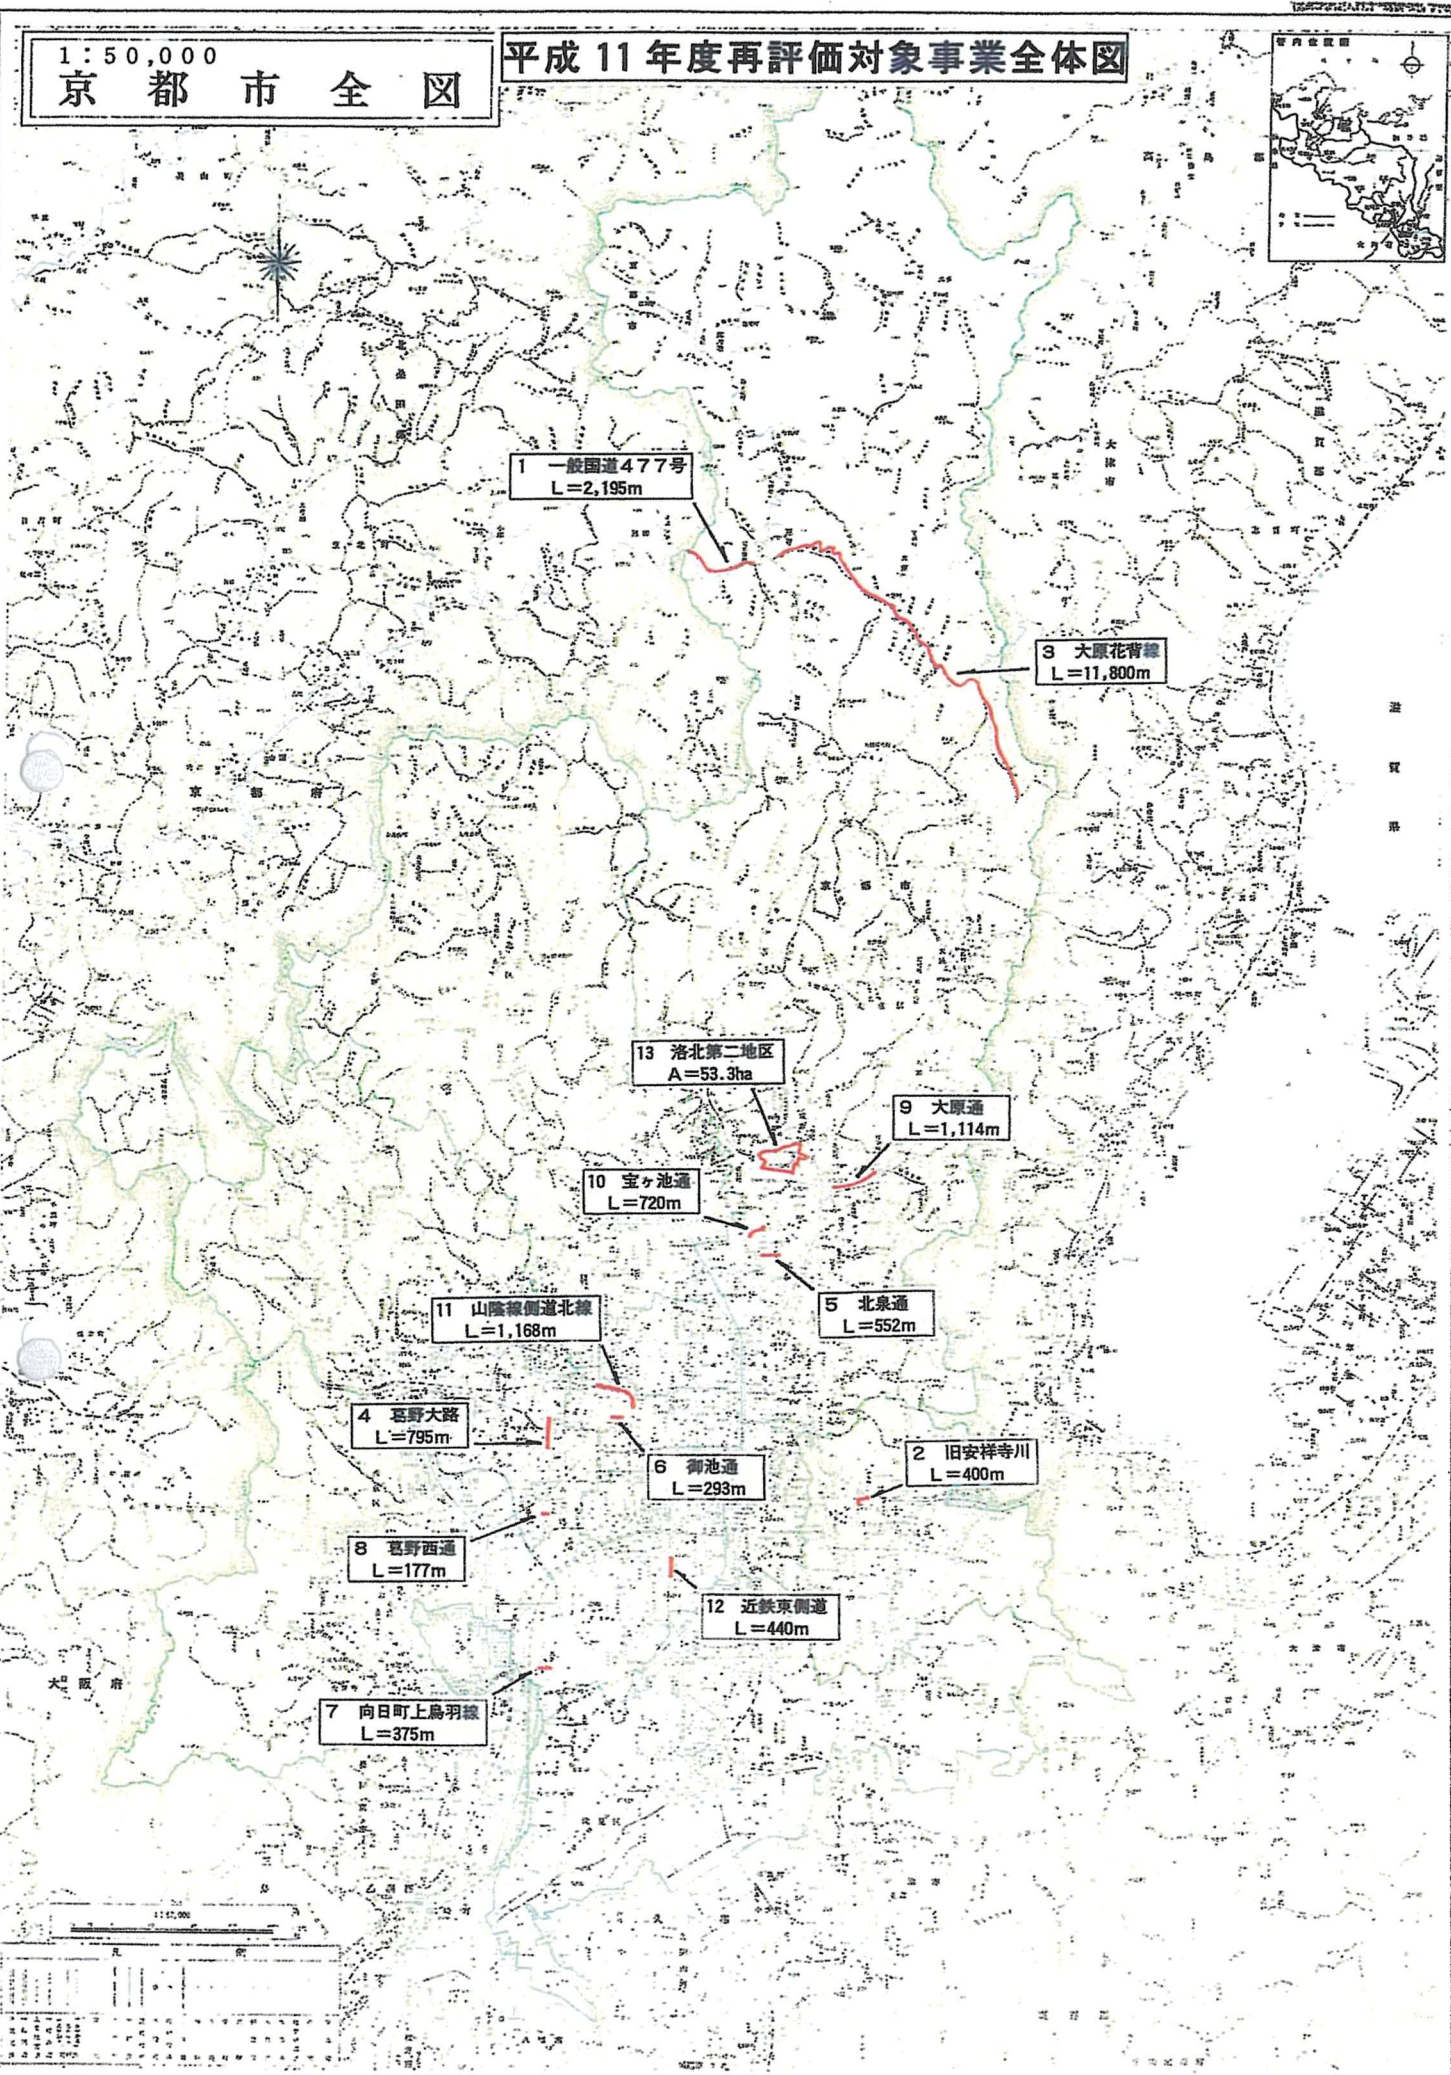


凡例	距離
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000	メートル
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	キロメートル

平成11年度再評価事業フォローアップ調書


(平成17年3月末)

事業名	街路事業 葛野大路		事業所管課	建設局街路部街路建設課	
事業区間	自：京都市右京区西院笠目町（四条通） 至：京都市右京区山ノ内五反田町（御池通）		延長及び幅員	延長：795m 幅員：27m	
事業採択年度	平成2年度	完成予定年度	当初：平成9年度 変更：平成17年度（事業認可最終施行年度）		
事業進捗					
年度	全体事業	平成15年度以前	平成16年度	平成17年度	平成18年度以降
工事	L= 795 m C= 1,086 百万円	L= 500 m C= 939 百万円	L= 295 m C= 147 百万円	L= 0 m C= 0 百万円	L= 0 m C= 0 百万円
用地	A= 17,400 m ² C= 9,273 百万円	A= 17,400 m ² C= 9,273 百万円	A= 0 m ² C= 0 百万円	A= 0 m ² C= 0 百万円	A= 0 m ² C= 0 百万円
その他	C= 665 百万円	C= 650 百万円	C= 13 百万円	C= 2 百万円	C= 0 百万円
計	C= 11,024 百万円	C= 10,862 百万円	C= 160 百万円	C= 2 百万円	C= 0 百万円
進捗率		98.5%	100.0%	100%	100%
平成11年度再評価時点での課題、問題点 用地境界の確定の難航により、用地面積の確定が遅れている（共用者多数）。また、権利者との協議が整わない箇所については、土地収用の手続も検討する必要がある。					
平成16年度の取組 三条通～御池通間において道路築造工事を行い、全線を開通させた。（供用開始日は平成17年3月19日）					
平成17年度以降の取組 当面の目標 ―― 事業効果 市街地西部市域における南北幹線道路の整備により、渋滞を解消し、安全で円滑な道路交通を確保する。また、電線類地中化により、良好な景観及び歩行者等の安全を確保する。					


[箇所図]

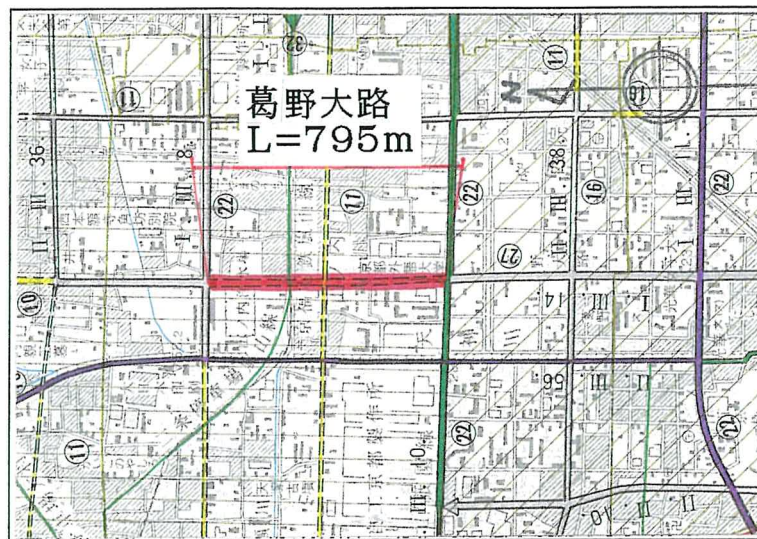

[模式図]

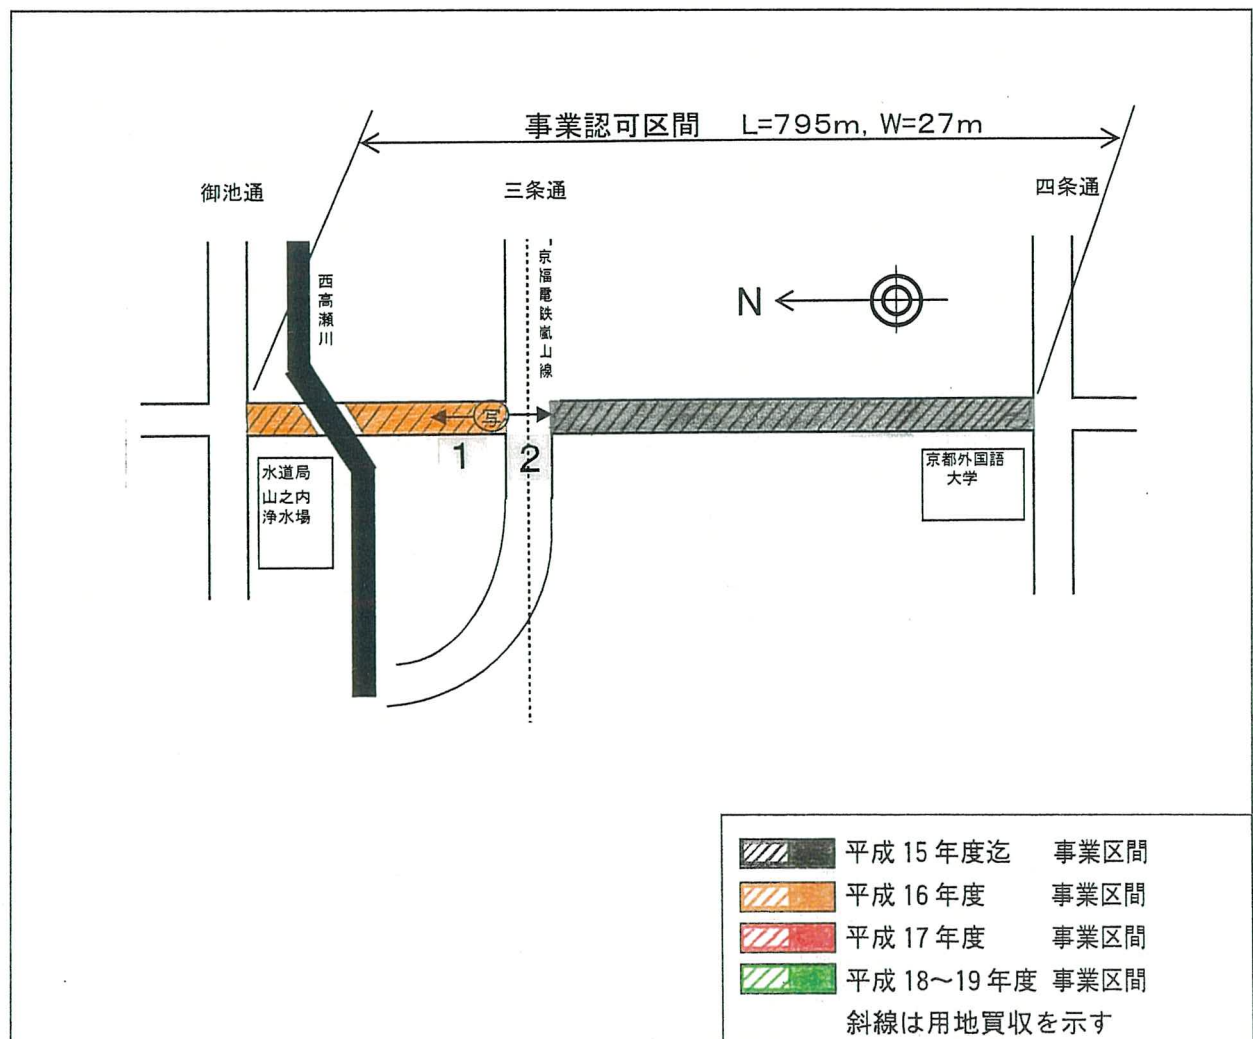

[事業概要]

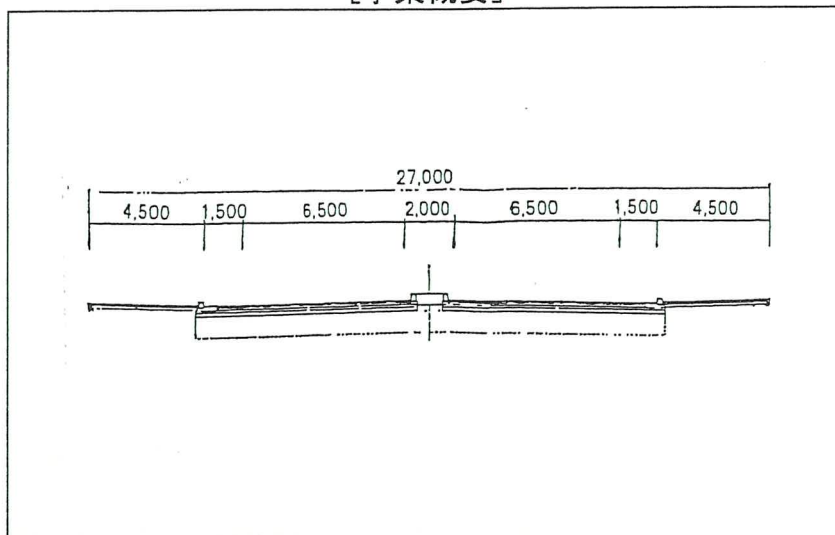

[写真] 1



2

